

Staða dagsins í Hringbrautarverkefninu


Útboðsþing SI 2021

Gunnar Svavarsson, verkfræðingur,
framkvæmdastjóri Hringbrautarverkefnisins







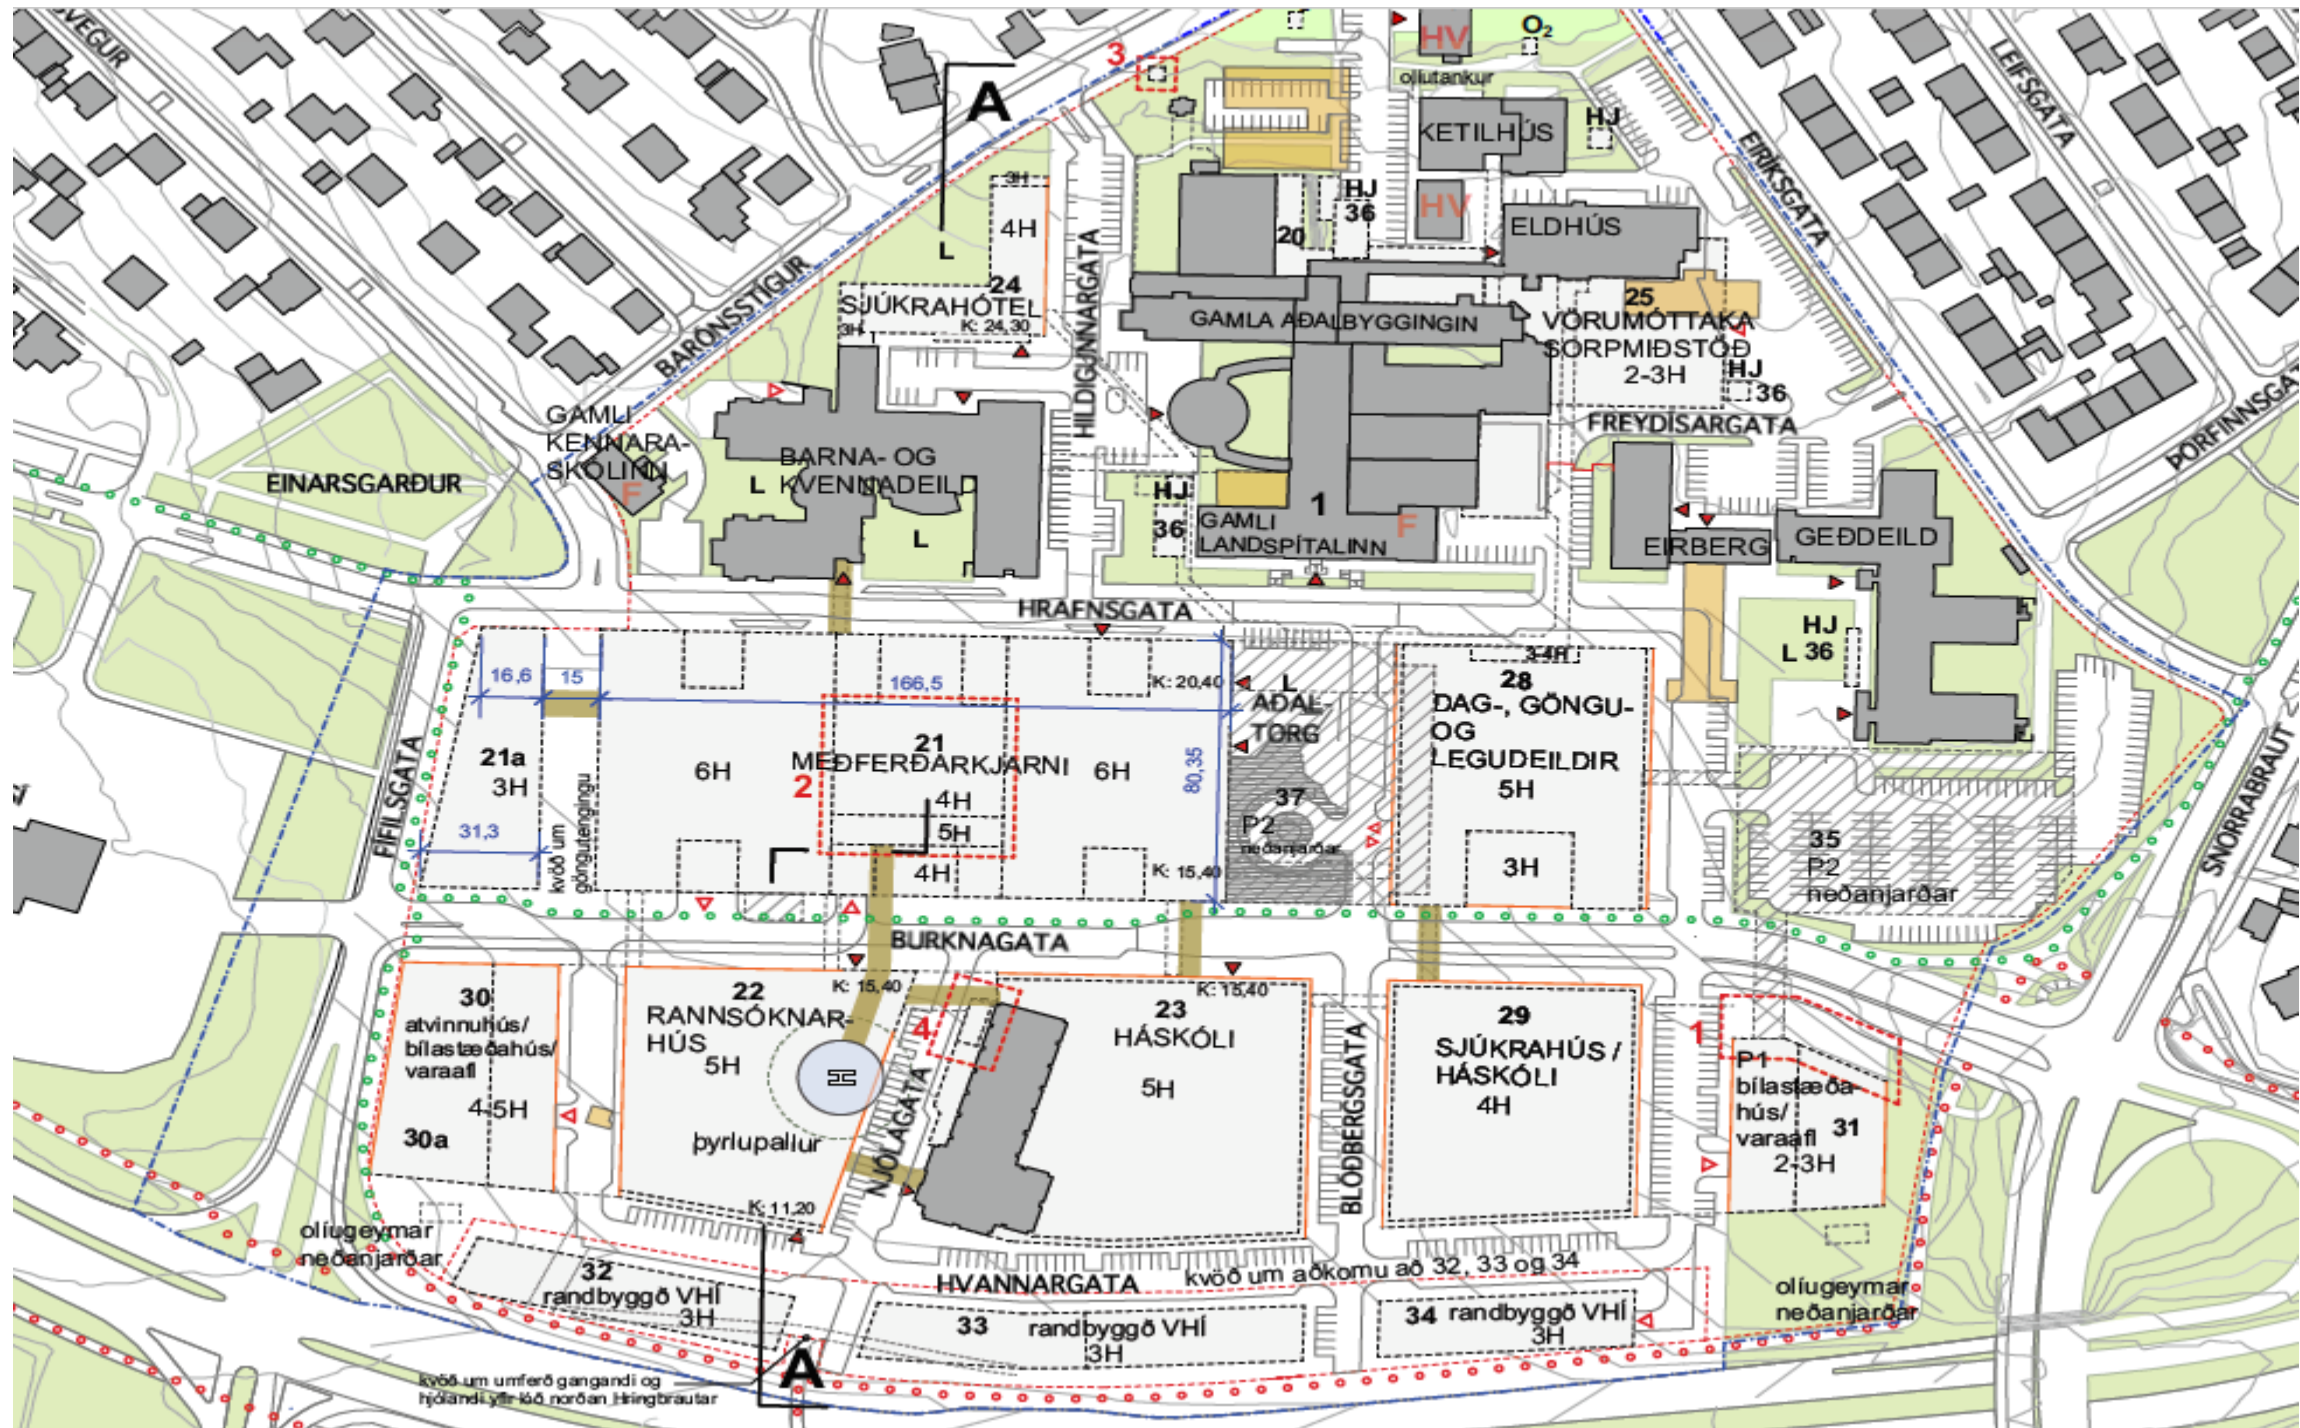



21.01.20

12.01.21



Grunnur meðferðarkjarna

12.01.21



Vinnubúðareitur - Alaska





Meðferðarkjarni



Rannsóknahús



Bílastæða- og
tæknihús



Bílakjallari
Sóleyjartorg




Götur, veitur
og lóð
Verkáfangar



Tengigangar og tengibrýr
Sjálfvirk flutningskerfi

Innkaupaferill – Útboð

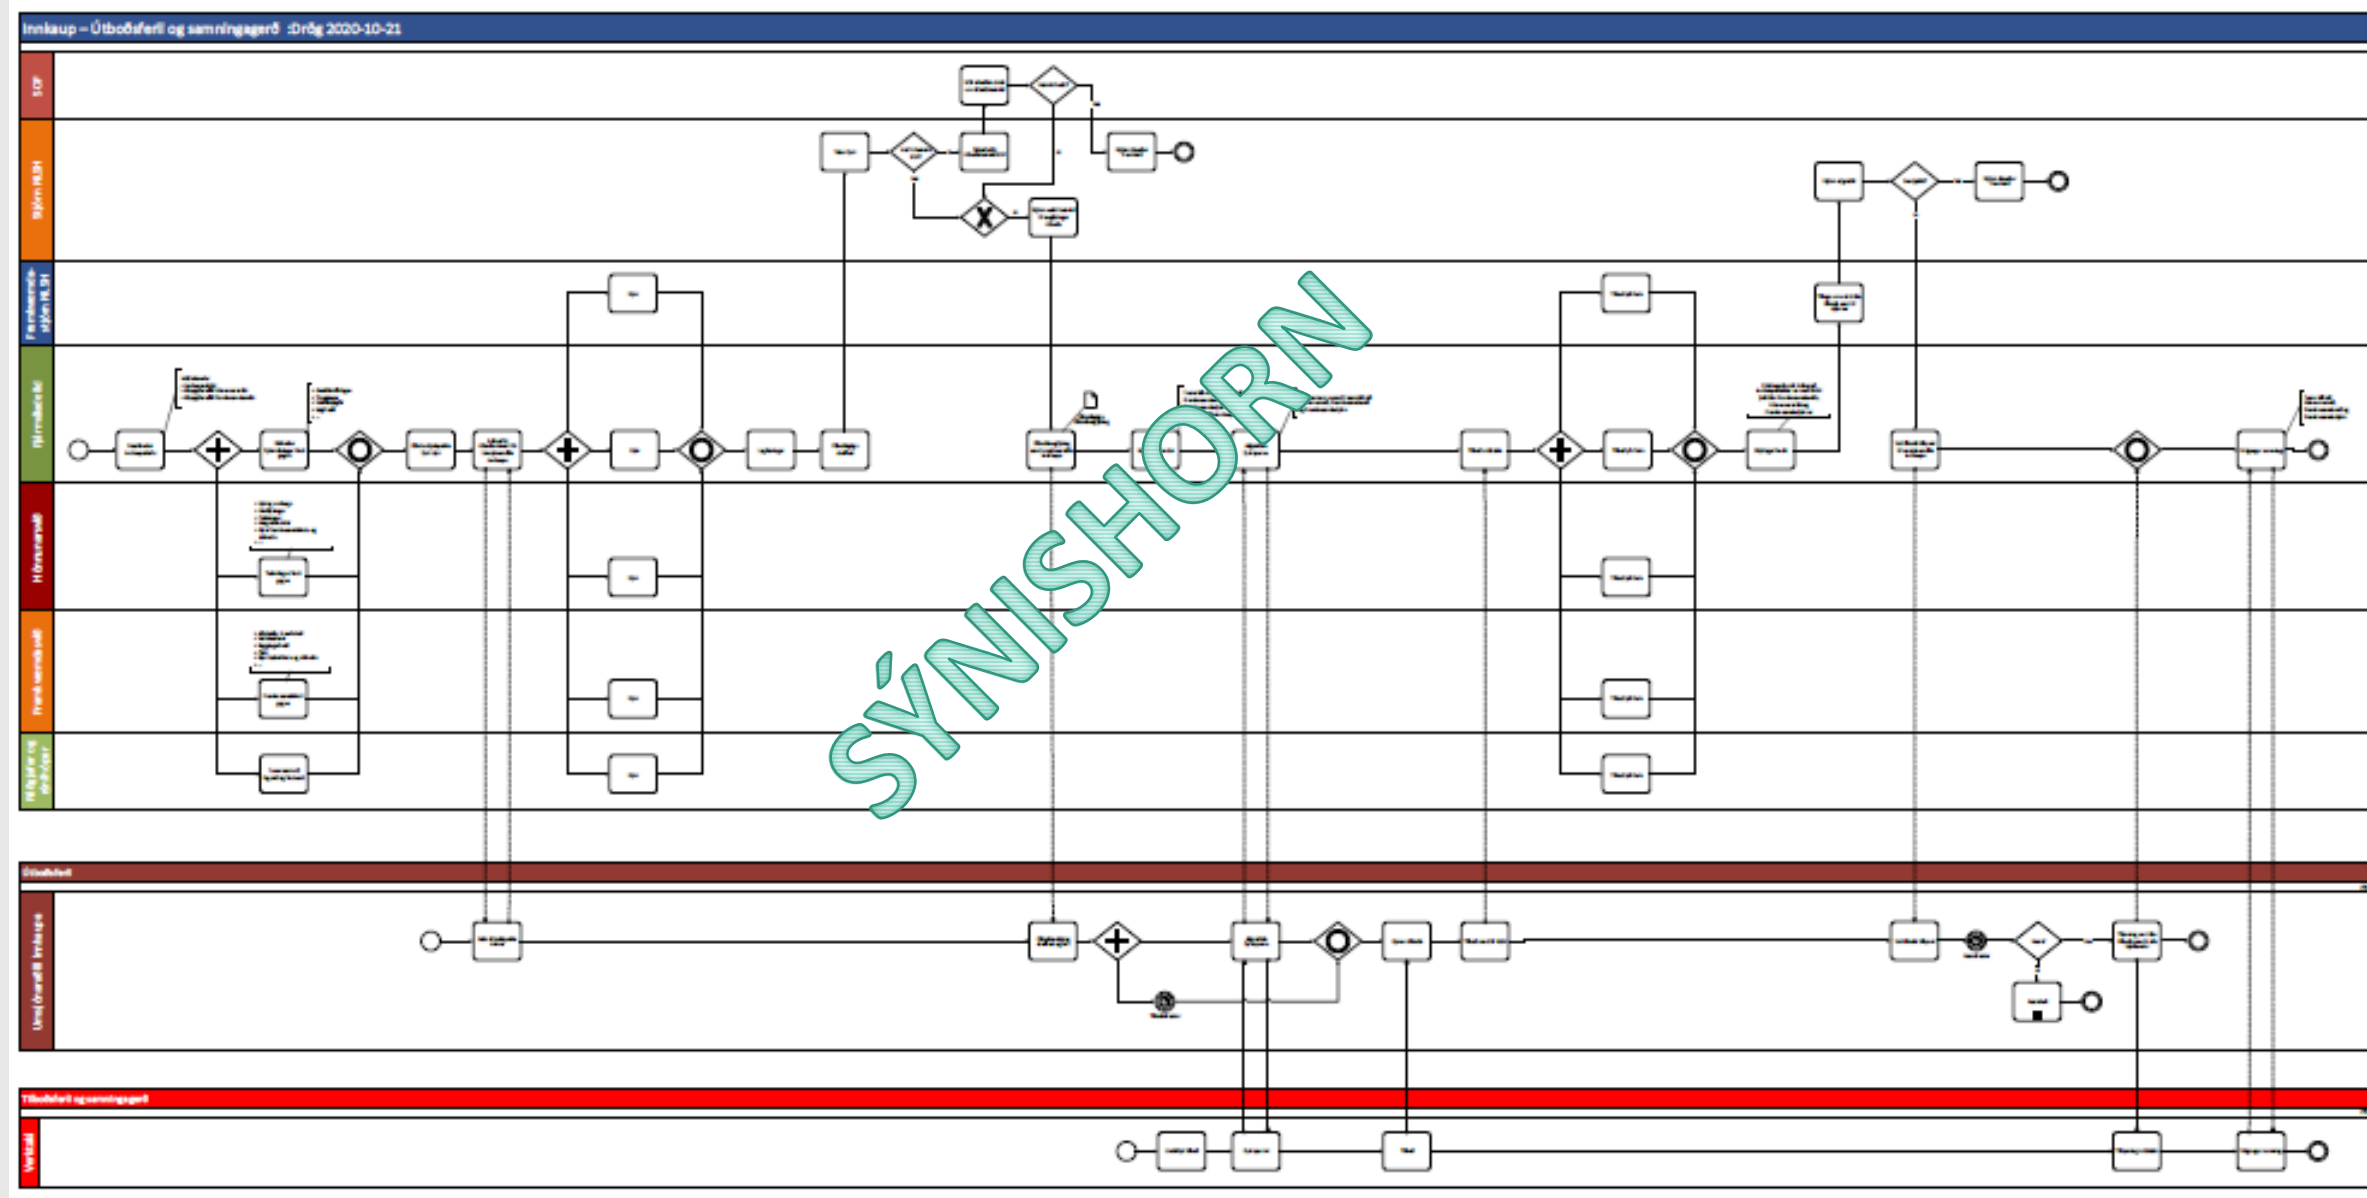

Niðurstaða útboðsdagsins 2020

NLSH ohf. – Hringbrautarverkefnið áætlaði* að á árinu 2020 yrðu boðin út verk sem næmu um 12.000 mkr. Það væru verk vegna:

- **Meðferðarkjarni**
 - Uppsteypa => Niðurstaða 10.700 mkr.
 - Yfirferð séruppdráttar => Niðurstaða 42 mkr.
 - Fidic verkeymi og verkeftirlit => Niðurstaða 430 mkr.
 - Rörpóstskerfi => Í ferli, fór í forval og samkeppnisviðræður 2020
 - Sorp- og línkerfi => Í ferli, fór í forval 2020
- **Rannsóknahús**
 - Jarðvinna => Færðist til ársbyrjunar 2021
 - Hönnun þyrlupalls => Færðist til 2022
- **BT hús**
 - Alútboð (hönnun og verkframkvæmd) => Færðist til ársbyrjunar 2021
- **Önnur smærri útboð**
 - Vinnubúðarreitur – Gámar – Jarðvinna – Aðgangshlið – Öryggiskerfi => Niðurstaða um 300 mkr.



** Áætlanir NLSH ohf. eru birtar með fyrirvara um fjárheimildir og aðrar heimildir*

Útboðsmál 2021

NLSH ohf. – Hringbrautarverkefnið áætlað* að á árinu 2021 séu boðin út verk sem nema um 11.000 mkr.

* Allar dagsetningar og upphæðir eru með fyrirvara um heimildir og niðurstöðu um umfang innkaupa



- Jarðvinna – Rannsóknahús
Ópið útboð auglýst febrúar / mars 2021
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Fullnaðarhönnun bílakjallara
Í auglýsingu – Skiladagur 9. febrúar 2021
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Rörpóstur
Í samkeppnisviðræðum – Lýkur mars 2021
Kostnaðaráætlun 200 mkr.
- Sorp- & línkerfi
Á útboðsstigi eftir forval – Lýkur apríl 2021
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Bílastæða- og tæknihús - Alútboðsverk
Afhent febrúar / mars 2021 eftir forval
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Útveggir meðferðarkjarna
Samkeppnisútboð eftir forval apríl/maí
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Gatna- og veitnagerð 3ja verkáfanga
Útboð auglýst maí / júní 2021
Kostnaðaráætlun birt við opnun
- Önnur smærri verk- og þjónustuútboð
Heildarmat um 400 mkr.

Takk fyrir
