



Landsvirkjun

Landsvirkjun 2018

– verkefnastaða og framkvæmdir

Kynning á útboðsþingi SI 26.01.2018

Gunnar Guðni Tómasson

framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs




Landsvirkjun

Efni kynningar

- Fjárfestingar síðustu ára
- Virkjanakostir og staða þeirra
- Verkefni á framkvæmdastigi

Fjárfestingar á tímabilinu 1995-2018

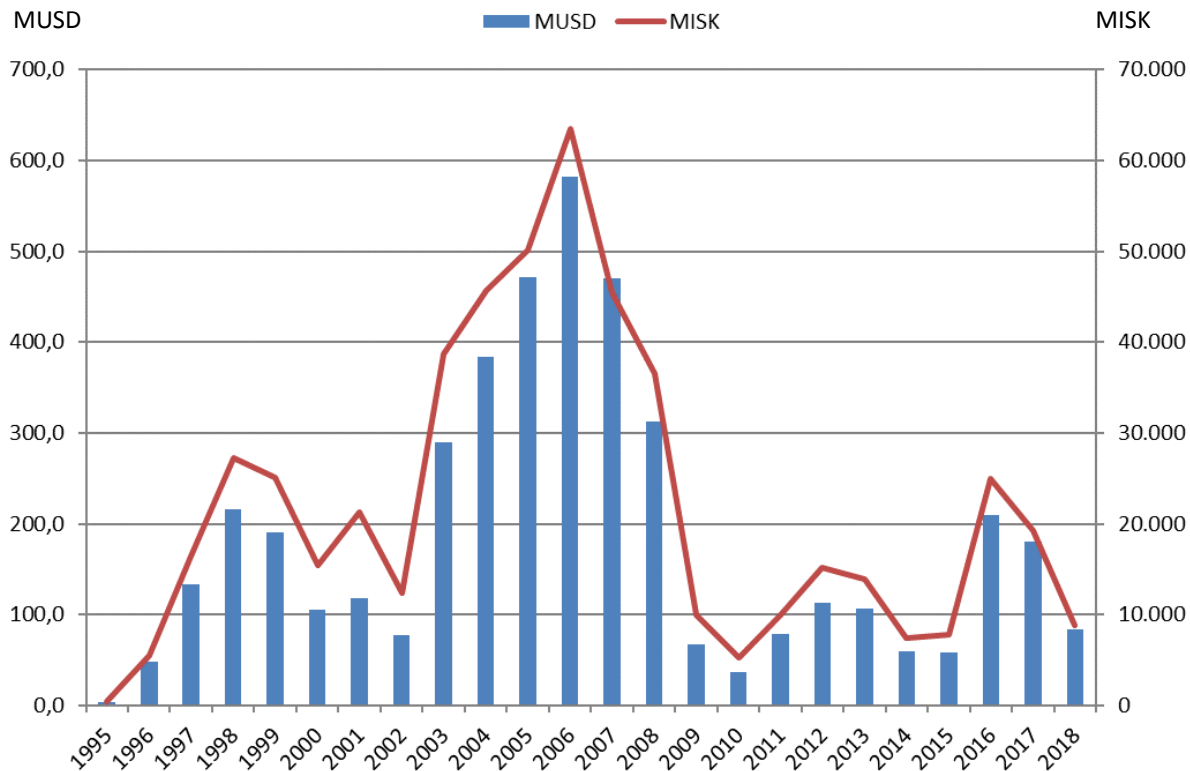

Kárahnjúkar

Virkjanakostir Landsvirkjunar

Virkjanakostur	Afl (MW)	Orkugeta GWh/ár	Staða
Þeistareykir	90	720	Framkvæmdir lýkur 2018
Stækkun Búrfells	100	300	Framkvæmdir lýkur 2018
Hvammsvirkjun	93	720	Útboðshönnun að mestu lokið MáU þarf að endurtaka að hluta
Virkjanir á veituleið Blöndustöðvar	31	195	Verkhönnun

Þeistareykjavirkjun 90 MW

Vél 1 var gangsett í
nóvember 2017 (45 MW)


Vél 2 verður gangsett í
apríl 2018 (45 MW)

Í framhaldi af því verður
unnið við frágang á
svæðinu



Þeistareykjavirkjun

Mannaflaspá

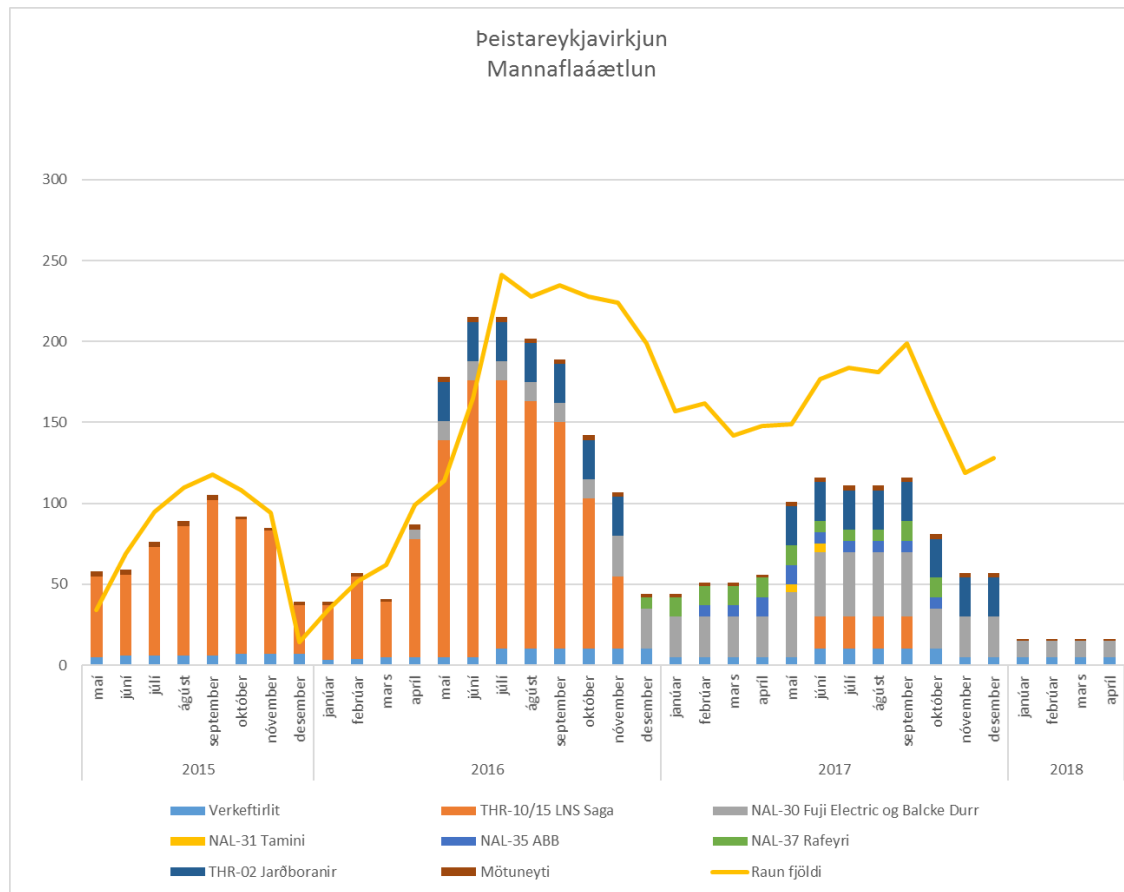



Stækkun Búrfellsvirkjunar 100 MW


Virkjunin verður gangsett í
sumar

Í framhaldi af því verður
unnið við frágang á svæðinu



Stækkun Búrfellsvirkjunar

Mannaflaspá

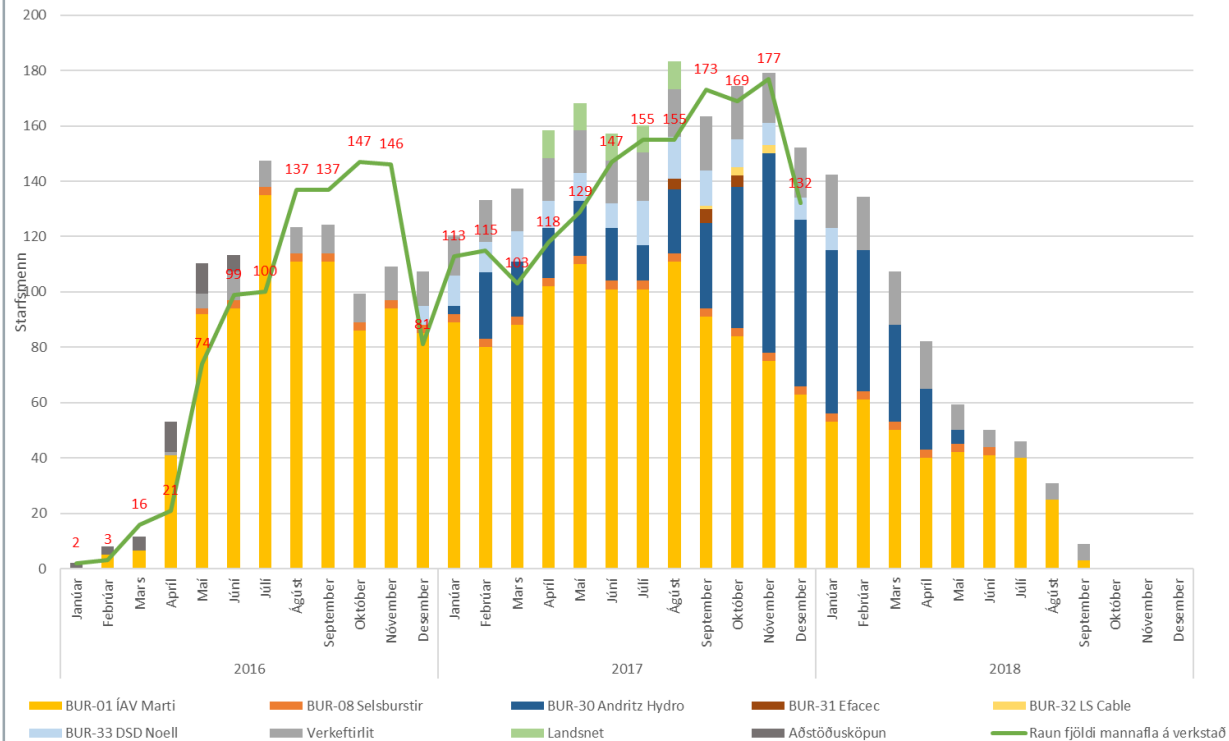

Endurnýjun gufustöðvarinnar í Bjarnarflagi (5 MW)

Framkvæmdir hófust í
þessum mánuði

Ný vél verður gangsett í
haust




Helstu verksamningar

- GUF 60 Hönnun og ráðgjöf – Verkís
- GUF 80 Vélbúnaður – GEG
- GUF 81 Rafbúnaður – Rafal
- GUF 82 Byggingar – Trésmiðjan Rein

Áætlaður kostnaður við framkvæmdir 2018-2019

- Stækkun Búrfells
- Þeistareykjavirkjun
- Gufustöð Bjarnarflagi
- Viðhaldsverkefni

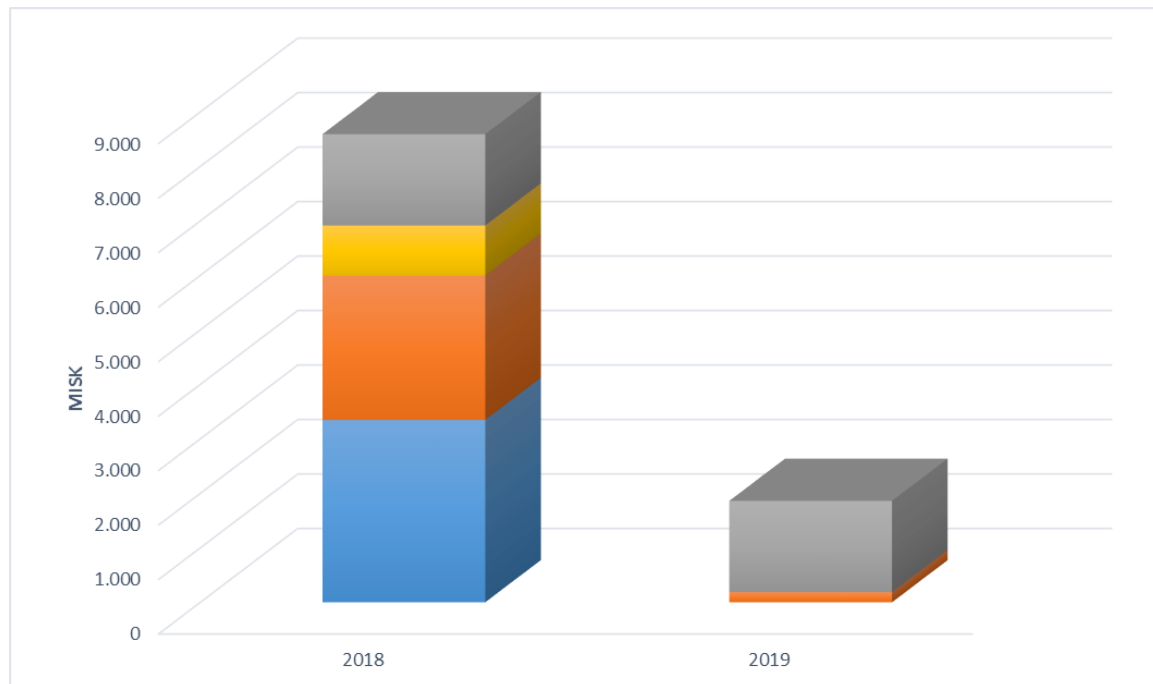


Vinnubúðir

Landsvirkjun á talsvert af
vinnubúðum

Einingarnar eru á misjöfnum
aldri en hefur almennt verið
vel við haldið

Einingar sem reynst hafa vel
við okkar aðstæður

Munum byrja að losa okkur
við vinnubúðaeiningar á
vormánuðum

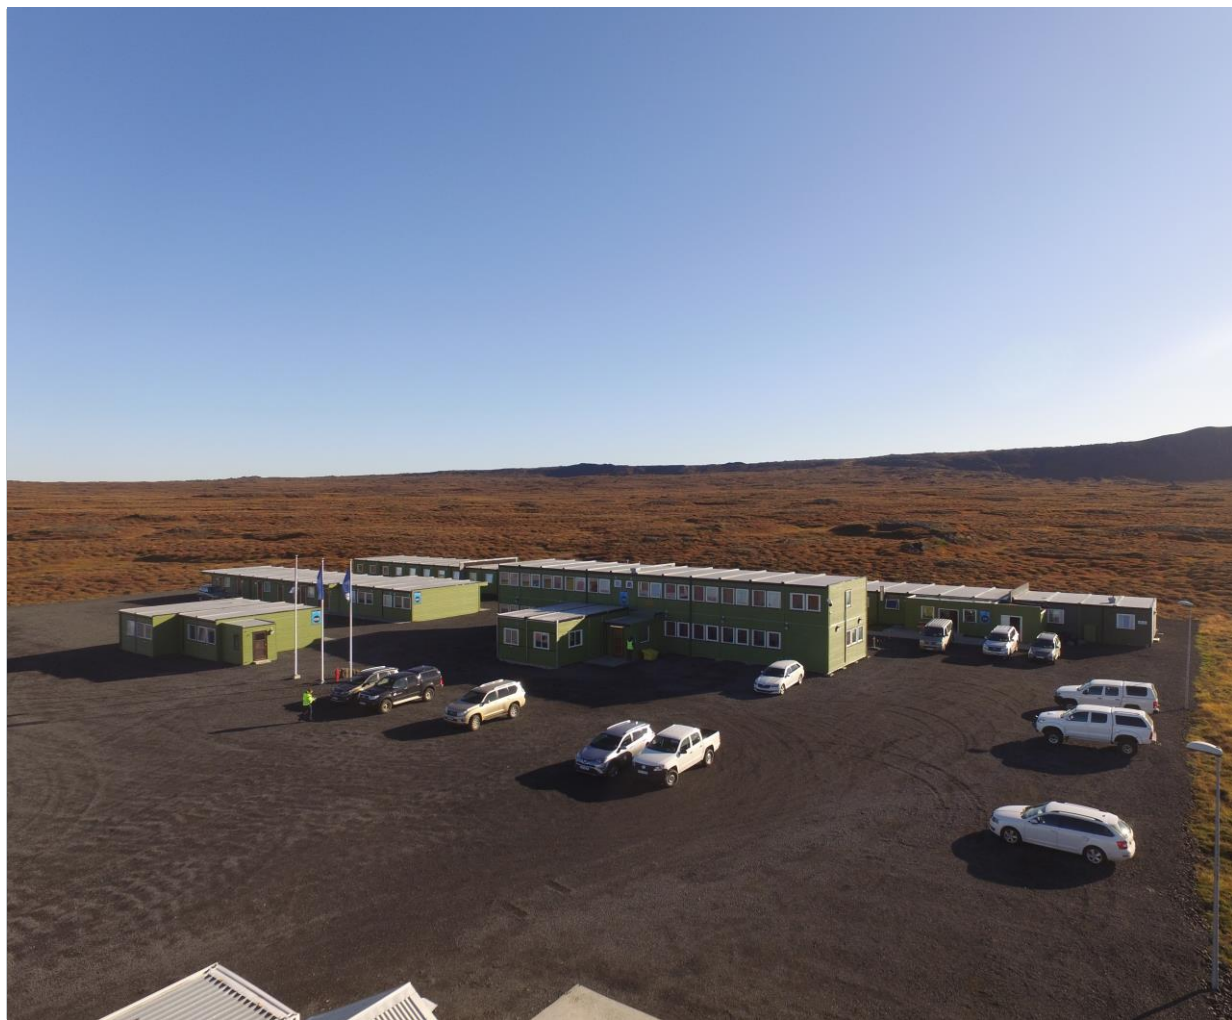



Landsvirkjun

Takk fyrir

Kynning á útboðsþingi SI 26.01.2018

Gunnar Guðni Tómasson

framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs

