



▶▶ Útboðsþing

Verklegar framkvæmdir 2019



25
ára
1994
2019



Samtök
iðnaðarins



▶ **Setning**

Guðrún Hafsteinsdóttir
formaður SI



▶ **Setning**
Guðrún Hafsteinsdóttir
formaður SI



▶ **Reykjavíkurborg**
Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri



▶ **Samtök sveitarfélaga
á höfuðborgarsvæðinu**
Hrafkell Á. Proppé
svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins



▶ **Veitur**
Inga Lind Valsdóttir
forstöðumaður tækniþróunar



▶ **Landsvirkjun**
Gunnar Guðni Tómasson
framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs



▶ **Landsnet**
Unnur Helga Kristjánsdóttir
yfirmaður verkefnastjórnunar framkvæmda



▶ **Orka náttúrunnar**
Marta Rós Karlsdóttir
forstöðumaður tækniþróunar



▶ **Faxaflóahafnir**
Jón Þorvaldsson
aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna



▶ **ISAVIA**
Maren Lind Másdóttir
deildarstjóri farangurskerfa
tækni- og eignasvið Keflavíkurflugvallar



▶ **Vegagerðin**
Óskar Örn Jónsson
forstöðumaður framkvæmdadeildar



▶ **Framkvæmdasýsla ríkisins**
Guðrún Ingvarsdóttir
forstjóri



▶ **Fundarstjóri**
Sigurður Hannesson
framkvæmdastjóri SI





▶ Reykjavíkurborg

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri



FJÁRFESTING REYKJAVÍKURBORGAR 2019

Dagur B. Eggertsson, Borgarstjóri


Útboðsþing 2019

METÁR Í FRAMKVÆMDUM Í REYKJAVÍK


Árið 2019 mun Reykjavíkurborg fjárfesta í innviðum og þjónustu fyrir 20 milljarða
Á næstu fimm árum mun borgin fjárfesta í innviðum fyrir 75 milljarða



Reykjavíkurborg mun fjárfesta fyrir 75 milljarða í innviðum á komandi fimm árum

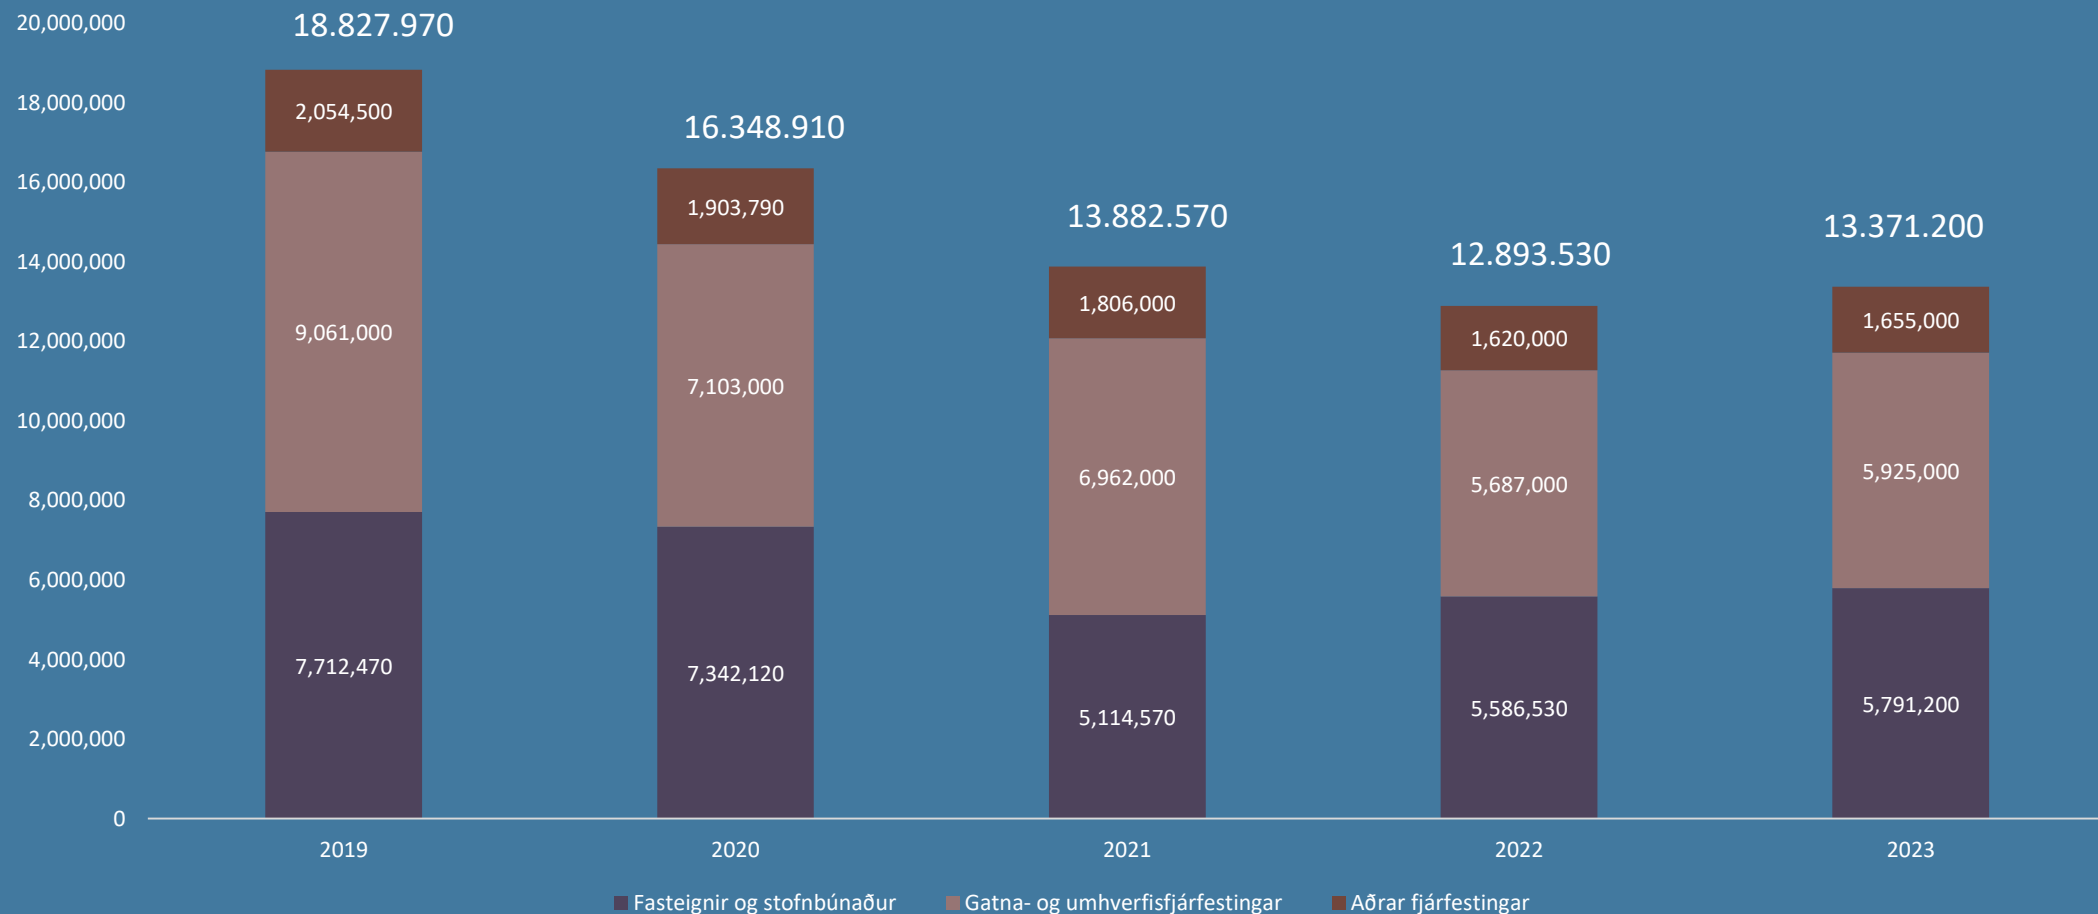

Samstæða Reykjavíkurborgar fjárfestir fyrir 196 milljarða á næstu fimm árum

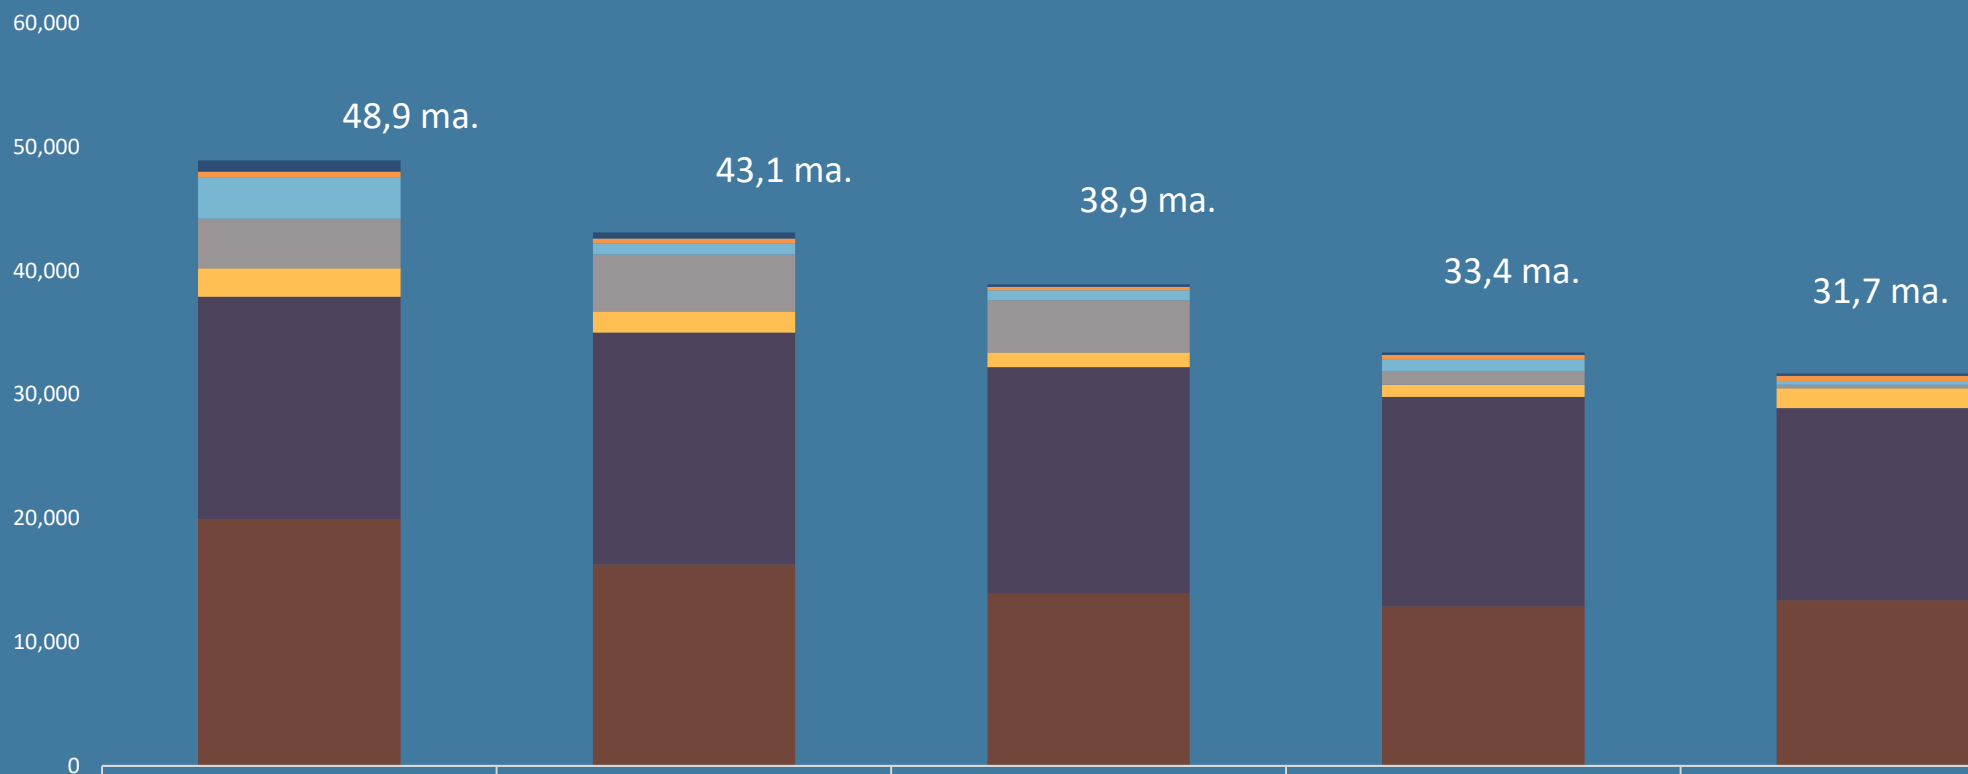

	2019	2020	2021	2022	2023
Önnur fyrirtæki og innri viðskipti	900	500	200	200	200
Strætó	500	400	300	400	400
Sorpa	3,300	900	800	900	300
Félagsbústaðir	4,000	4,600	4,200	1,100	300
Faxaflóahafnir	2,300	1,700	1,200	1,000	1,600
Orkuveita Reykjavíkur	18,000	18,700	18,300	16,900	15,500
A-hluti	19,900	16,300	13,900	12,900	13,400


Fjárfestingar ársins 2019

9 milljarðar í fasteignir og stofnbúnaður

9 milljarðar í gatna- og umhverfisfjárfestingar

2 milljarðar í aðrar fjárfestingar

Samtals 20 milljarðar

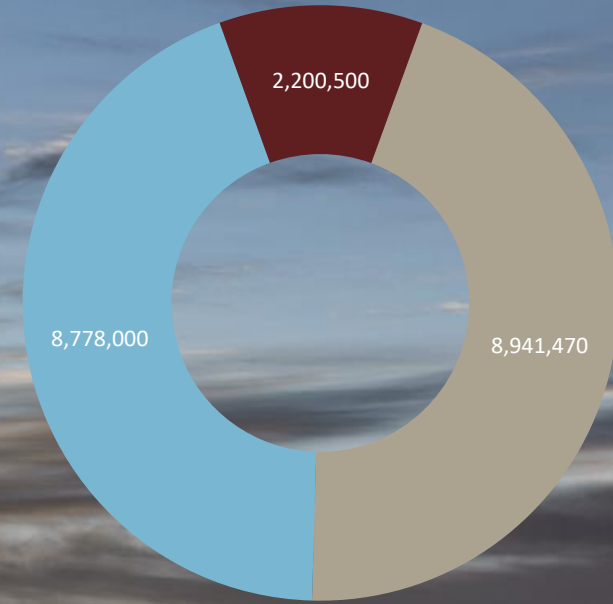

Fasteignir og stofnbúnaður

Gatna- og umhverfisfræmndir

Annað


Fasteignir og stofnbúnaður 2019




Ýmsar fasteignir

720 milljónir í ýmis fasteignaverkefni

Stærsta verkefnið er hverfisbækistöð í Örfirisey og endurbætur á húsnaði fyrir Strætó á Hesthálsi

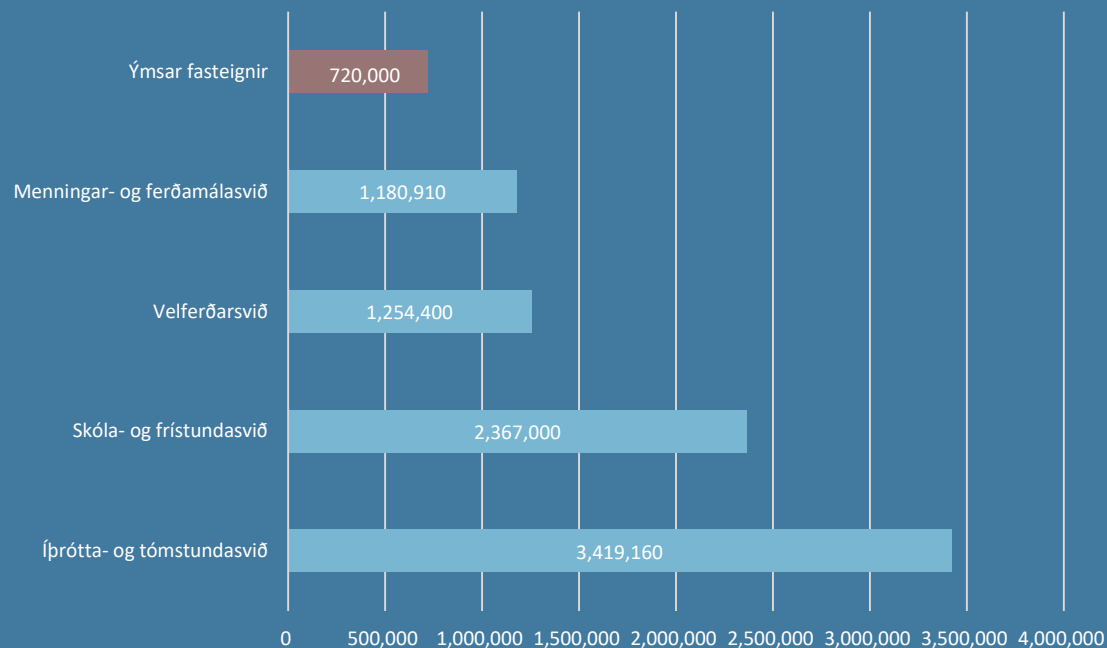

Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða

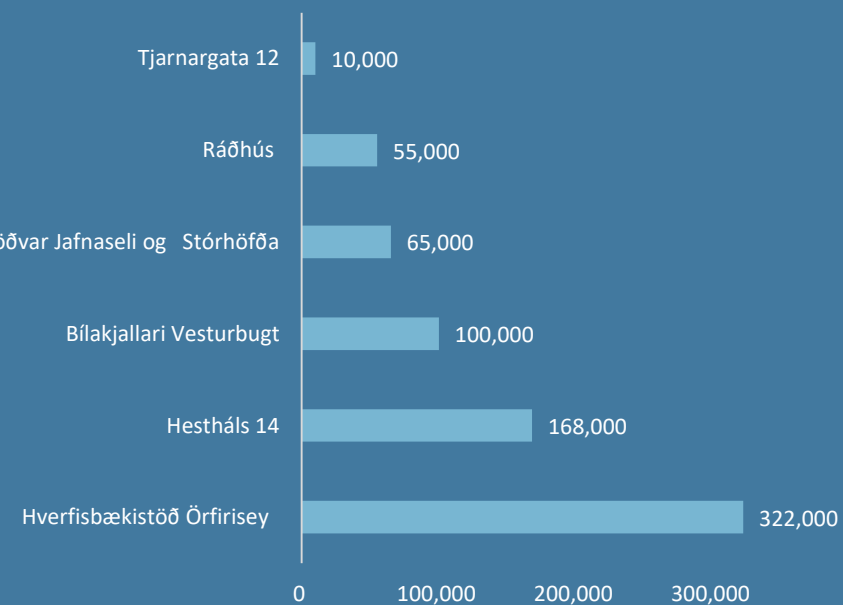


Ýmsar fasteignir



55 milljónir




322 milljónir

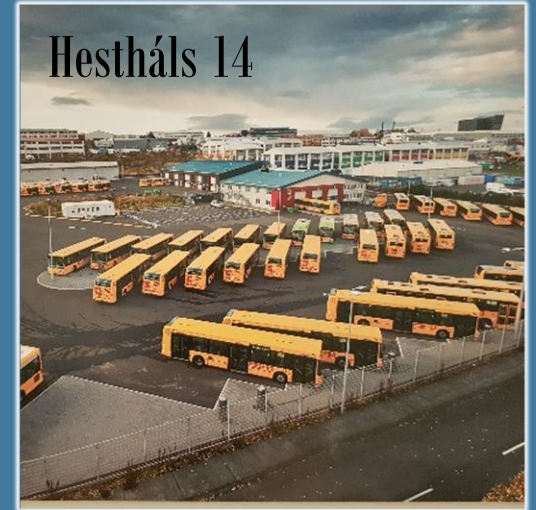

168 milljónir



10 milljónir

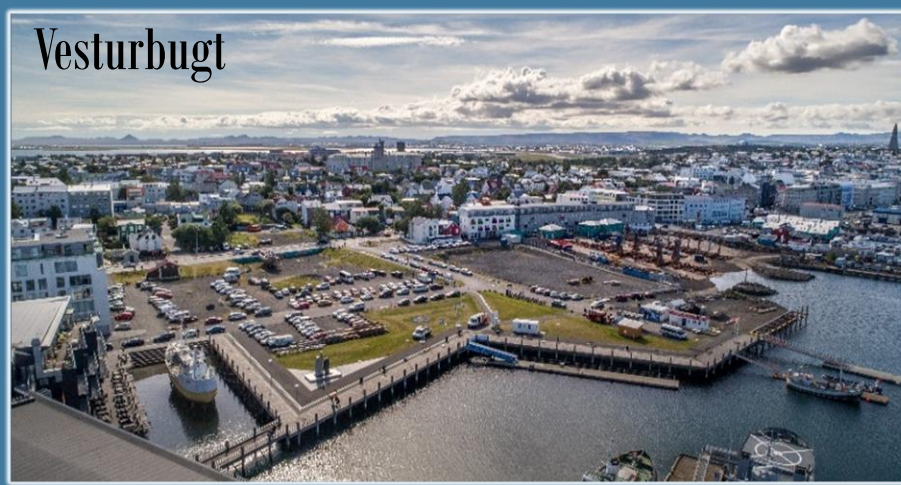

100 milljónir





65 milljónir

Menningar- og ferðamálasvið

1.180 milljónir í húsnæði sem tengist menningar- og ferðamálum

Stærsta verkefnið er endurbætur á Grófarhúsinu

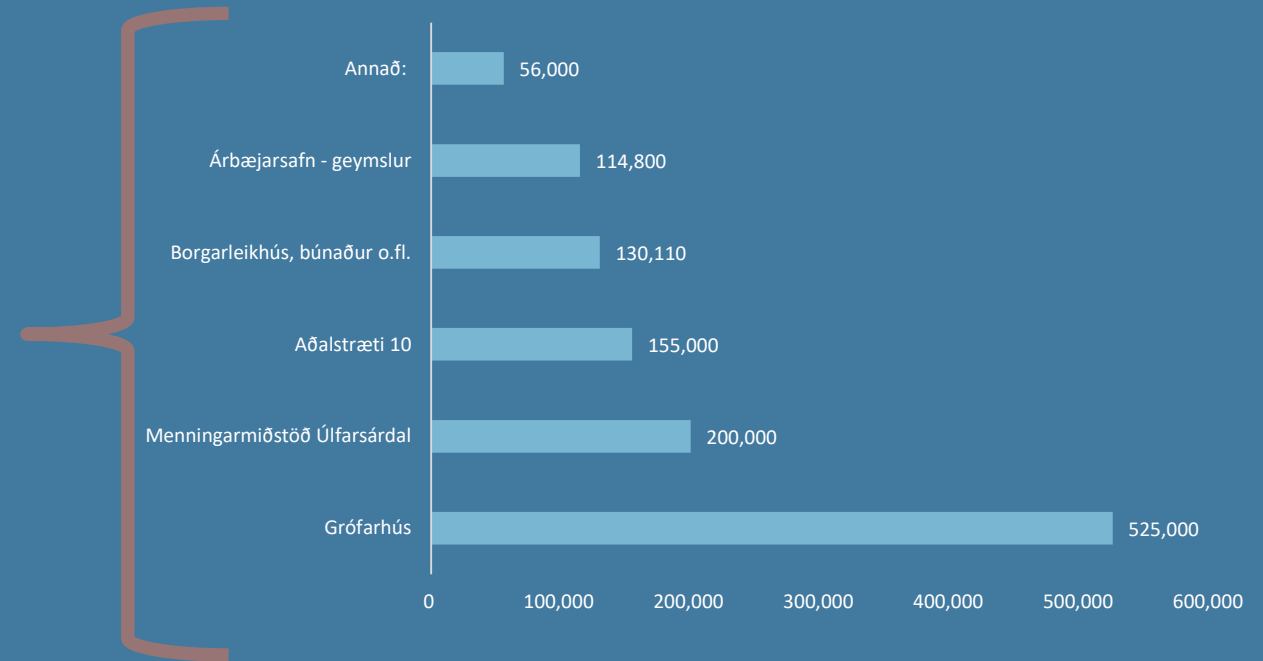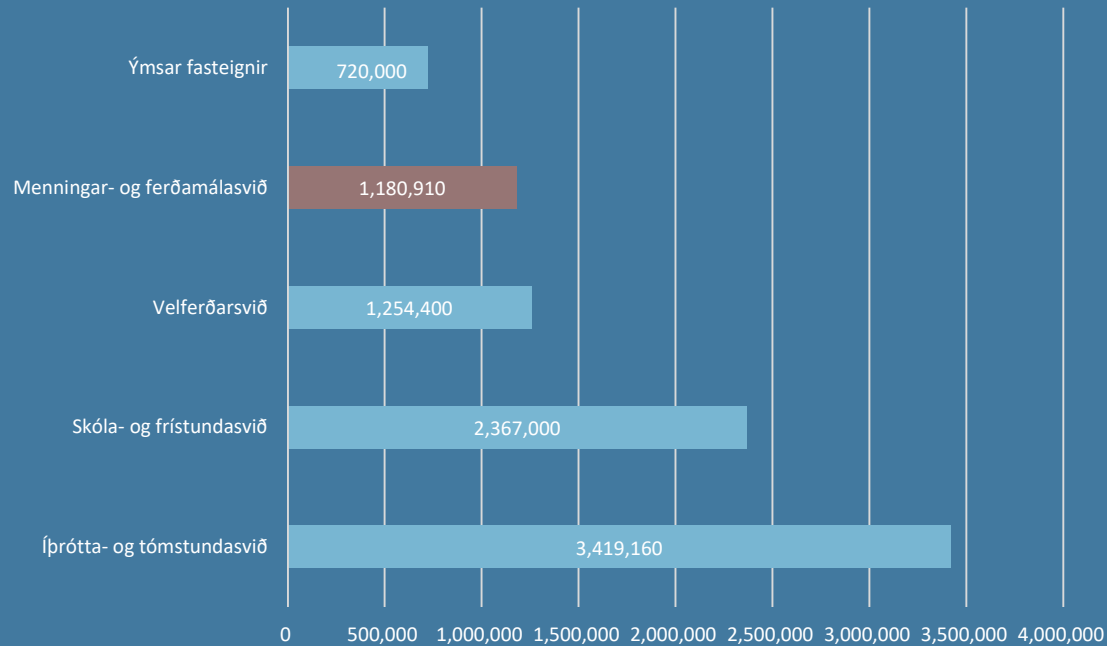


Menningar- og ferðamálasvið

Grófarhús



525 milljónir

Aðalstræti 10

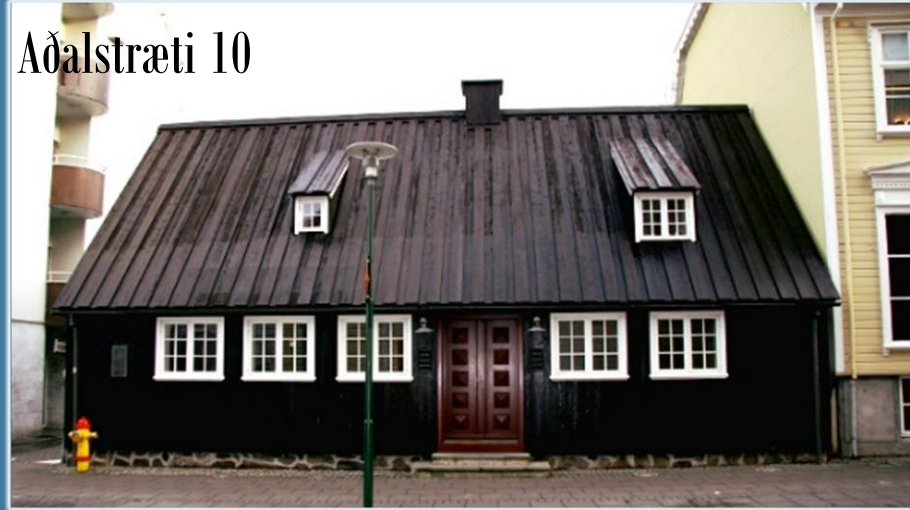

155 milljónir

Árbæjarsafn




115 milljónir

Menningarmiðstöð
Úlfarsárdal



200 milljónir

Borgarleikhúsið

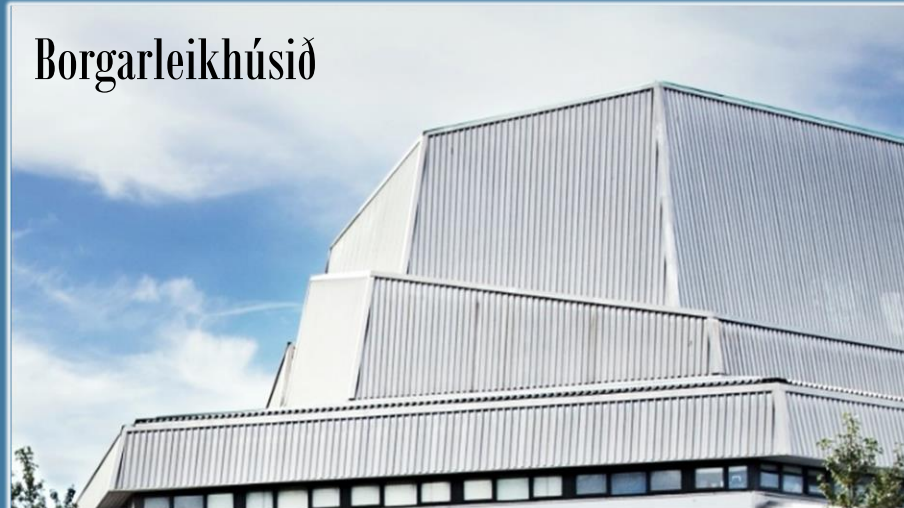

130 milljónir

Kjarvalsstaðir





20 milljónir

Velferðarsvið

1.254 milljónir í húsnæði sem tengist
Velferðarmálum

Stærstu verkefni ársins eru kaup á
smáhýsum, vistunarmál og Hjúkrunarheimili
við Sléttuveg

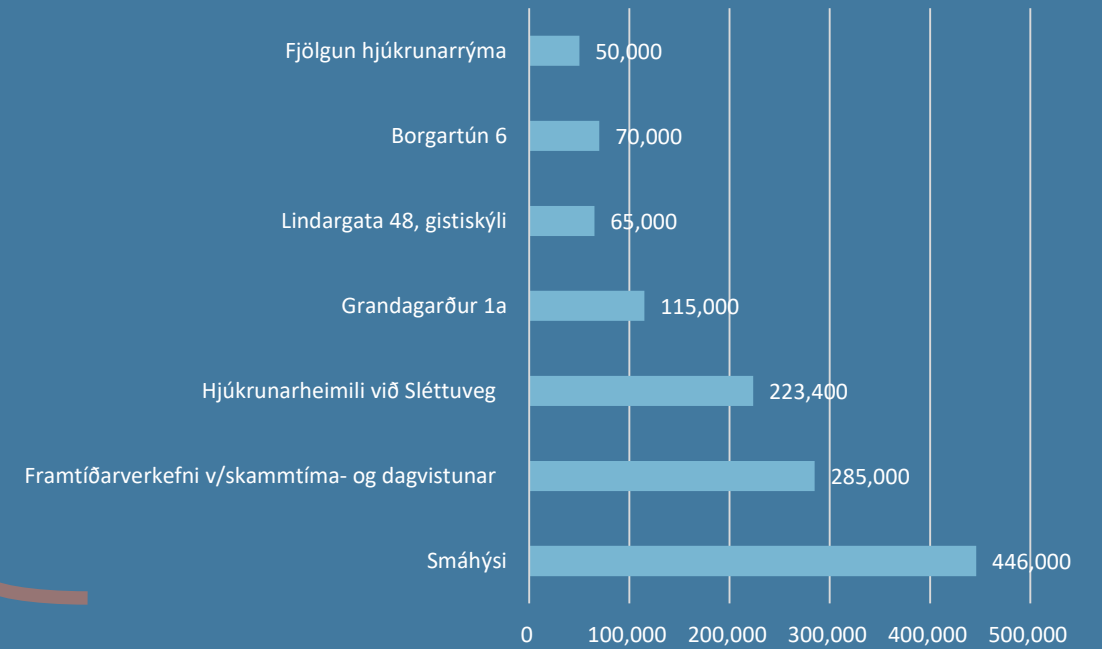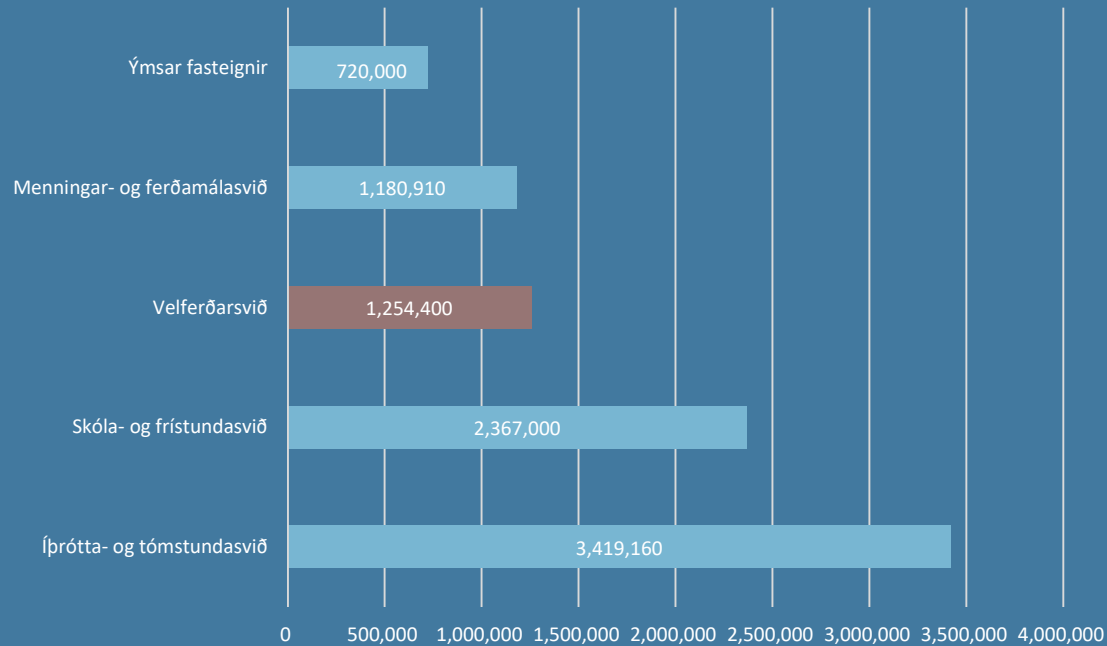

Velferðarsvið

Smáhýsi



446 milljónir

Skammtíma- og dagvistun



285 milljónir

Lindargata



65 milljónir

Borgartún 6



70 milljónir

Hjúkrunarheimili við Sléttuveg



223 milljónir

Grandagarður 1A




115 milljónir


Skóla- og frístundasvið

2.367 milljónir í húsnæði sem tengist Skóla- og frístundamálum

Stærstu verkefni ársins nýr leik- og grunnskóli í Úlfarsárdal og átaksverkefni við fjölgun leikskóladeilda

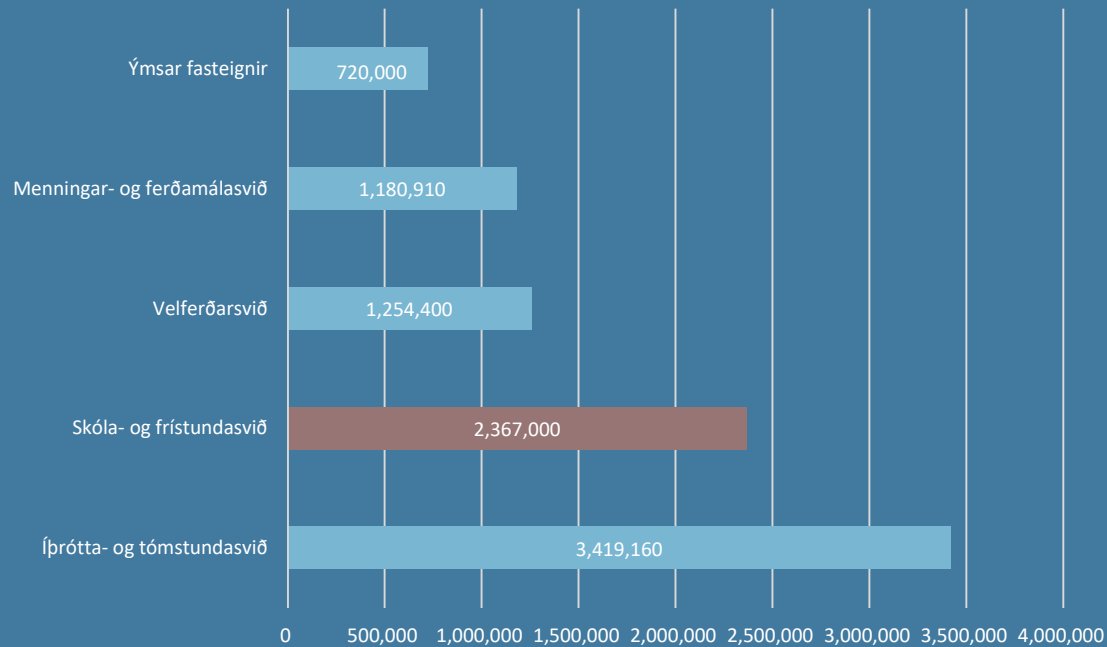

Nýjir grunnskólar - Hlíðarendi Vogabyggð Ártúnshöfði

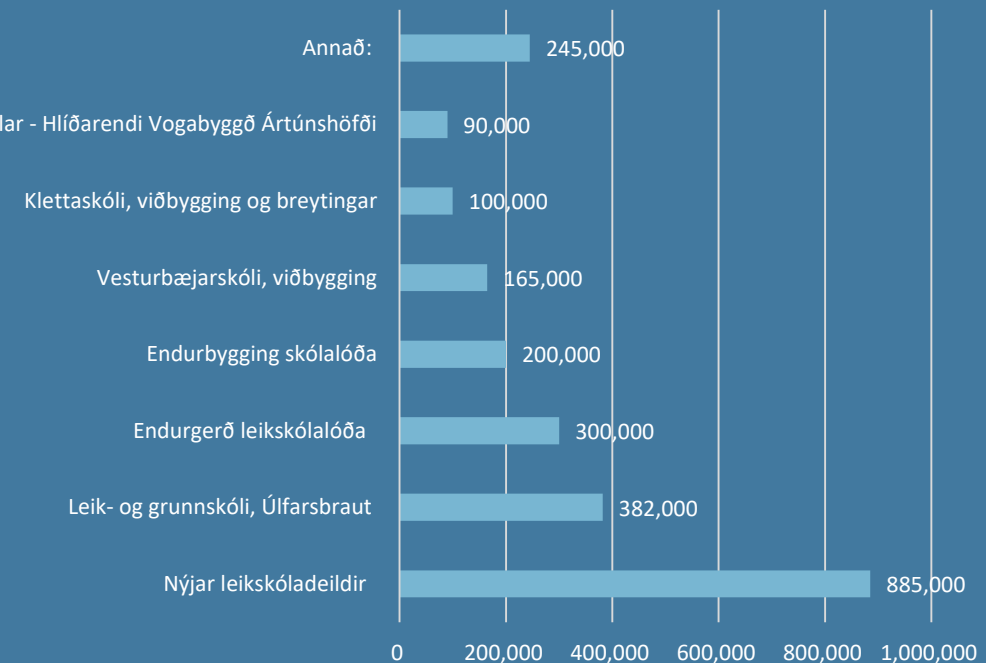

Skóla- og frístundasvið



382 milljónir



Nýjar leikskóladeildir

885 milljónir



Leikskólalóðir

300 milljónir



Skólalóðir

200 milljónir



Vesturbæjarskóli

165 milljónir





Klettaskóli

100 milljónir

Íþróttta- og tómstundasvið

3.419 milljónir í húsnæði sem tengist Íþróttta- og tómstundamálum

Stærstu verkefni ársins eru íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal og íþróttasvæði í Breiðholti

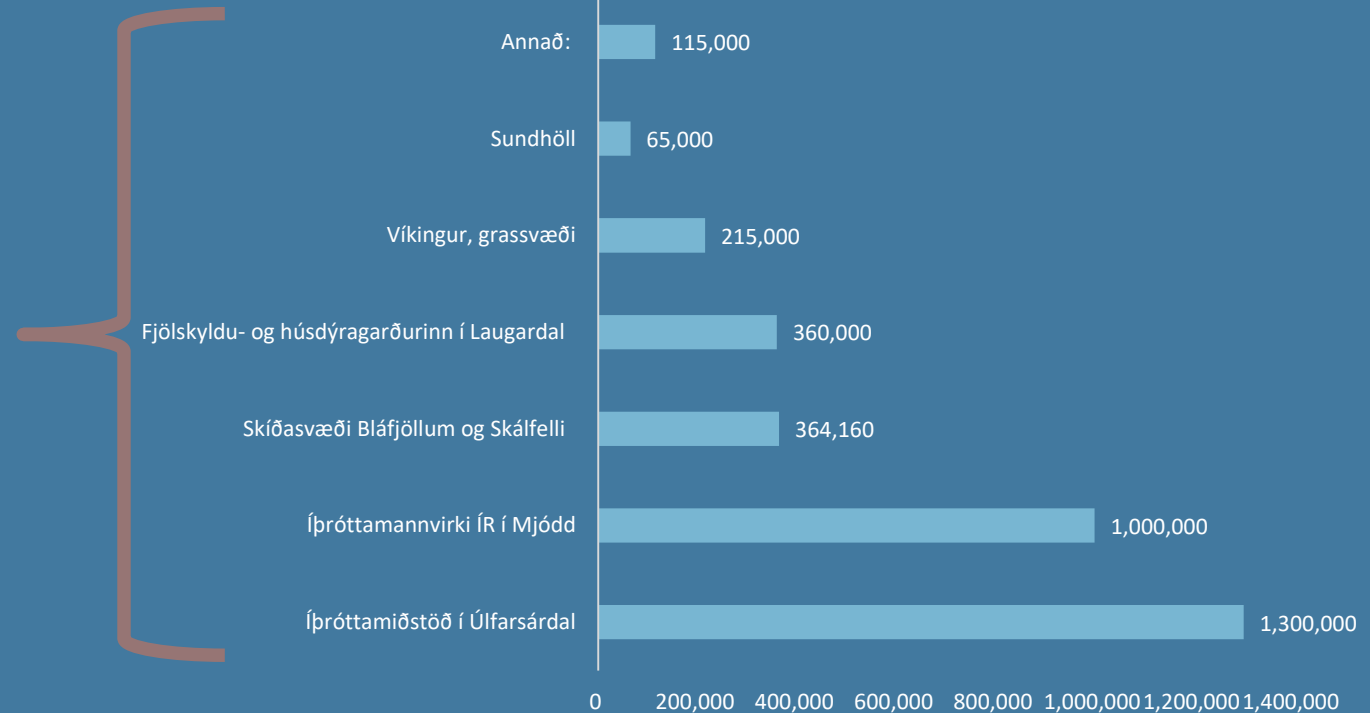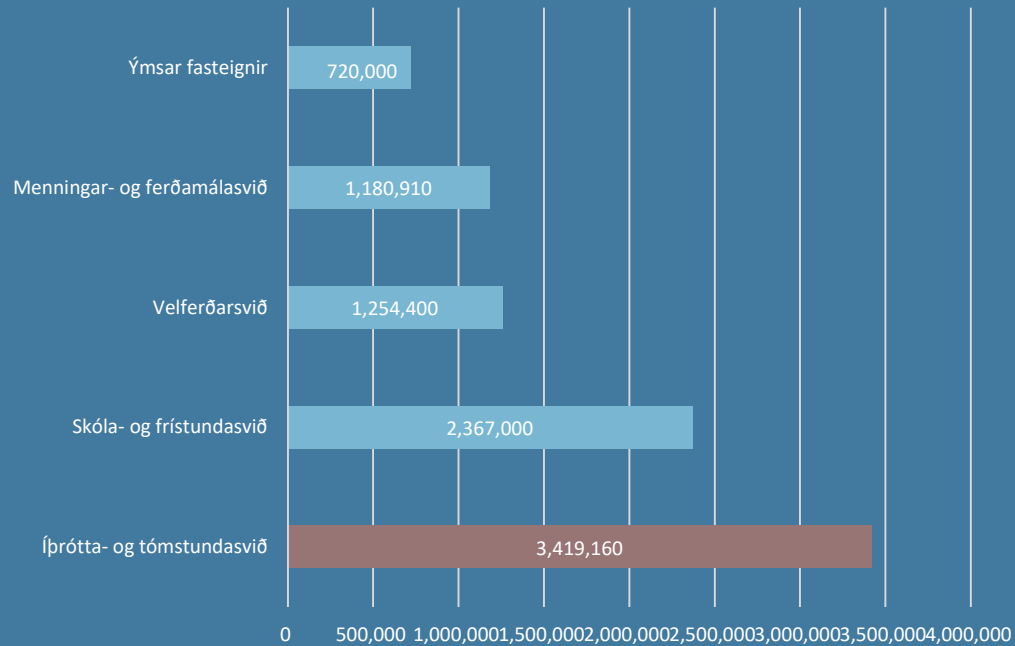

Íþróttta- og tómstundasvið

Íþróttamiðstöð Úlfarsárdal




1.300 milljónir

Íþróttasvæði ÍR við Mjódd



1.000 milljónir

Sundhöll

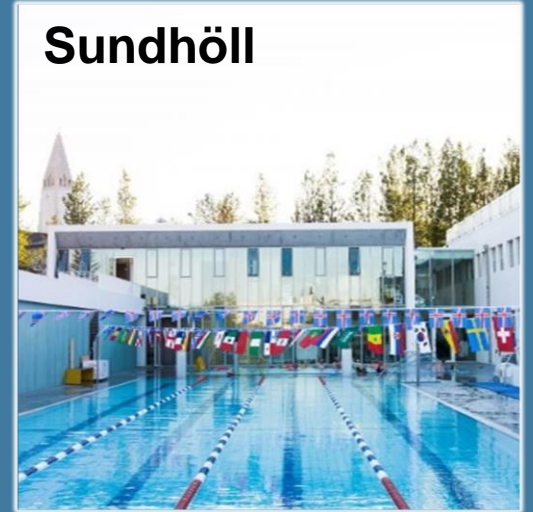

65 milljónir

Víkingur - gervigras



215 milljónir

Skíðasvæði



364 milljónir

Fjölskyldu og húsdýragarðurinn




360 milljónir

Gatna- og umhverfisframkvæmdir 2019

Nær 9 milljarðar í gatna- og umhverfisframkvæmdir á árinu 2019

Stærsta framlagið í uppbyggingu á nýjum hverfum


1.300 milljarðar í miðborgina

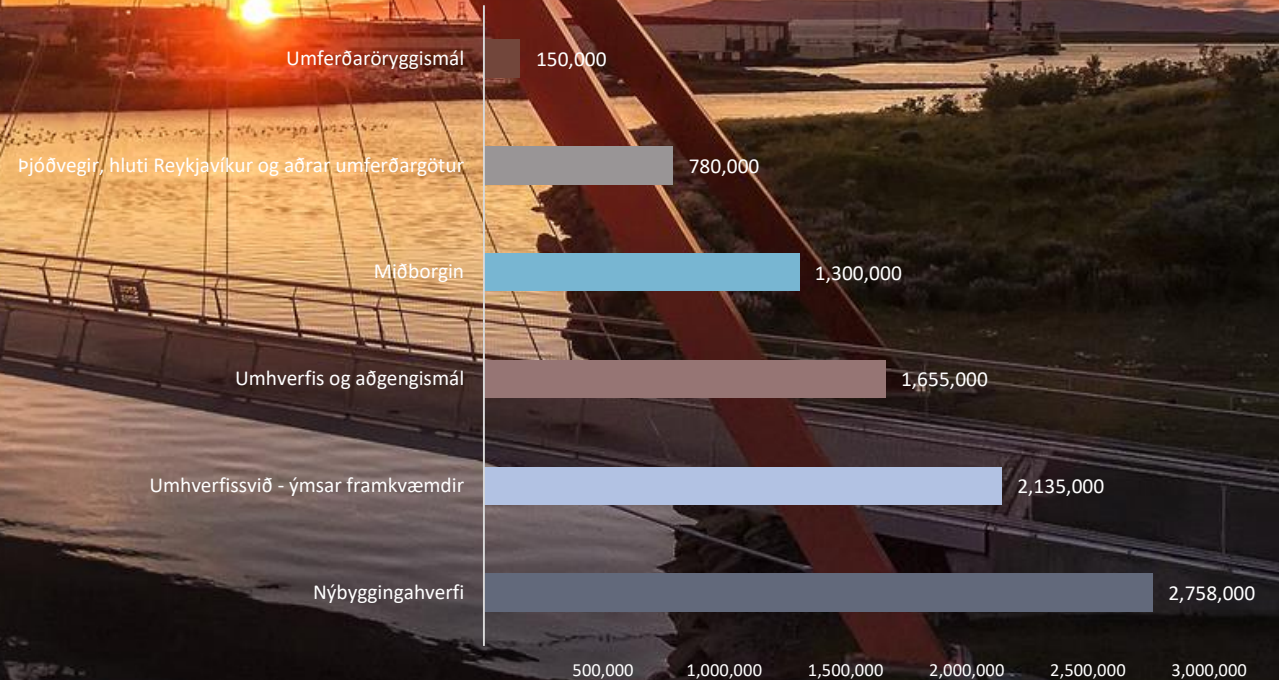

Þjóðvegir

780 milljónir þjóðvegi og umferðargötur

Stærstu verkefni ársins hljóðmanir og forgangsreinar með Vegagerðinni og framkvæmdir á Bústaðavegi

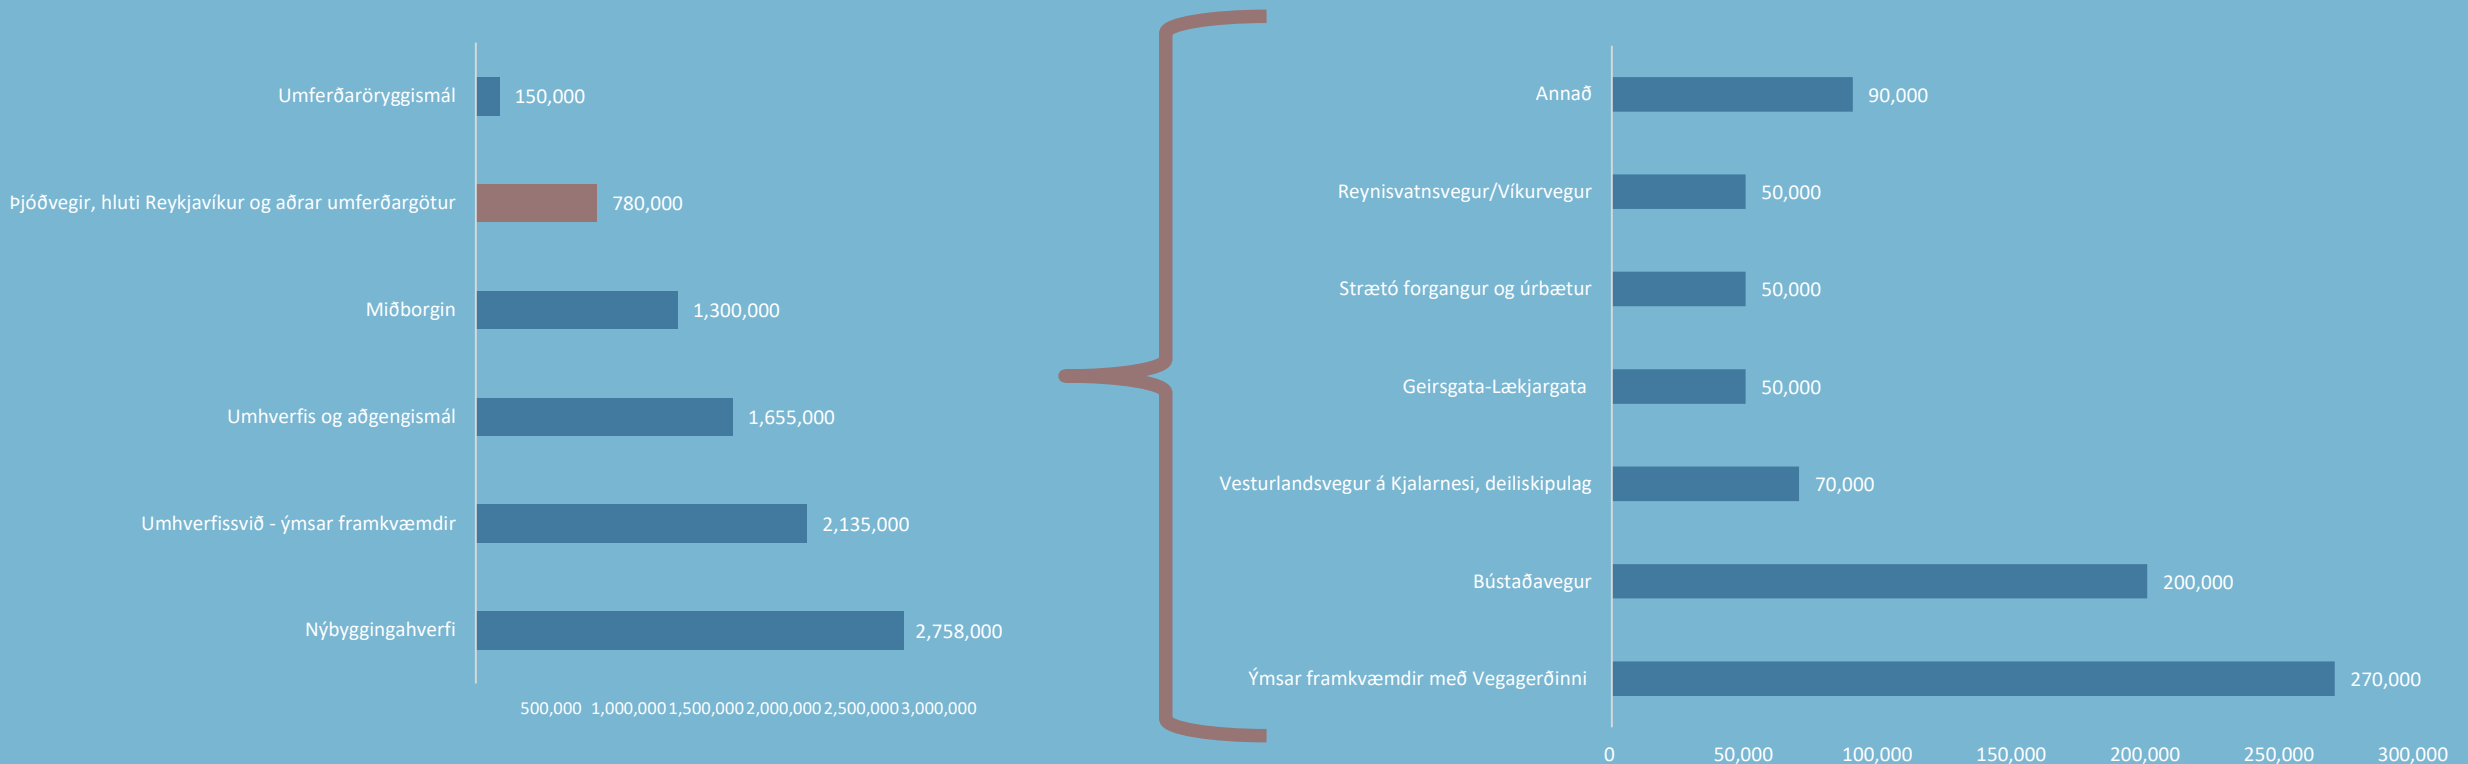

Þjóðvegir

Framkvæmdir með Vegagerðinni



270 milljónir

Bústaðavegur



200 milljónir

Vesturlandsvegur



70 milljónir

Geirsgata



50 milljónir

Strætó



50 milljónir

Reynisvatnsvegur






50 milljónir

Miðborgin

1.300 milljónir áætlaðar í framkvæmdir í miðborginni

Stærstu verkefnin eru á Hverfisgötu, Frakkastíg, Óðinstorgi, Tryggvagötu, Týsgötu og Austurhöfn

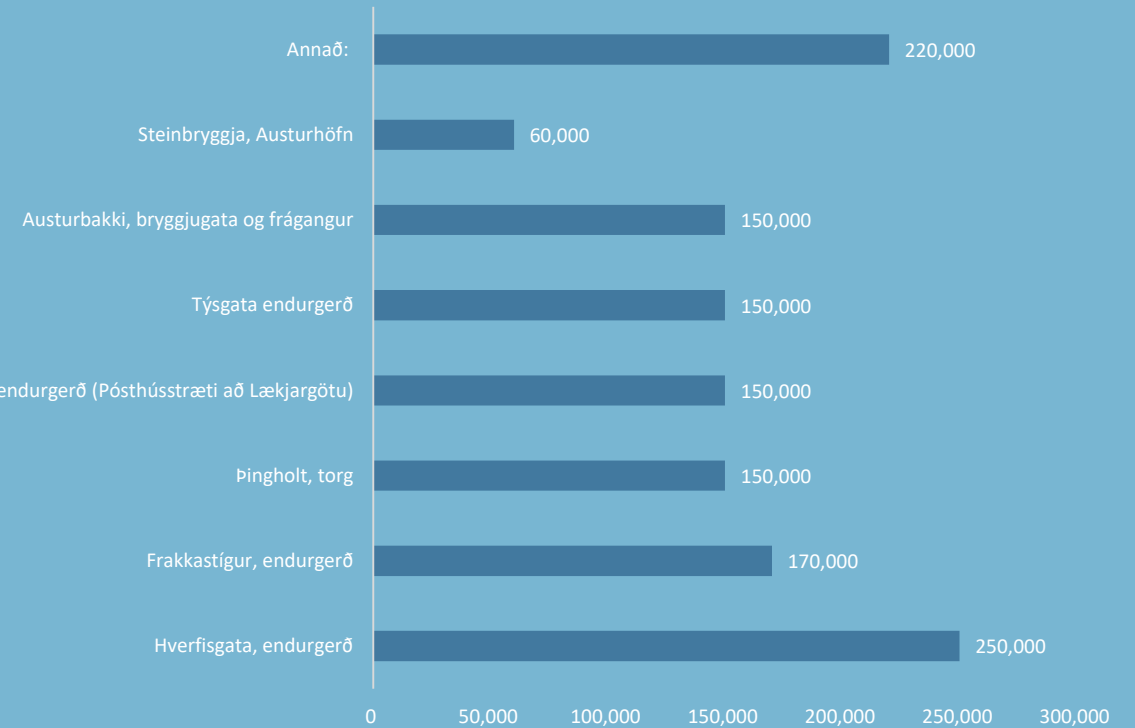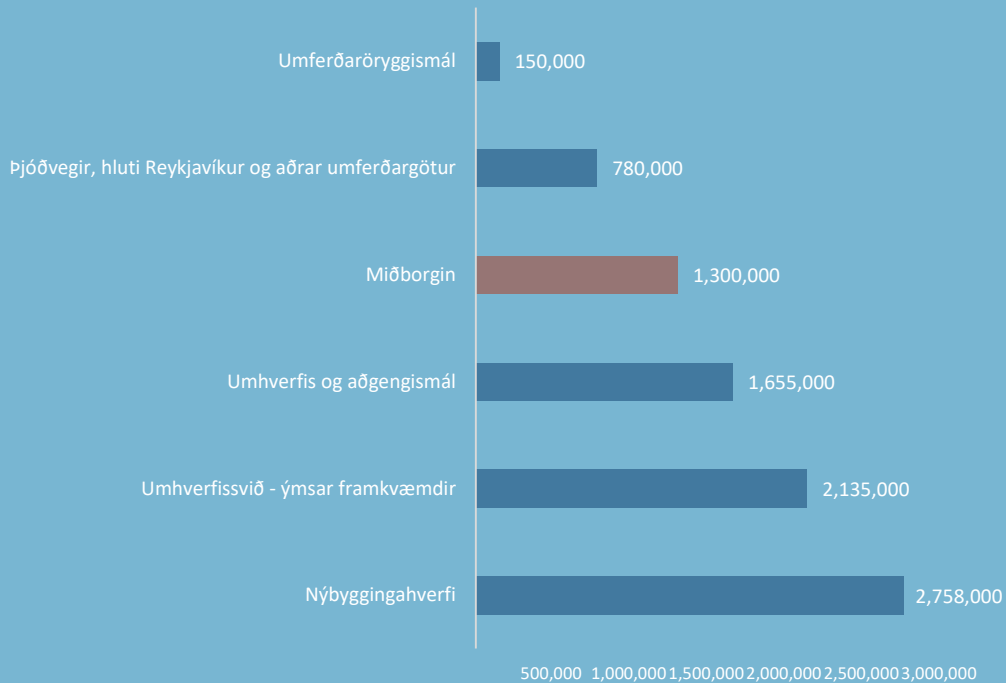

Annað: Laugavegur, Hlemmur, Haðastígur, Naustatorg, Hafnartorg og Miðbakki

Miðborgin

Gamla höfnin

Austurbakki,
150 Milljónir

Tryggvagata, 100 Milljónir

Hverfisgata, 250 Milljónir

Þingholt, 150 Milljónir


Týsgata, 150 Milljónir

Frakkastígur, 170 Milljónir

Rauðarárvík

Höfði

Tjörninn

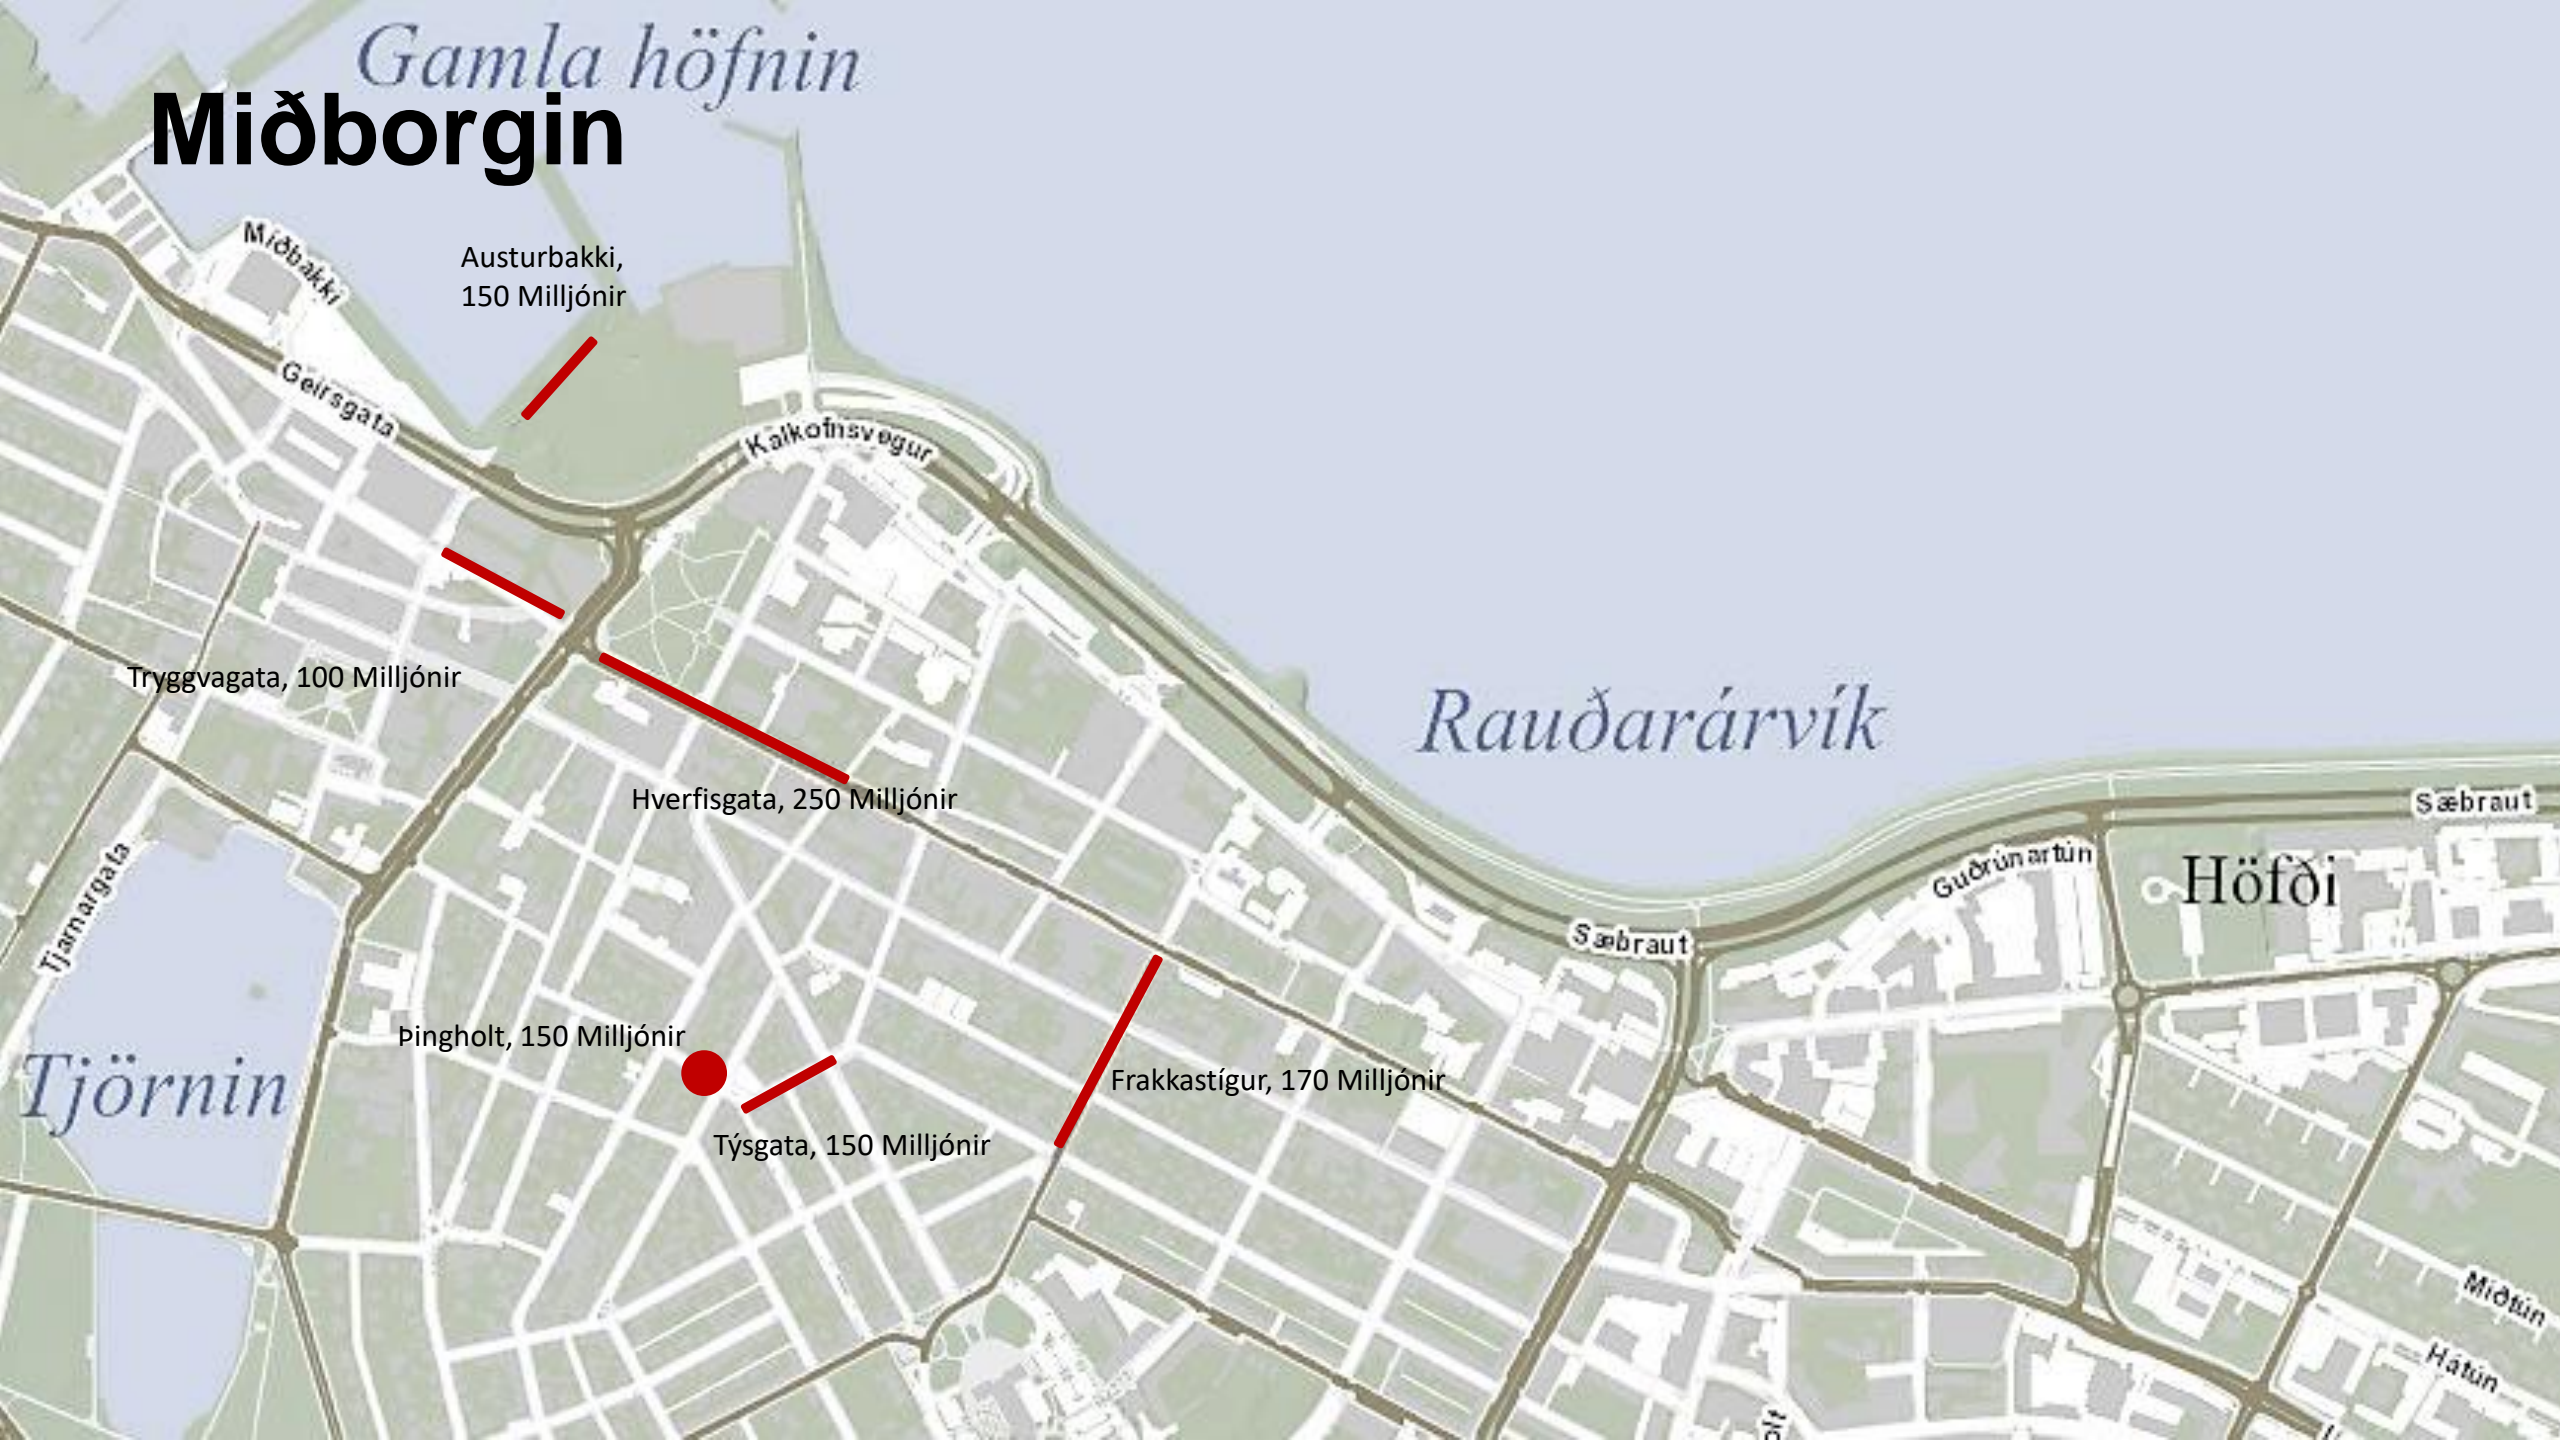

Miðborgin

Hverfisgata



250 milljónir

Frakkastígur



170 milljónir

Pingholt



150 milljónir

Týsgata



150 milljónir

Tryggvagata



150 milljónir

Austurbakki




150 milljónir

Umhverfis- og aðgengismál

1.655 milljónir í umhverfis- og aðgengismál

Stærstu verkefnin uppbygging á göngu- og hjólastígum og LED-væðing á götulýsingu

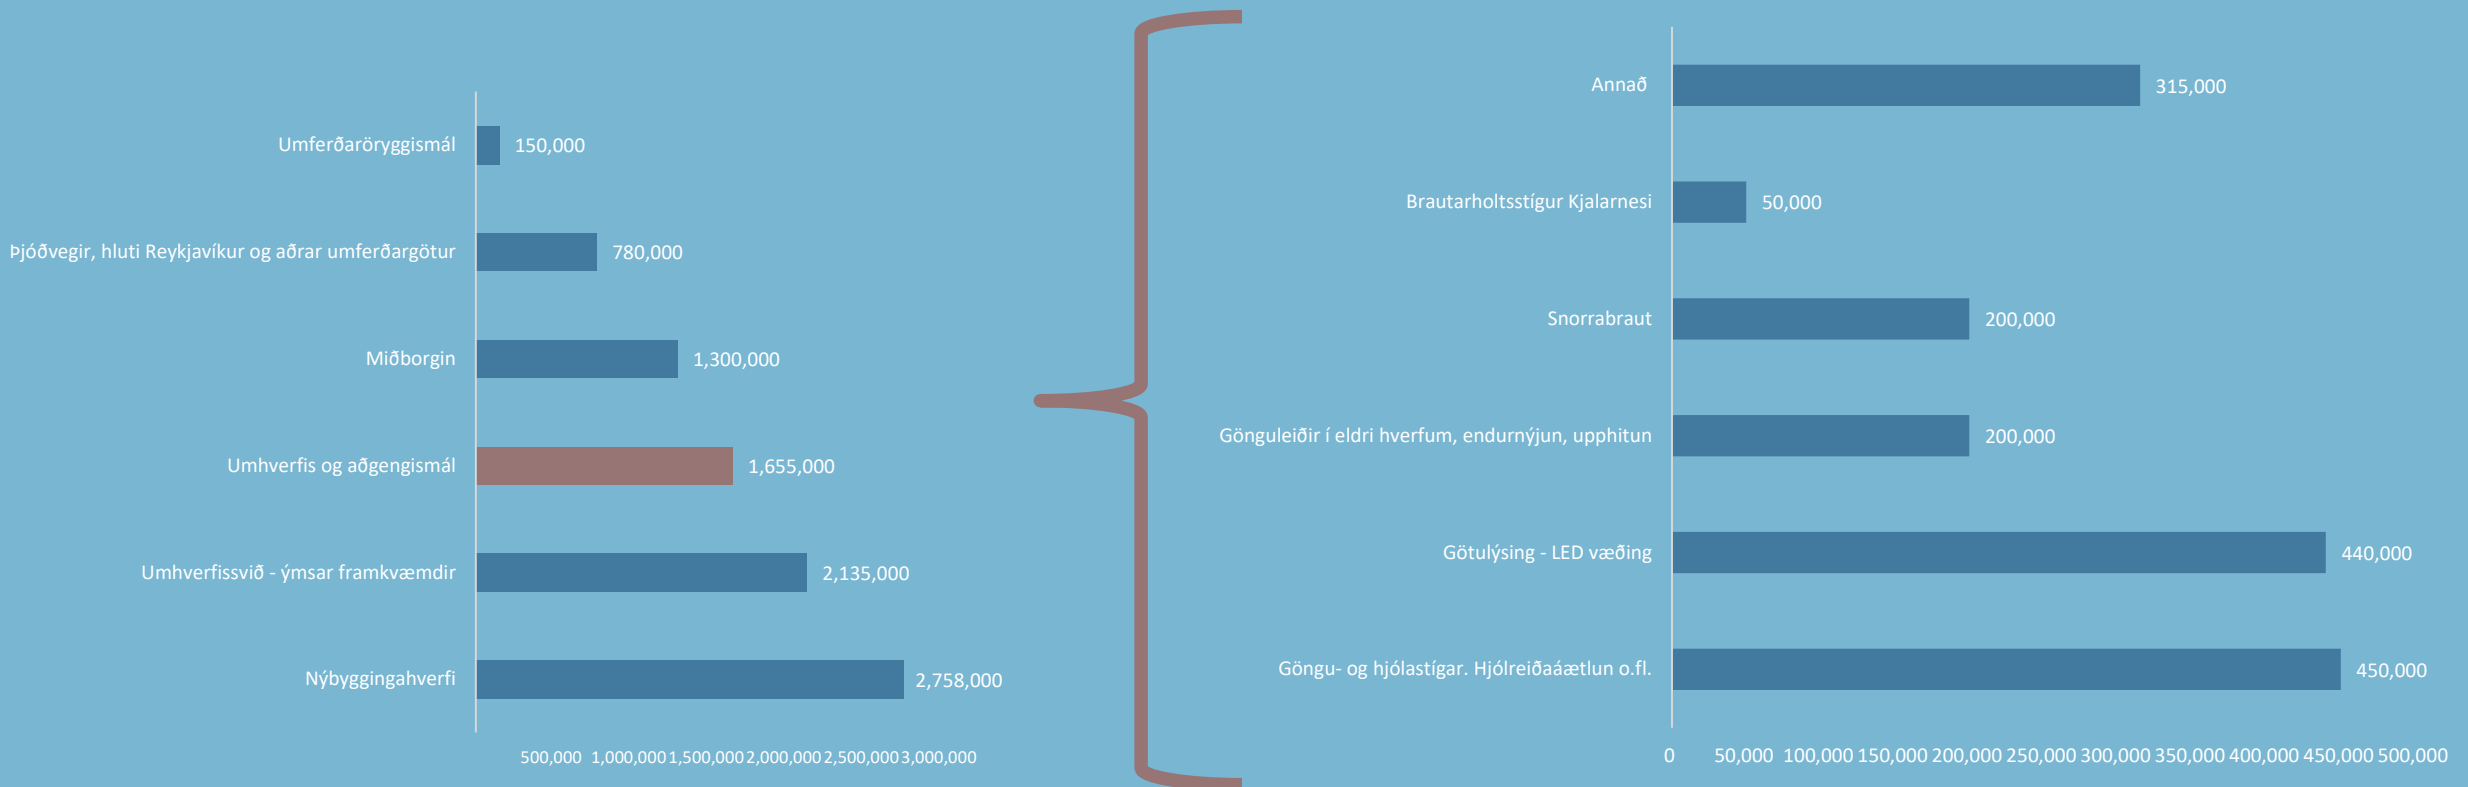

Umhverfis- og aðgengismál

Göngu- og hjólastígar



450 milljónir

Snorrabraut



200 milljónir

Ljósastaurar - LED



440 milljónir

Kjalarnes



50 milljónir

Gangbrautir



200 milljónir

Strætóskýli





50 milljónir

Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir

2.135 milljónir í ýmsar framkvæmdir
umhverfissviðs

Stærstu verkefnið malbikun, borgarlína og
endurnýjun á götulýsingu

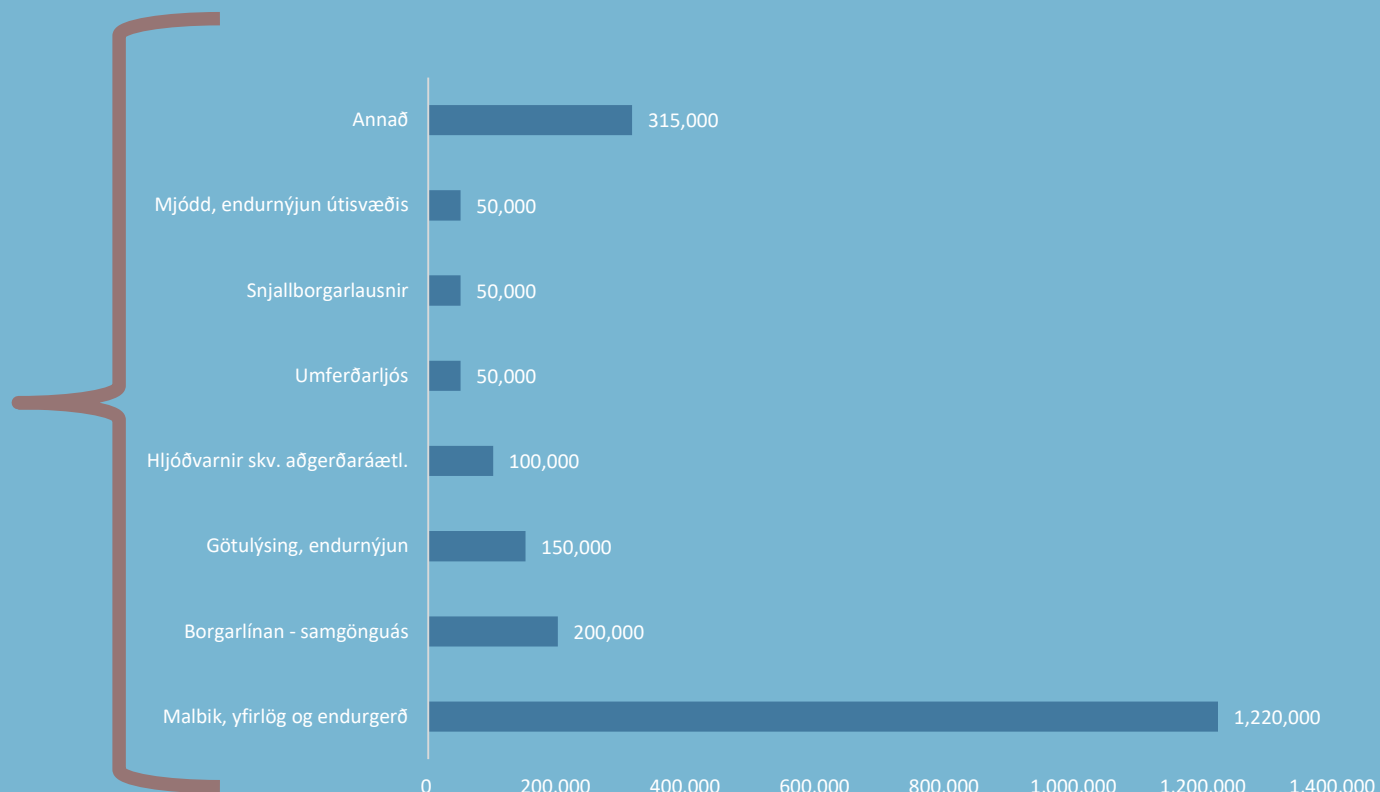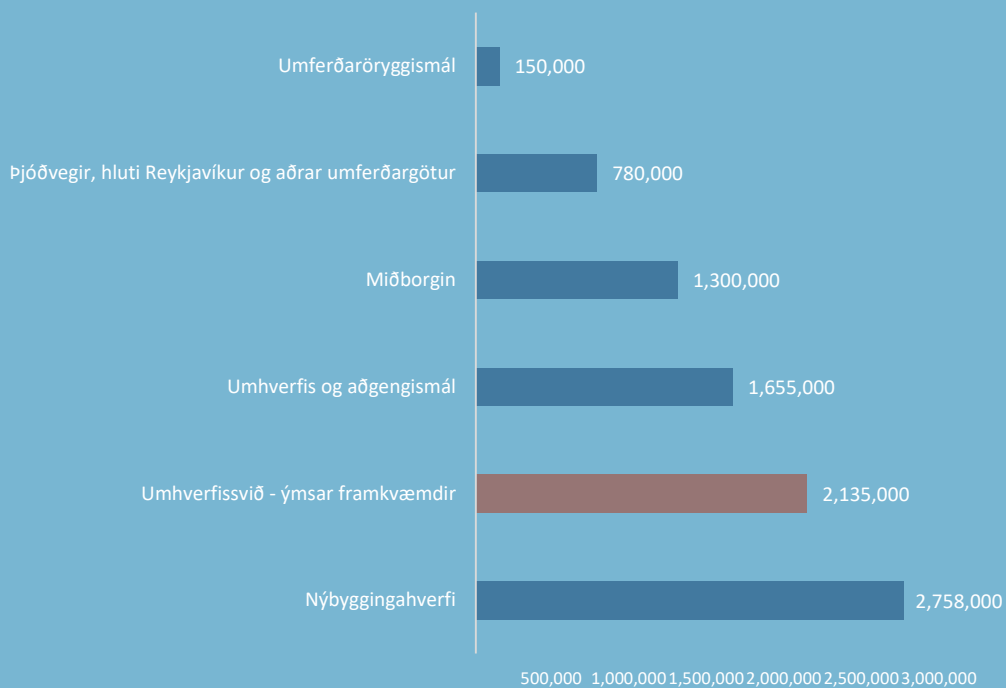

Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir



1.220 milljónir



200 milljónir



150 milljónir



100 milljónir



50 milljónir




50 milljónir

Nýbyggingarhverfi

2.758 milljónir í nýbyggingarhverfi

Stærstu verkefnin við Vogabyggð, Gufunes, Hlíðarenda, Úlfarsárdal og Vesturbugt

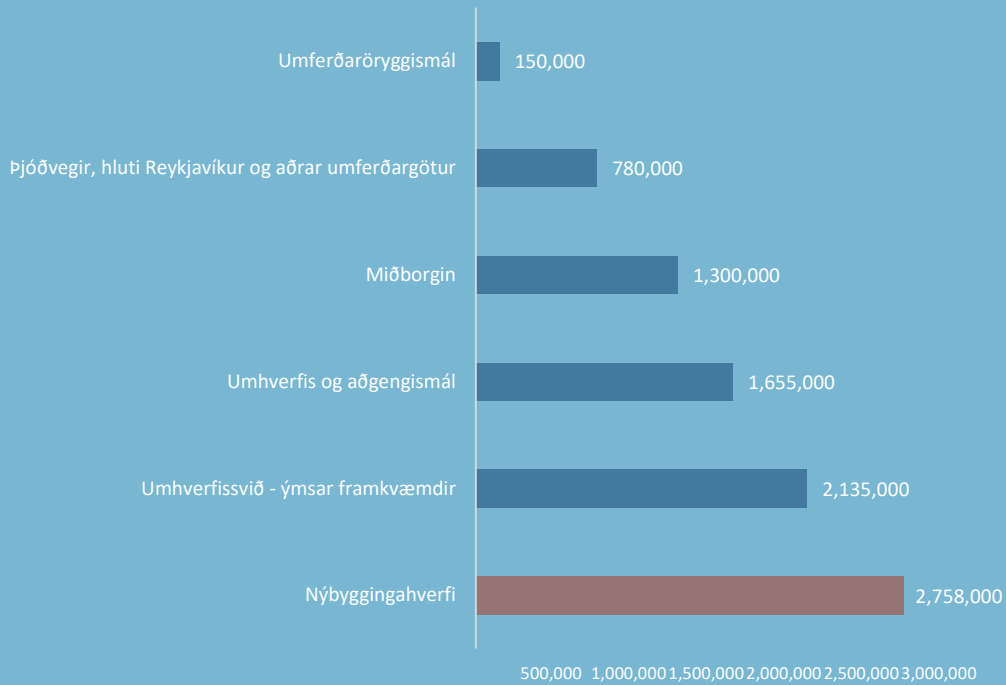

Nýbyggingarhverfi



500 milljónir



105 milljónir



113 milljónir



300 milljónir




255 milljónir



250 milljónir

Aðrar fjárfestingar 2019



2,2 milljarðar í aðrar fjárfestingar í borginni. Stærsti liðurinn snýr að uppfærslu á hugbúnaði og tölvubúnaði hjá borginni

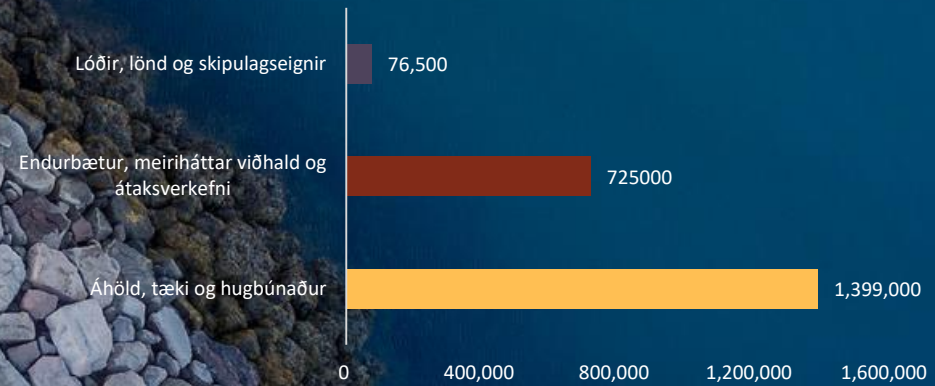

Lönd, lóðir og skipulagseignir

76 milljónir í þróun á eignum

Stærstu verkefnin ný samgöngumiðstöð,
þróun nýrra byggingarsvæða og
kirkjugarður við Úlfarsfell

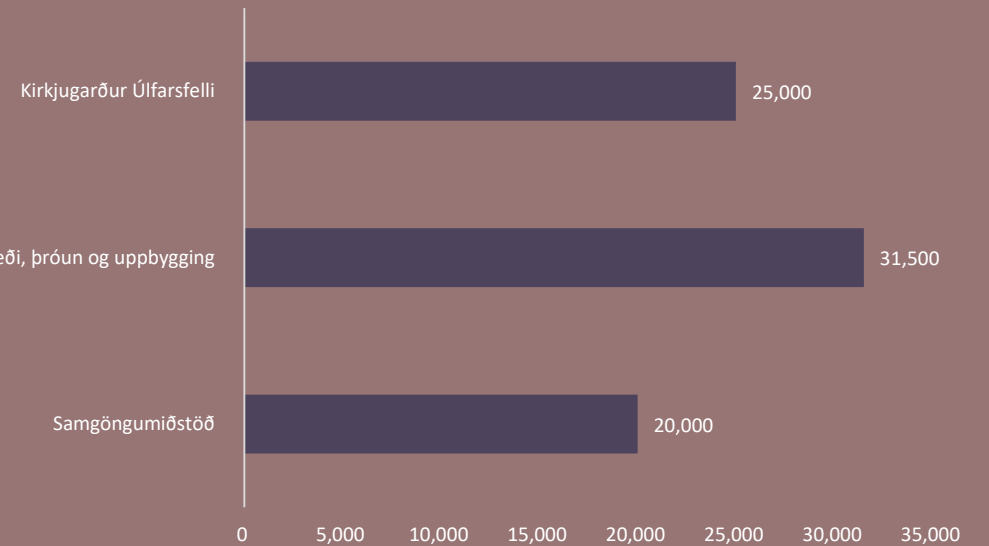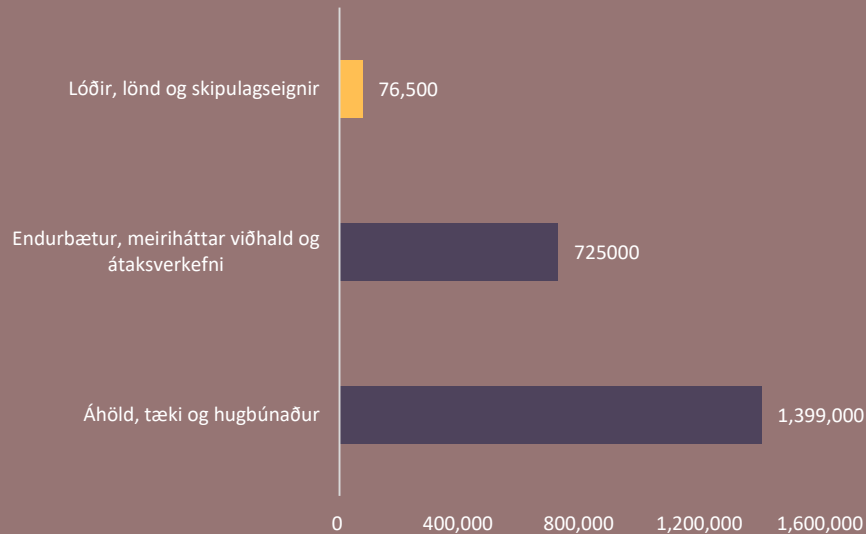

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

725 milljónir í endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni



Stærstu verkefni Betri hverfi



Áhöld, tæki og hugbúnaður

1.399 milljónir í Áhöld, tæki og búnað

Stærstu verkefnin endurnýjun tölvubúnaðar og hugbúnaðarkaup

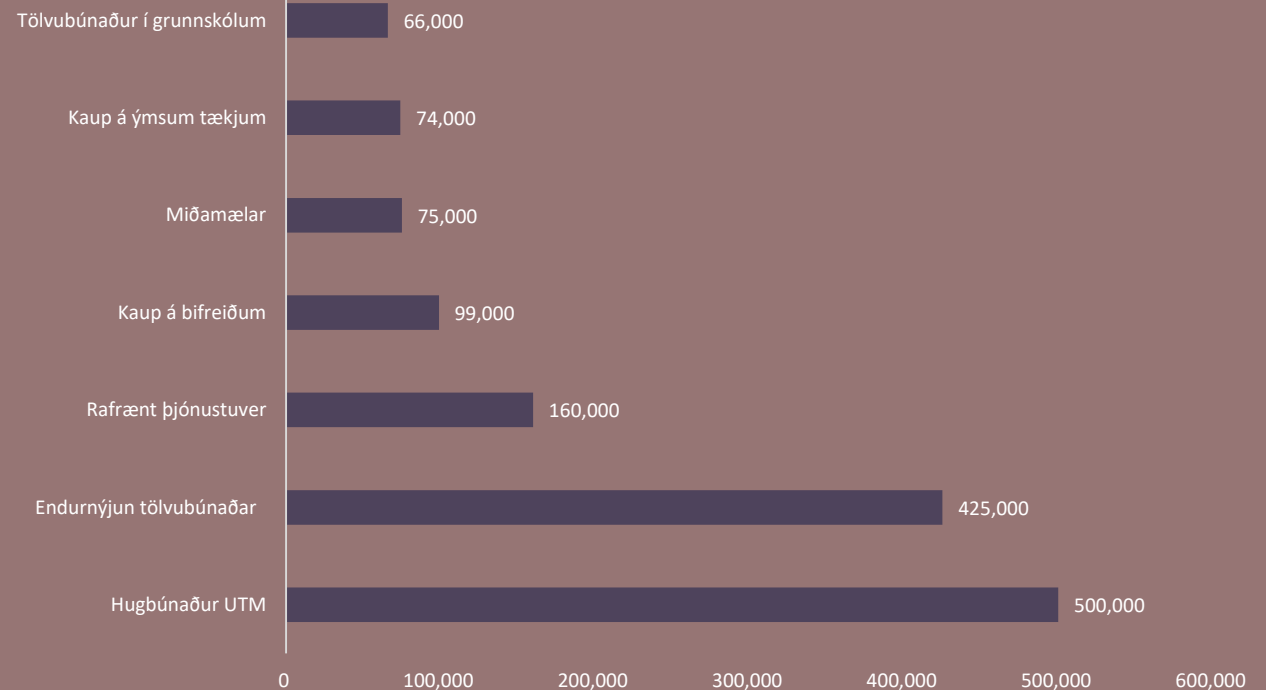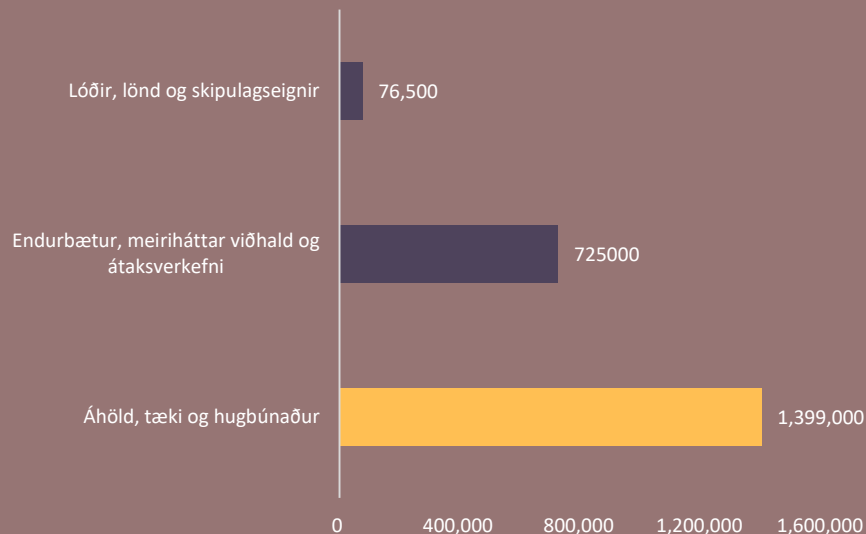



FJÁRFESTING REYKJAVÍKURBORGAR 2019

Dagur B. Eggertsson, Borgarstjóri

Útboðsþing 2019



▶ Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Hrafnkell Á. Proppé
svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Hvað er í gangi á höfuðborgarsvæðinu

Hrafnkell Á. Proppé

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Útboðsþing SI, janúar 2019



SSH – Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu



SORPA



SSH er formlegur samstarfsvettvangur sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Kemur að sameiginlegri stefnumótun sveitarfélaganna, byggðarsamlaga og annarra samstarfsverkefna.

Heldur utan um sameiginlegar hagtölur og greiningar.

Vöxtur er viðfangsefni höfuðborgarsvæðisins. Þróun
mannfjöldans er ráðandi þáttur í framkvæmdapörf hverju sinni.

70.000

A large crowd of people is gathered outdoors, likely at a festival or public event. The image is overlaid with a large white number '70.000' in the center. The background shows various buildings and a cloudy sky.

Mannfjöldapróun




Íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um ríflega 17.000 á árunum 2015-2018

Mannfjöldaspá gerir ráð fyrir hraðari fjölgun næstu fjögur árin og að íbúum fjölgi um 22.000 á árunum 2019-2022.

Gangi spár eftir verða íbúar á höfuðborgarsvæðinu 250 þúsund í lok árs 2022.


Megin drifkraftur fjölgunarinnar er aðflutningur fólks. Spáin er því viðkvæm fyrir efnahagspróun – á Íslandi og í heiminum öllum.

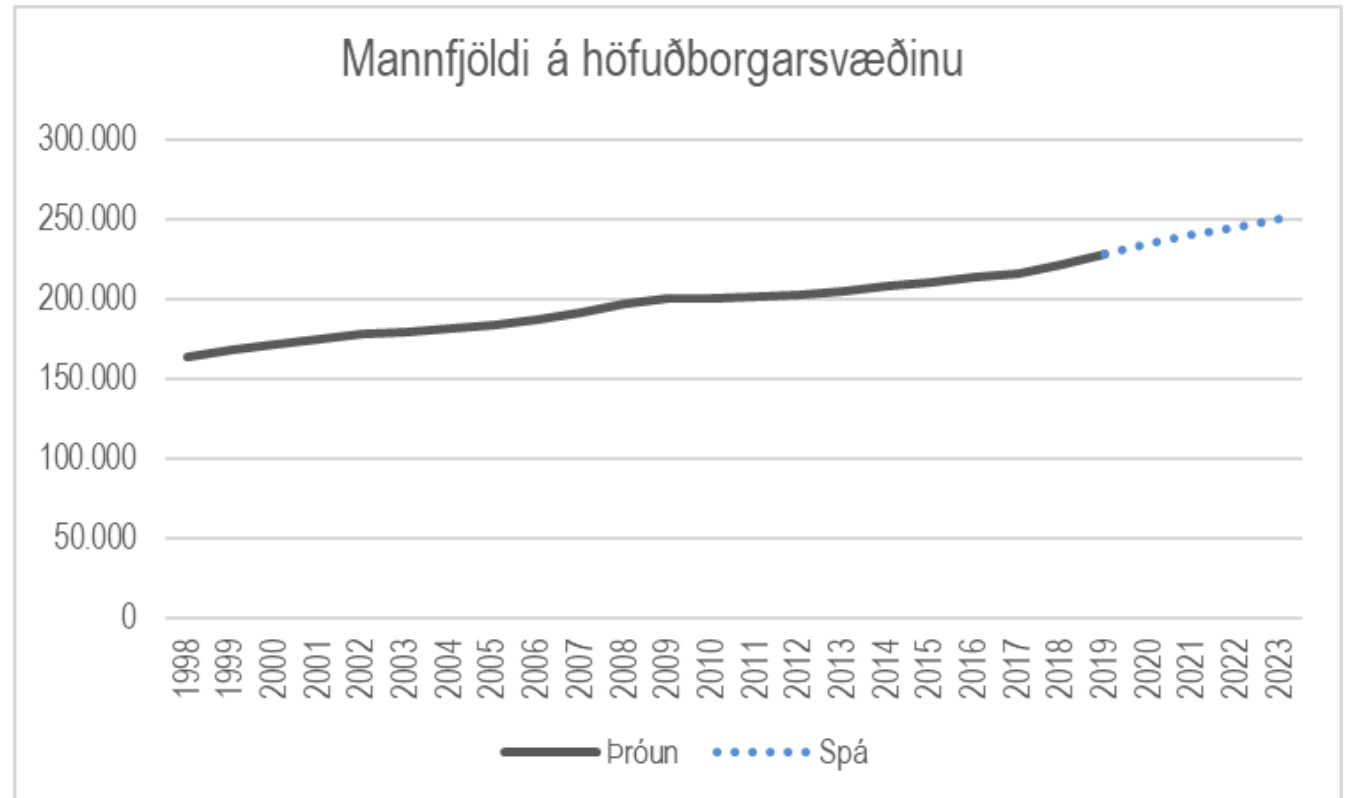

Stóra myndin

Eins og lesa má í fjárhagsáætlunum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (utan Reykjavíkur) mun heildarfjárfesting þeirra á árinu 2019 verður ríflega 14 milljarðar króna.


Sveitarfélögin áforma að verja ríflega 48 milljarða til framkvæmda á næstu 4 árum.

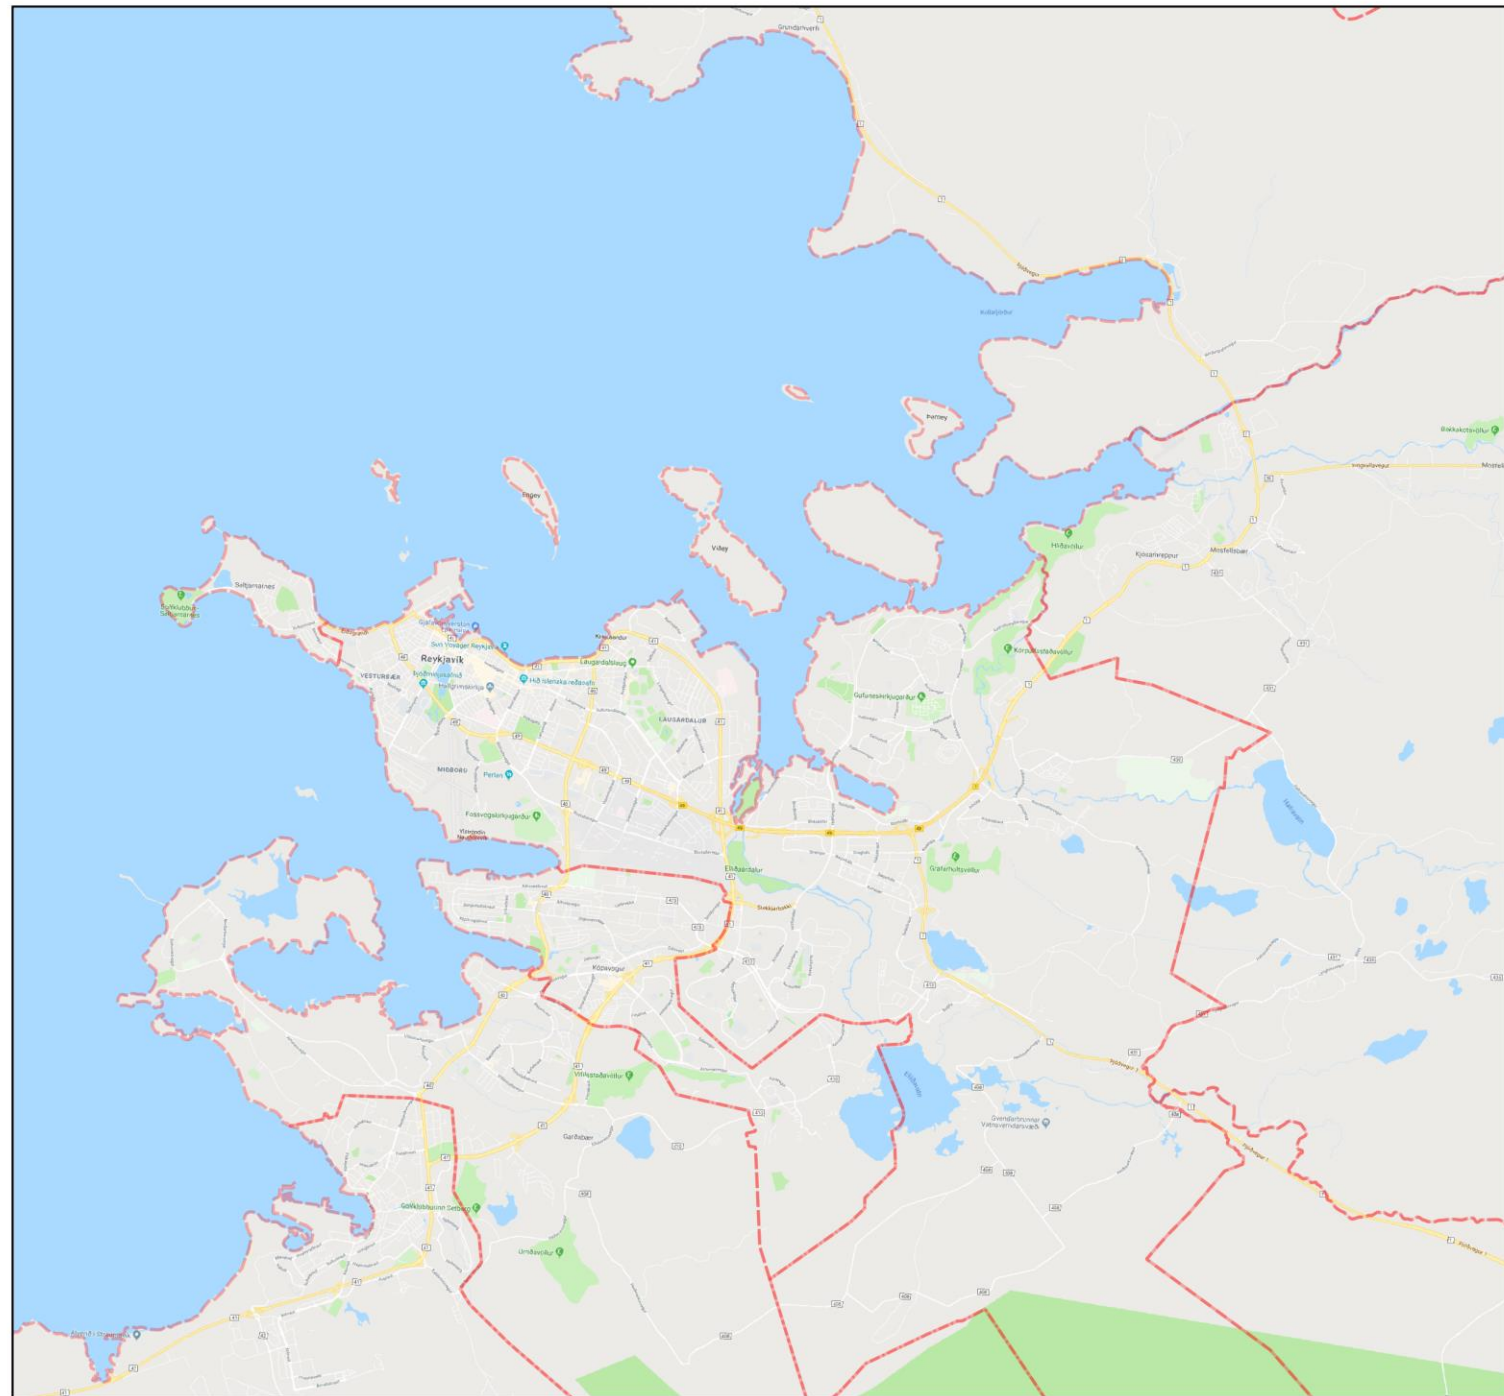

Skólar og íþróttamannvirki

Framkvæmdir 2019	Sv.félag	Mkr.
Skóli og íþróttamannvirki í Kórnum	KÓP	230
Kópavogsskóli	KÓP	120
Kársnesskóli	KÓP	150
Húsnæði skólahljómsveitar	KÓP	450
Kópavogsvöllur	KÓP	250
Skarðshlíðarskóli	HAF	1.450
Íþróttamannvirki Kaplakrika	HAF	590
Álftanesskóli	GAR	620
Urriðaholtsskóli	GAR	670
Fjölnota íþróttahús	GAR	620
Helgafellsskóli	MOS	655
Íþróttamiðstöð	MOS	110
Fjölnota íþróttahús	MOS	600
Íþróttamiðstöð	SEL	800
Nýr leiksskóli	SEL	1.000


Framkvæmdir 2020-22	Sv.félag	Mkr.
Nýr leiksskóli	KÓP	500
Leiksskóli Kársnes	KÓP	300
Kársnesskóli	KÓP	2.000
Smáraskóli	KÓP	470
Leiksskóli Suðurbæ	HAF	430
Leiksskóli á nýbyggingarsvæðum	HAF	700
Íþróttamannvirki Kaplakrika	HAF	1.430
Urriðaholtsskóli	GAR	600
Fjölnotaíþróttahús	GAR	1.840
Helgafellsskóli	MOS	1.835
Íþróttasvæði	MOS	400

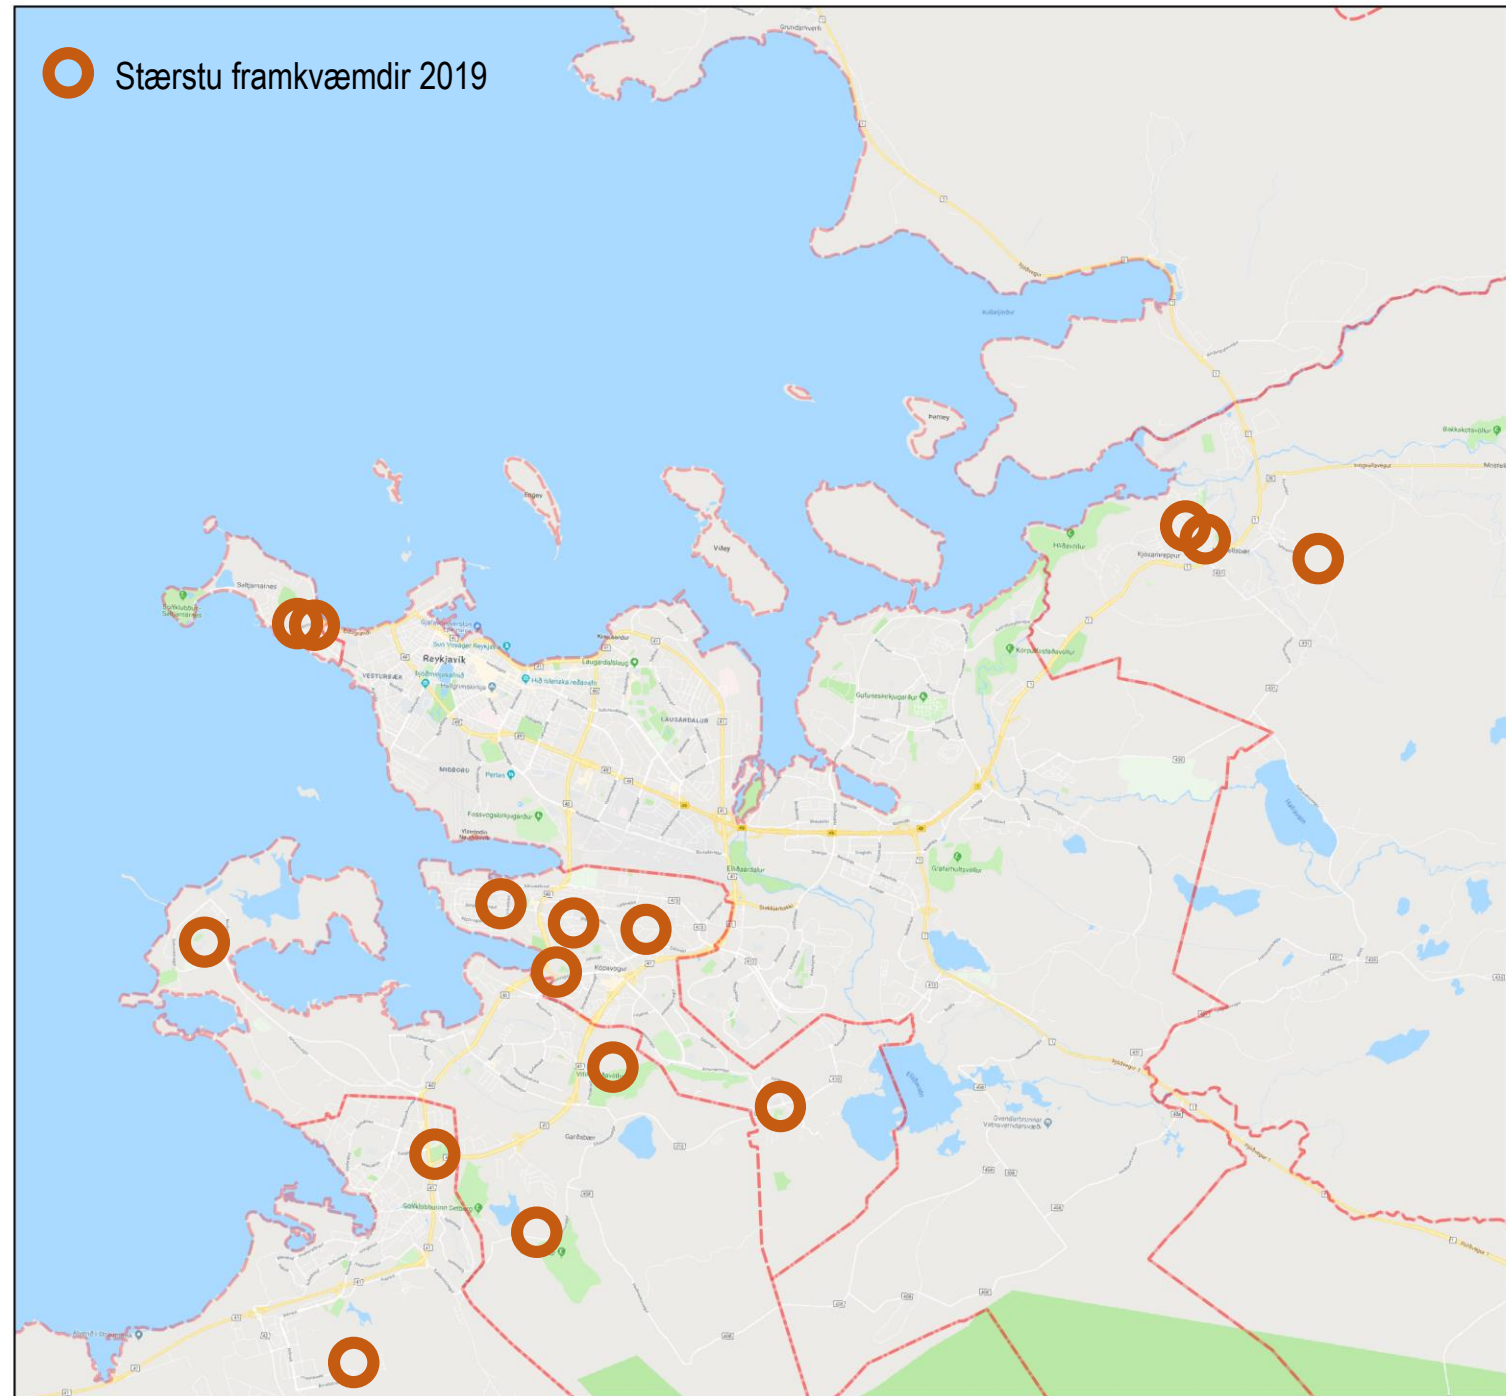

Ýmislegt

Framkvæmdir 2019	Sv.félag	Mkr.
Hjúkrunarheimili Sólvangi	HAF	400
Gas- og jarðgerðarstöð	Sorpa	3.600
Móttökustöð Gufunesi	Sorpa	500
Ný slökkvistöð	SHS	600
Skíðasvæði Bláfjöll	Skíðasv.	


Framkvæmdir 2020-2022	Sv.fél	Mkr.
Hjúkrunaríbúðir Boðabing	KÓP	360
Sambýli Fossvogsbrún	KÓP	270
Bæjarskrifstofur	KÓP	400
Bæjargarður og stígar Garðabæ	GAR	375
Garðatorg	GAR	225
Skíðasvæðin Bláfjöllum og Skálafell	Skíðasv.	3.600

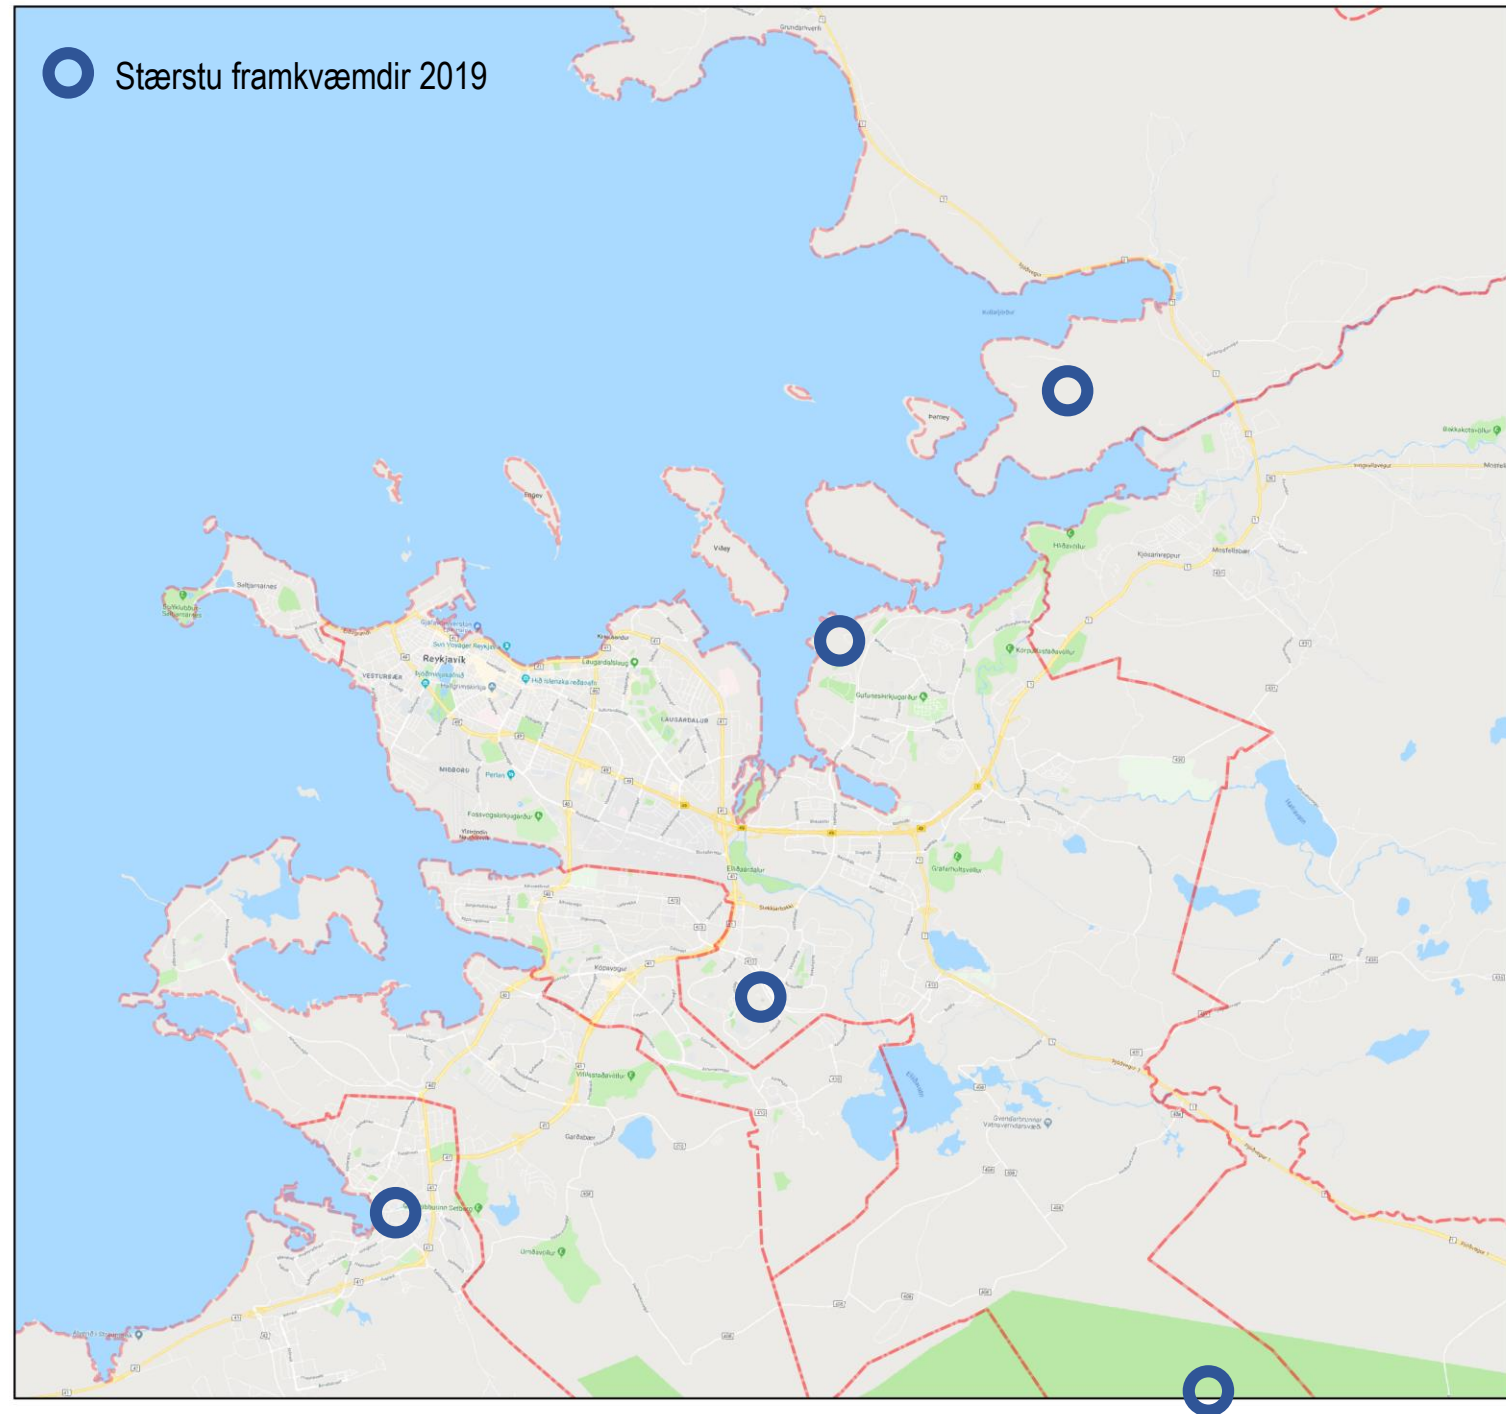

Byggingarsvæði, gatnagerð og veitur

Framkvæmdir 2019	Sv.félag	Mkr.
Kársnes	KÓP	350
201 Smári	KÓP	250
Glaðheimar	KÓP	100
Skarðshlíð	HAF	100
Kaldársselsvegur	HAF	300
Suðurhöfn	HAF	185
Urriðaholti	GAR	550
Súluhöfði	MOS	120
Helgafellshverfi	MOS	100
Desjamýri og vatnstankur í Úlfarsfelli	MOS	190
Bygggarðar	SEL	100


Framkvæmdir 2020-2022	Sv.fél	Mkr.
Kársnes	KÓP	300
Brú yfir Fossvog	KÓP	700
Hamranes I og II	HAF	1.200
Hellna- og Kapelluhraun	HAF	800
Ásvallabraut	HAF	800
Stofnræsi Völlum	HAF	900
Fagridalur nýtt vatnsból	HAF	225
Áftanes, Hnoðraholt og Vífilstaðir	GAR	1.650
Helgafellshverfi	MOS	400

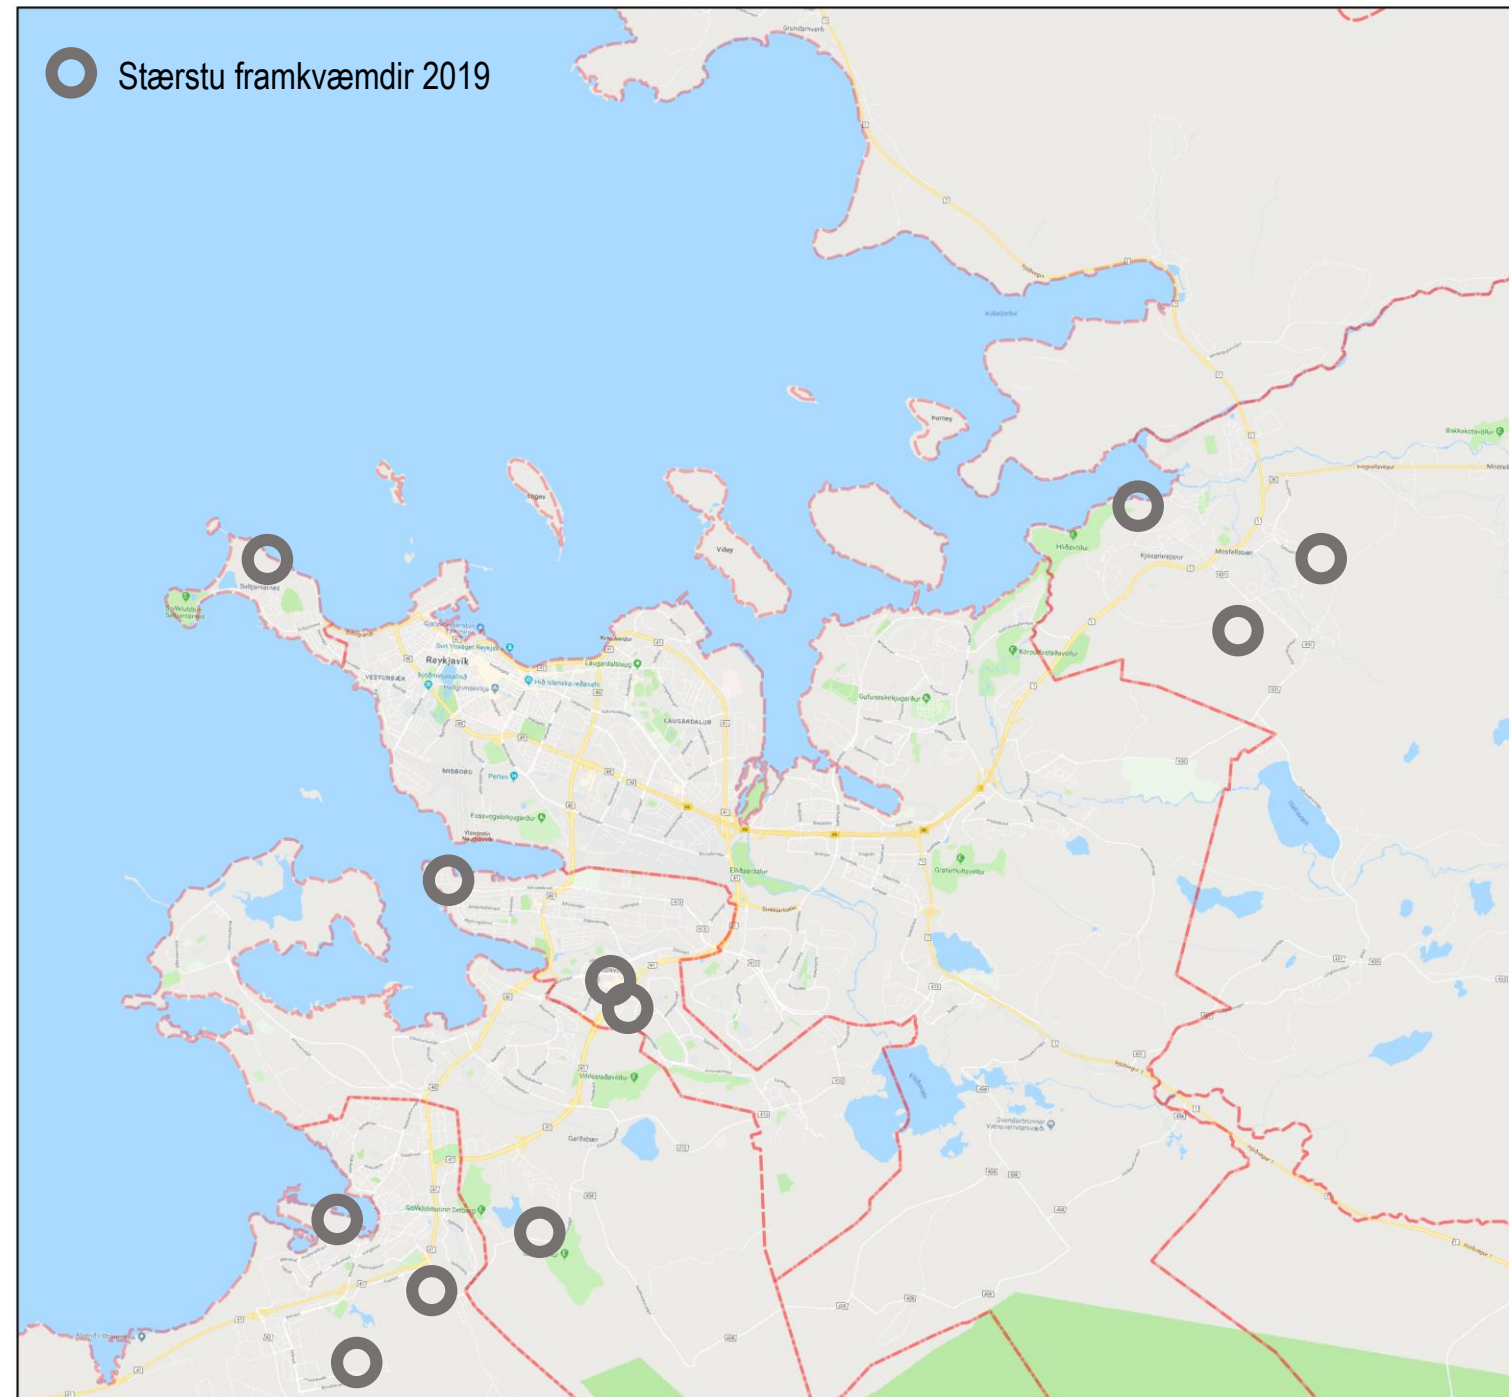

Byggingarsvæði, gatnagerð og veitur

Framkvæmdir 2019	Sv.félag	Mkr.
Kársnes	KÓP	350
201 Smári	KÓP	250
Glaðheimar	KÓP	100
Skarðshlíð	HAF	100
Kaldársselsvegur	HAF	300
Suðurhöfn	HAF	185
Urriðaholti	GAR	550
Súluhöfði	MOS	120
Helgafellshverfi	MOS	100
Desjamýri og vatnstankur í Úlfarsfelli	MOS	190
Byggarðar	SEL	100


Framkvæmdir 2020-2022	Sv.fél	Mkr.
Kársnes	KÓP	300
Brú yfir Fossvog	KÓP	700
Hamranes I og II	HAF	1.200
Hellna- og Kapelluhraun	HAF	800
Ásvallabraut	HAF	800
Stofnræsi Völlum	HAF	900
Fagridalur nýtt vatnsból	HAF	225
Áftanes, Hnoðraholt og Vífilstaðir	GAR	1.650
Helgafellshverfi	MOS	400
Borgarlína 1. framkvæmdaáfangi		16.300

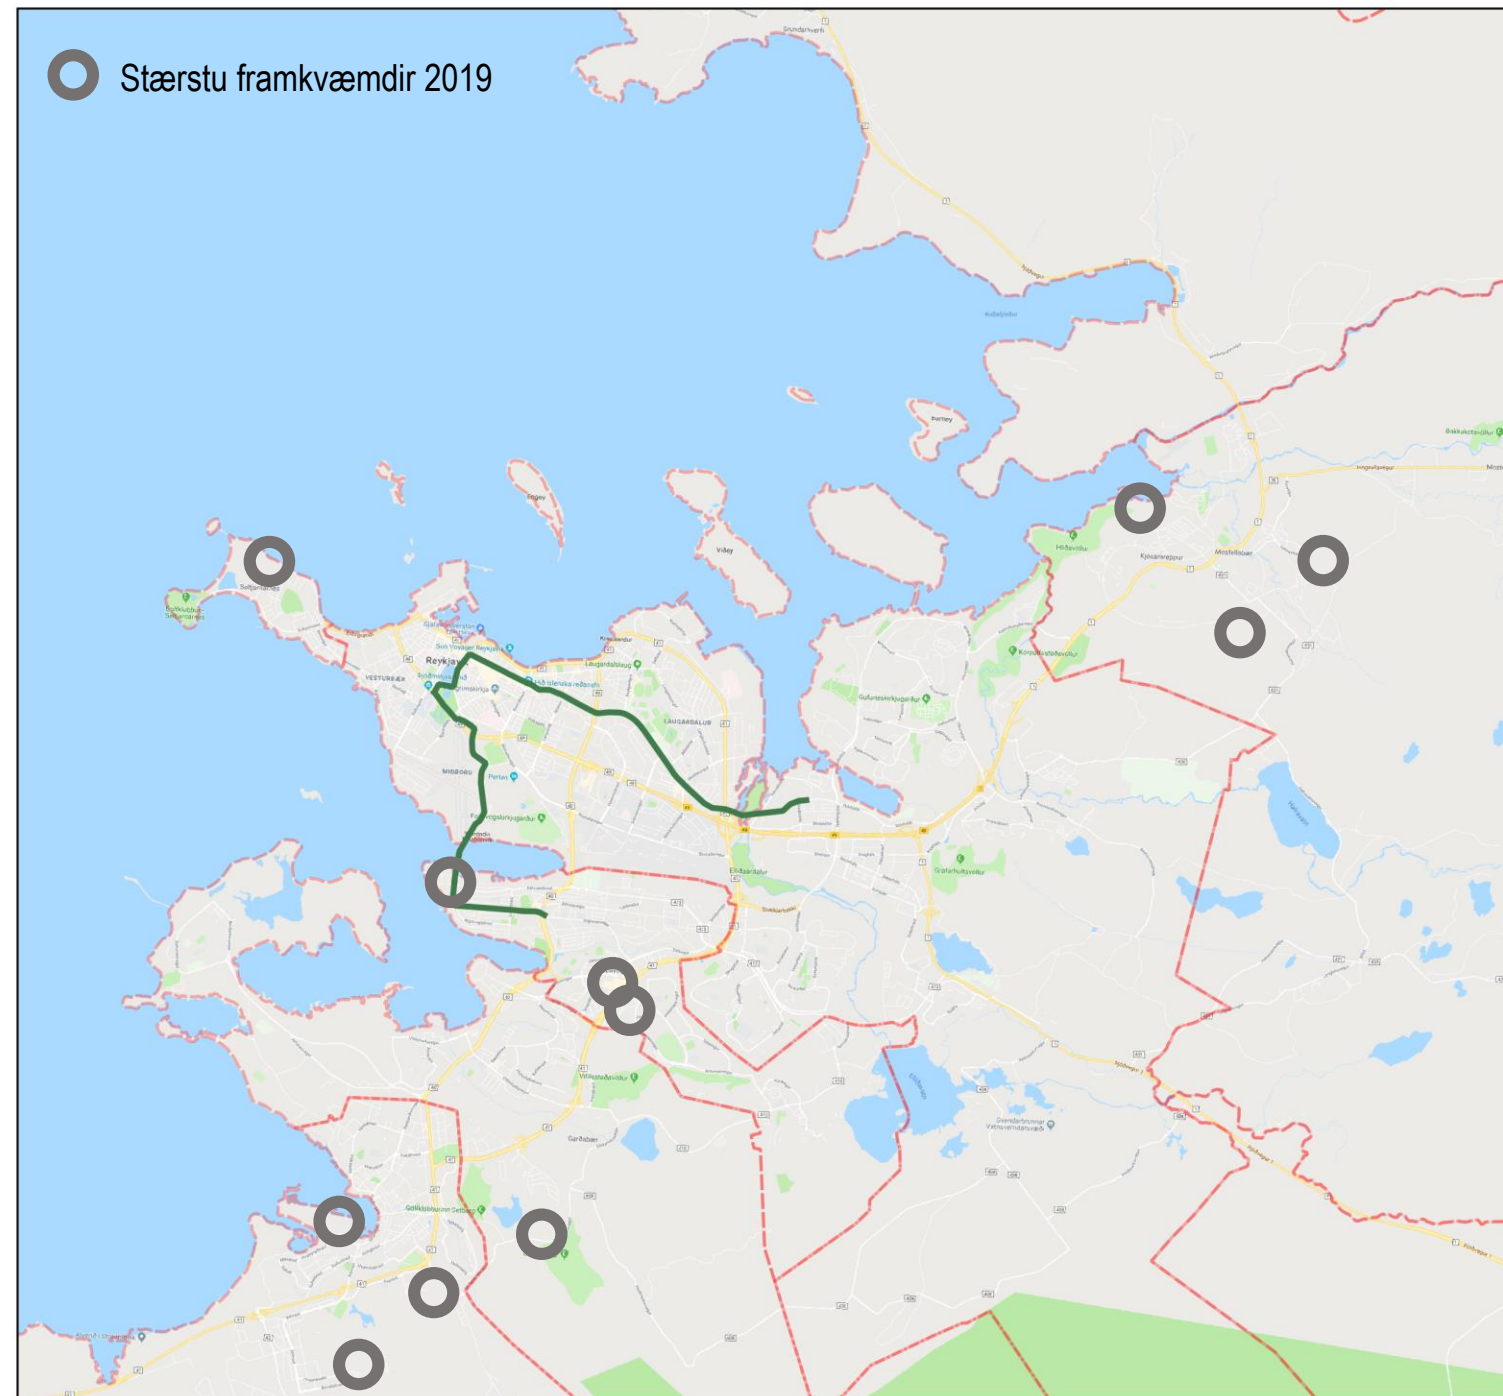

Yfir 5.000 íbúðir eru í byggingu á höfuðborgarsvæðinu nú í dag.

Áætla má að milli 10-11.000 fullbúnar íbúðir munu bætast við húsnæðisstofninn til ársins 2022.

Stór hluti þeirra íbúða verður í nálægð við góðar almenningsamgöngur – Borgarlínu eða stofnleiðir Strætó

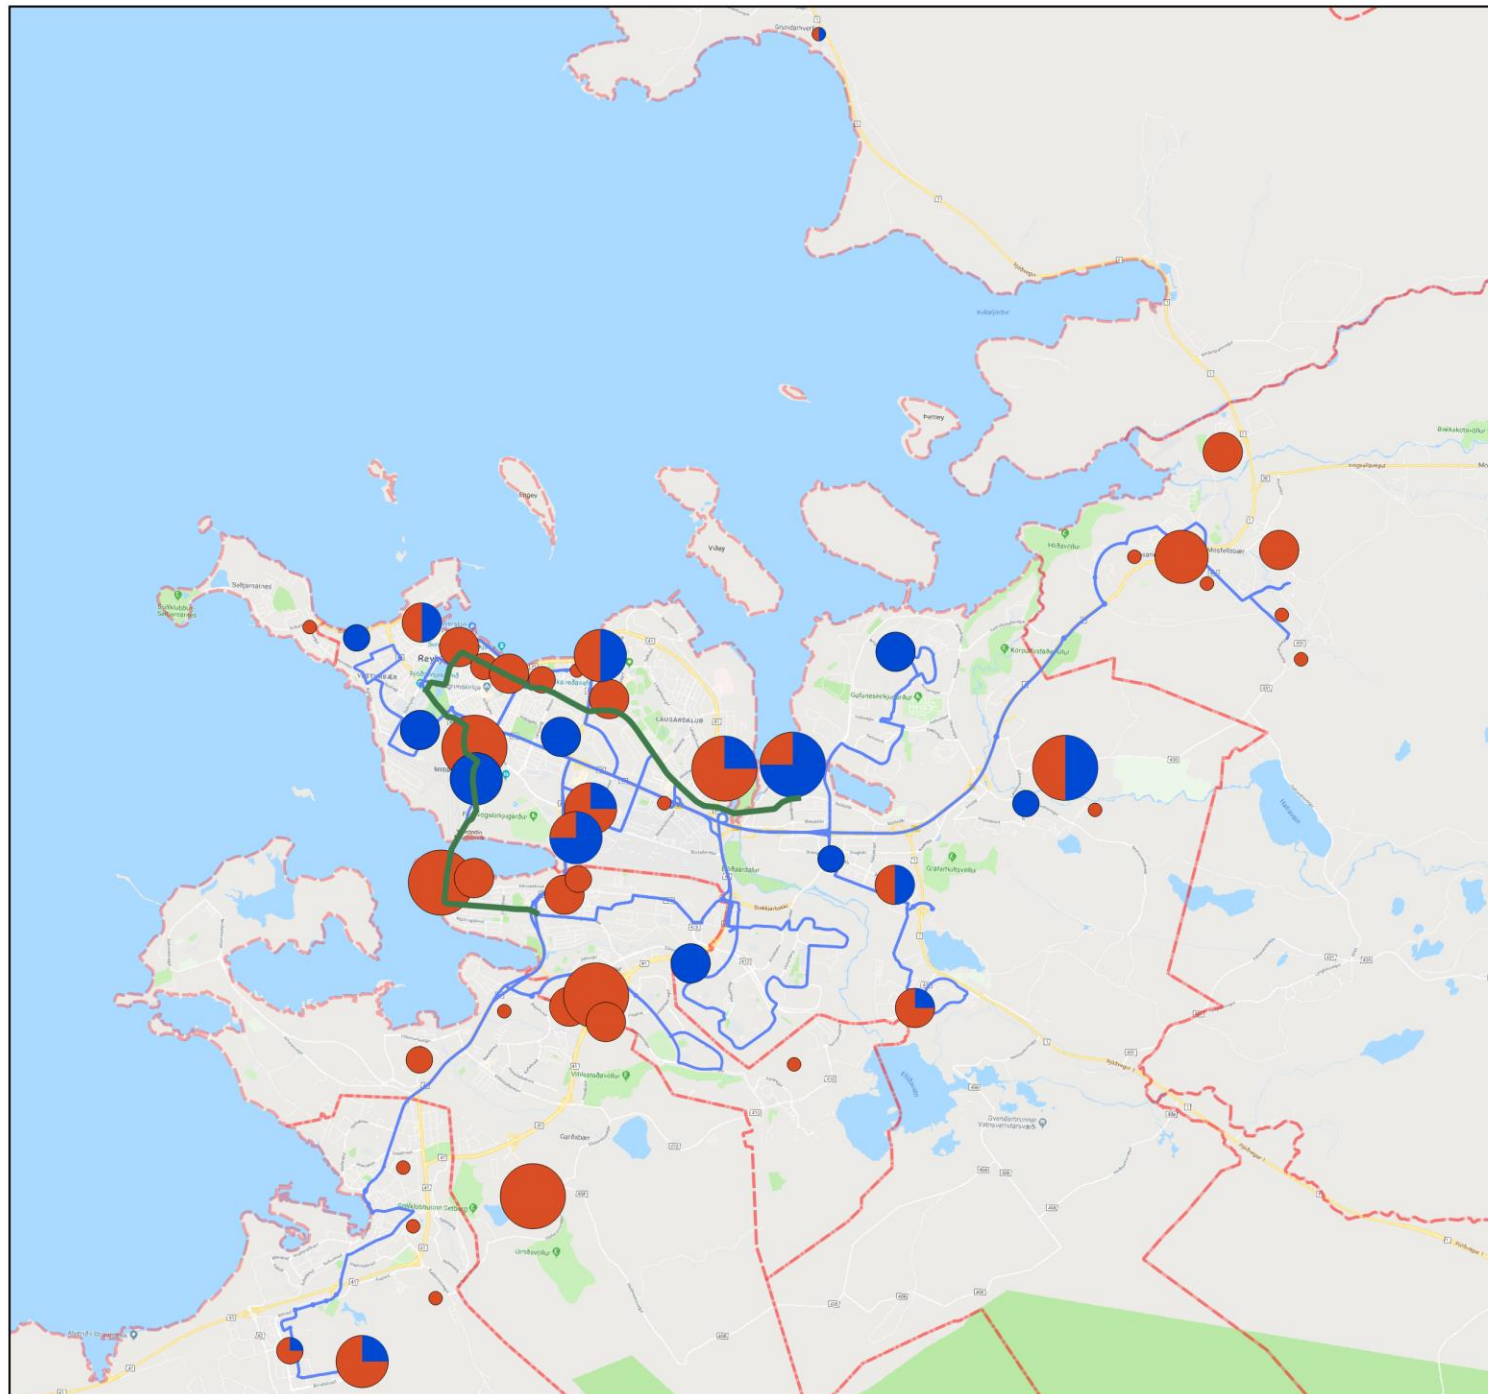

Skýringar

- Borgarlína
- Strætó - stofnleiðir
- Sveitafélagsmörk

Áætlaðar viðbótaríbúðir til ársins 2022.

Í byggingu og áformað.

- 0 - 50
- 50 - 100
- 100 - 250
- 250 - 500
- >500

Hlutfall húsnæðisfélaga:

- 0%
- 1-25%
- 26-50%
- 51-75%
- 76-100%

Unnið fyrir SSH
Dags. 22/01/2019

VSÓ RÁÐGJÖF





▶ Veitur

Inga Lind Valsdóttir
forstöðumaður tækniþróunar



Veitur

FJÁRFESTINGAR 2019

Inga Lind Valsdóttir – Forstöðumaður Tækniþróunar

Útboðsþing SI 2019


Heildarstefna Veitna

FRAMTÍÐASÝN OG STEFNUÁHERSLUR

Tryggj afhending




Nægt heitt vatn

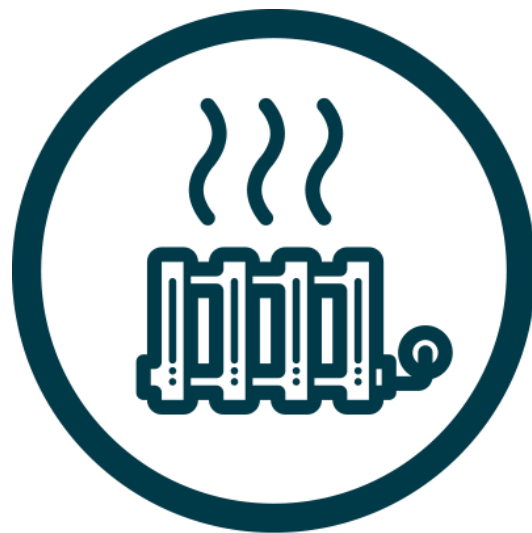

Hreint vatn



Hreinar strendur

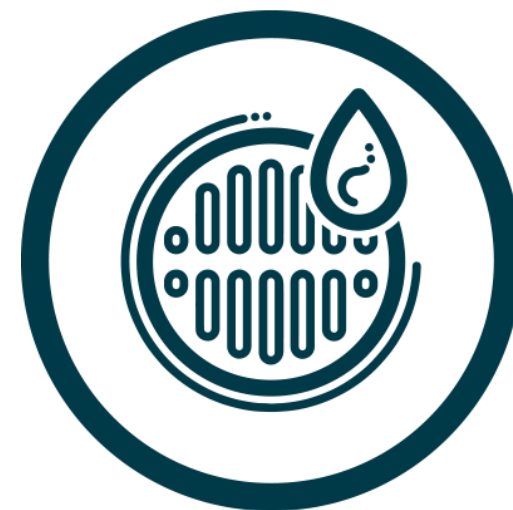

Áherslur fjárfestinga

Fráveita:

- Uppfærsla dælustöðva, hreinar strendur alltaf
- Stækkun hreinsistöðva, sporlaus fráveita
- Losa regnvatn úr blandkerfum og hreinsun á ofanvatni
- Fóðrun lagna og tenginga

Hitaveita:

- Endurnýjun stofnæða á Vesturlandi og á höfuðborgarsvæðinu
- Forðaaukning á veitusvæðinu
- Aukning á nýtingu virkjanavatns

Vatnsveita:

- Heilnæmi vatns ávallt tryggt
- Tvöfalt öryggi vatnstöku fyrir Reykjavík
- Endurnýjun stofnæða

Rafveita:

- Stækkun/endurnýjun aðveituspenna
- Endurnýjun aðveitustöðva (byggingar)
- Bygging nýrrar aðveitustöðvar
- Loftlínur í jörð
- Endurnýjun og nýlagnir jarðstrengja

Almennar endurnýjanir byggðar á ástandsgreiningum og samvinnu við sveitarfélög um samstarfsverkefni




Fjárfesting í veitukerfum Veitna 2019

- Fjárfestingaáætlun ársins: 8.700 m.kr.
- Verkefni að frumkvæði Veitna: 7.300 m.kr.
- Samstarfsverkefni: 1.400 m.kr.



Fjárfestingar Veitna (VoF meðtalin) eftir árum og veitum á núverandi verðlagi - tölur í mö.kr.

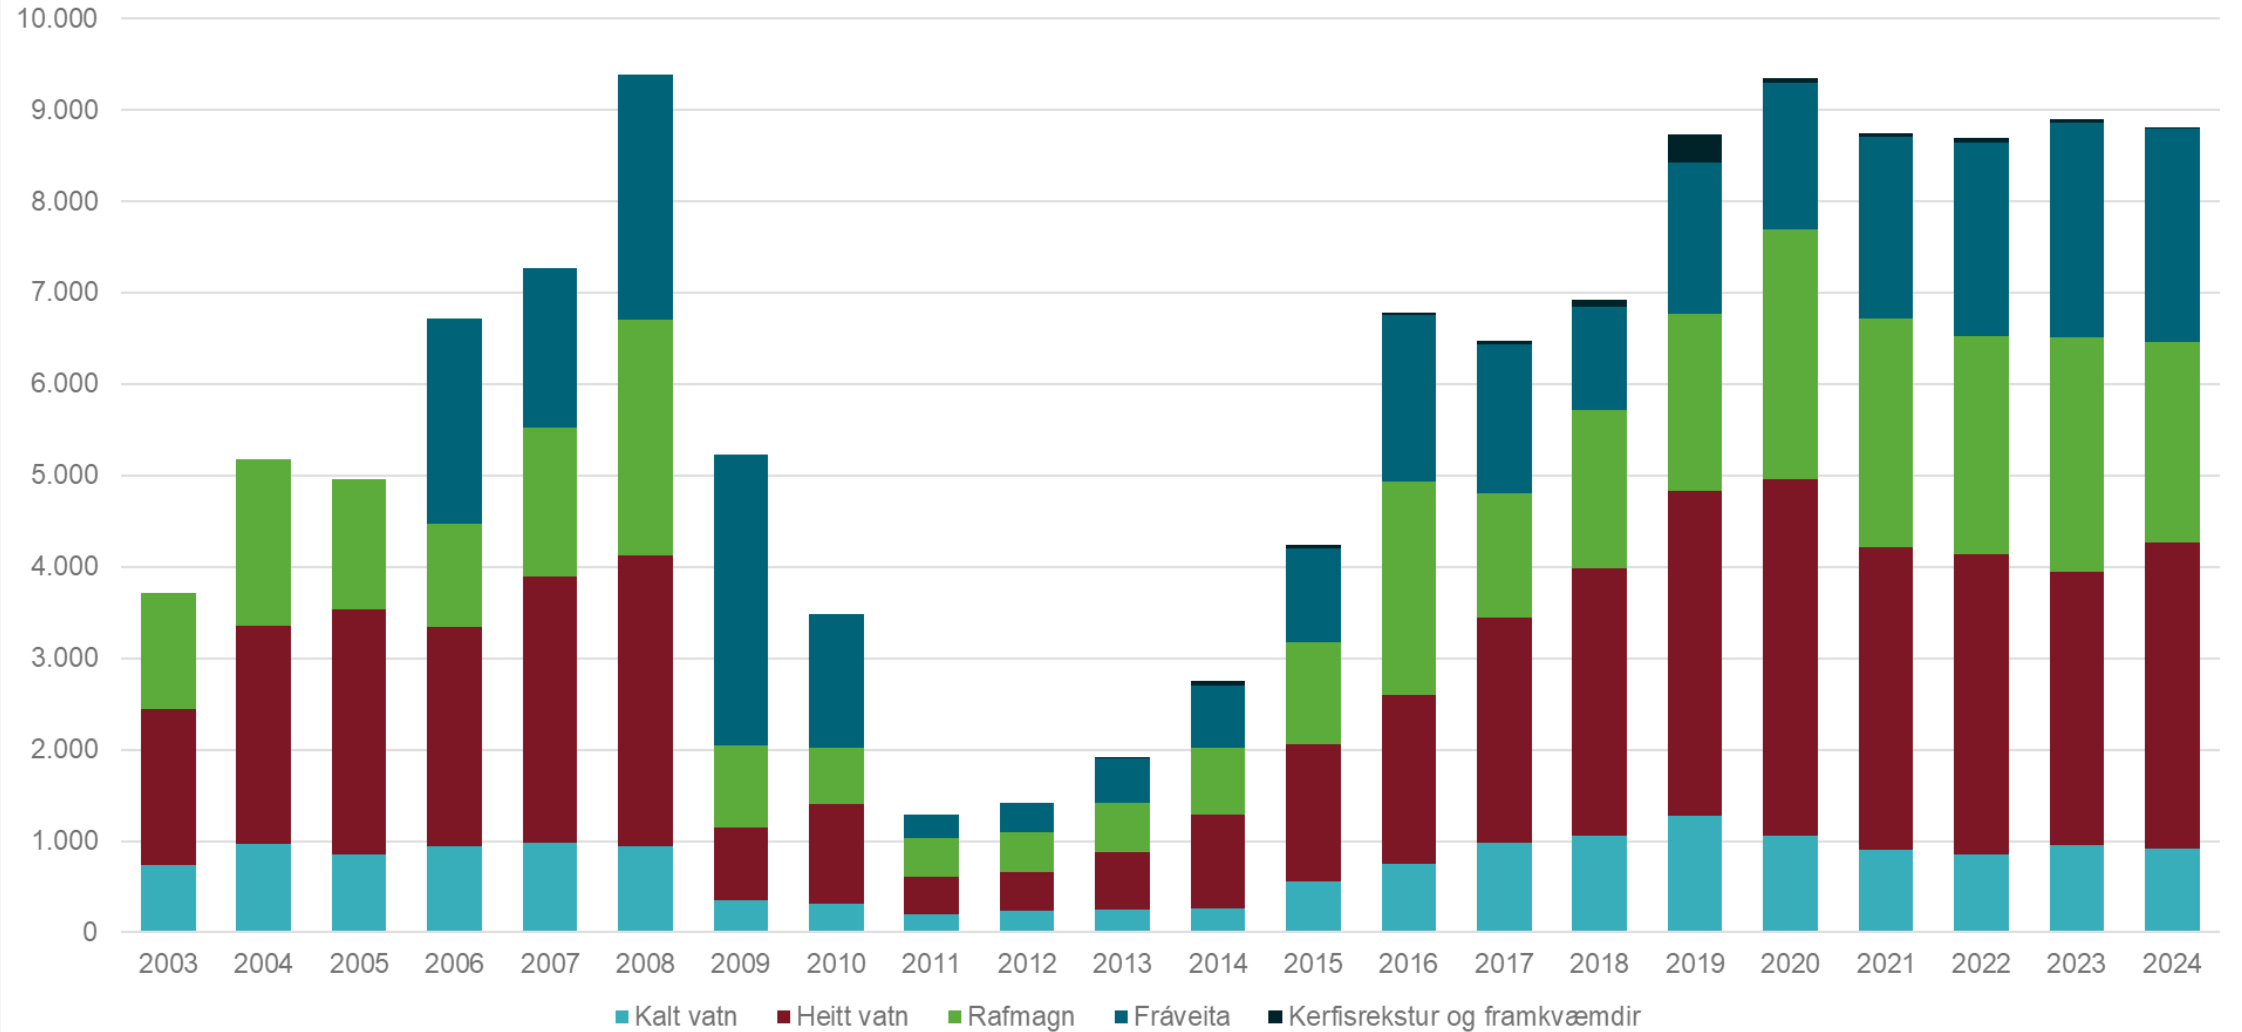

EBV-159-01



Fráveita

Helstu verkefni 2019

- Fjárfestingaáætlun 1.700 m.kr.
 - Uppfærsla á núverandi dælustöðvum
 - Fóðrun eldri lagna og tenginga
 - Naustavogur, ný skólpdælustöð
 - Settjarnir
- Helstu útboð ársins
 - Naustavogur, hönnun og framkvæmd
 - Tengingar, fóðrun og endurnýjun
 - Verkefni í lagnakerfi og dælustöðvum



Vatnsveita

Helstu verkefni 2019

- Fjárfestingaáætlun 1.300 m.kr.
 - Lýsingatæki í Gvendarbrunnum
 - Endurnýjunarverkefni í samstarfi við sveitarfélög
- Helstu útboðs ársins
 - Endurnýjun veitukerfa í Elliðaárdal
 - Endurnýjun á Álftanesi



Hitaveita

Helstu verkefni 2019

- Fjárfestingaráætlun 3.600 m.kr.
 - Endurnýjun stofnæða í HAB
 - Endurnýjun Reykjaæða við Elliðaár
 - Nýjar borholur á Geldingarnesi og í Rangárveitum
 - Ný dælustöð við Kaupún
 - Virkjun á borholum (Laugaland, Hveragerði, Öndverðarnes og Bakki í Ölfusi)
 - Árbær - nýr stofn frá Suðuræð og tengingar
 - Endurnýjunarverkefni í samstarfi við sveitarfélög
- Helstu útboð ársins
 - HAB: Endurnýjun stofnæða
 - Virkjun á borholum á Suðurlandi
 - Borútboð ásamt ON, boranir 2019-2024



Rafveita

Helstu verkefni 2019

- Fjárfestingaáætlun 1.900 Mkr
 - Aðveitustöð A1 (við Sundhöllina) 11 kV aflrofar
 - Endurnýjun og nýbygging dreifistöðva
 - Endurnýjun háspennustrengja milli aðveitustöðva Reykjanesbraut- A5 (Elliðaárdal)
 - Loftlínur í jörð (Úlfarsfellslína - Skálafellslína)
 - Lagning háspennu strengja (nýir og endurnýjun)
 - Endurnýjunarverkefni í samstarfi við sveitarfélög (Reykjavíkurborg – Kópavogur – Mosfellsbær – Garðabær – Seltjarnarnes)
- Helstu útboð ársins
 - Endurnýjun aflspenna
 - Skálafells – og Úlfarsfellslína í jörð
 - Lagning háspennu- og lágspennulagna.



VEITUR

HAGSÝNI FRAMSÝNI HEIÐARLEIKI



► Landsvirkjun

Gunnar Guðni Tómasson
framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs



Landsvirkjun

Landsvirkjun 2019

verkefnastaða og framkvæmdir

Kynning á útboðsþingi SI 24.01.2019

Gunnar Guðni Tómasson
framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs




Landsvirkjun

Efni kynningar

- Fjárfestingar síðustu ára
- Nýframkvæmdir
- Viðhalds- og endurbótaverkefni

Fjárfestingar á tímabilinu 1995-2019

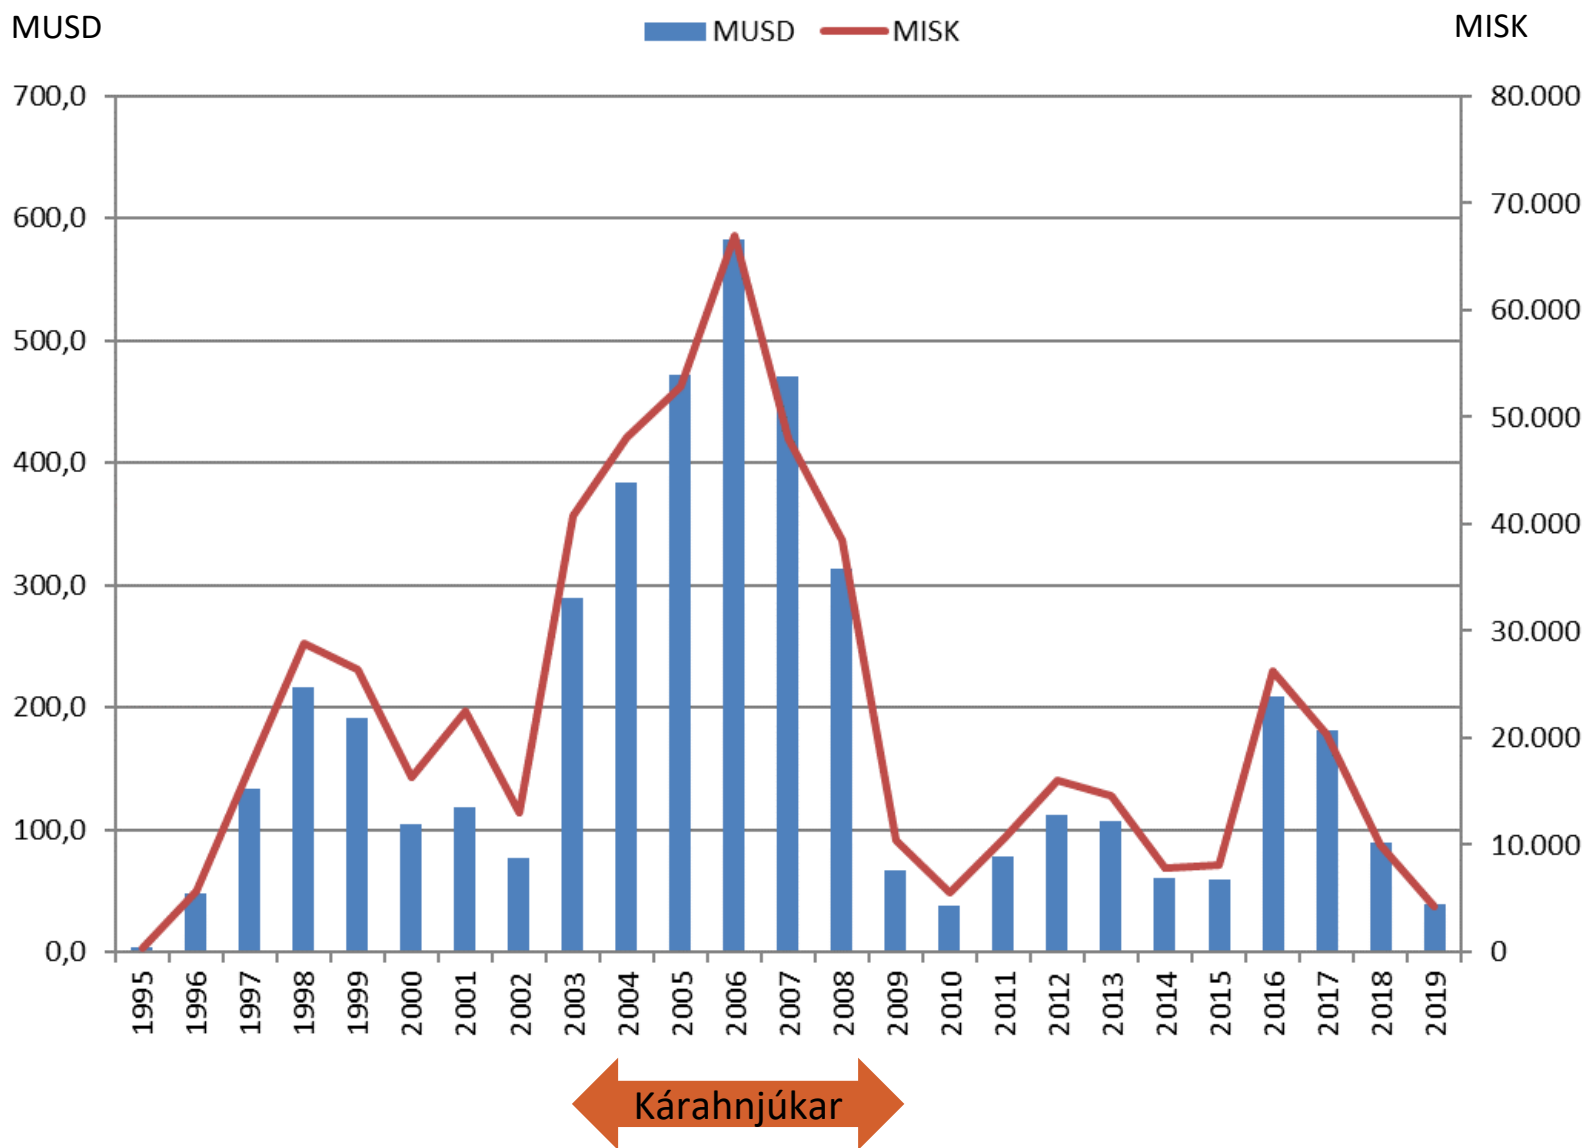


Beistareykjavirkjun 90 MW

Vél 1 var gangsett í
nóvember 2017 (45
MW)


Vél 2 var gangsett í
apríl 2018 (45 MW)

Unnið er að
lokafrágangi á
framkvæmdasvæðinu

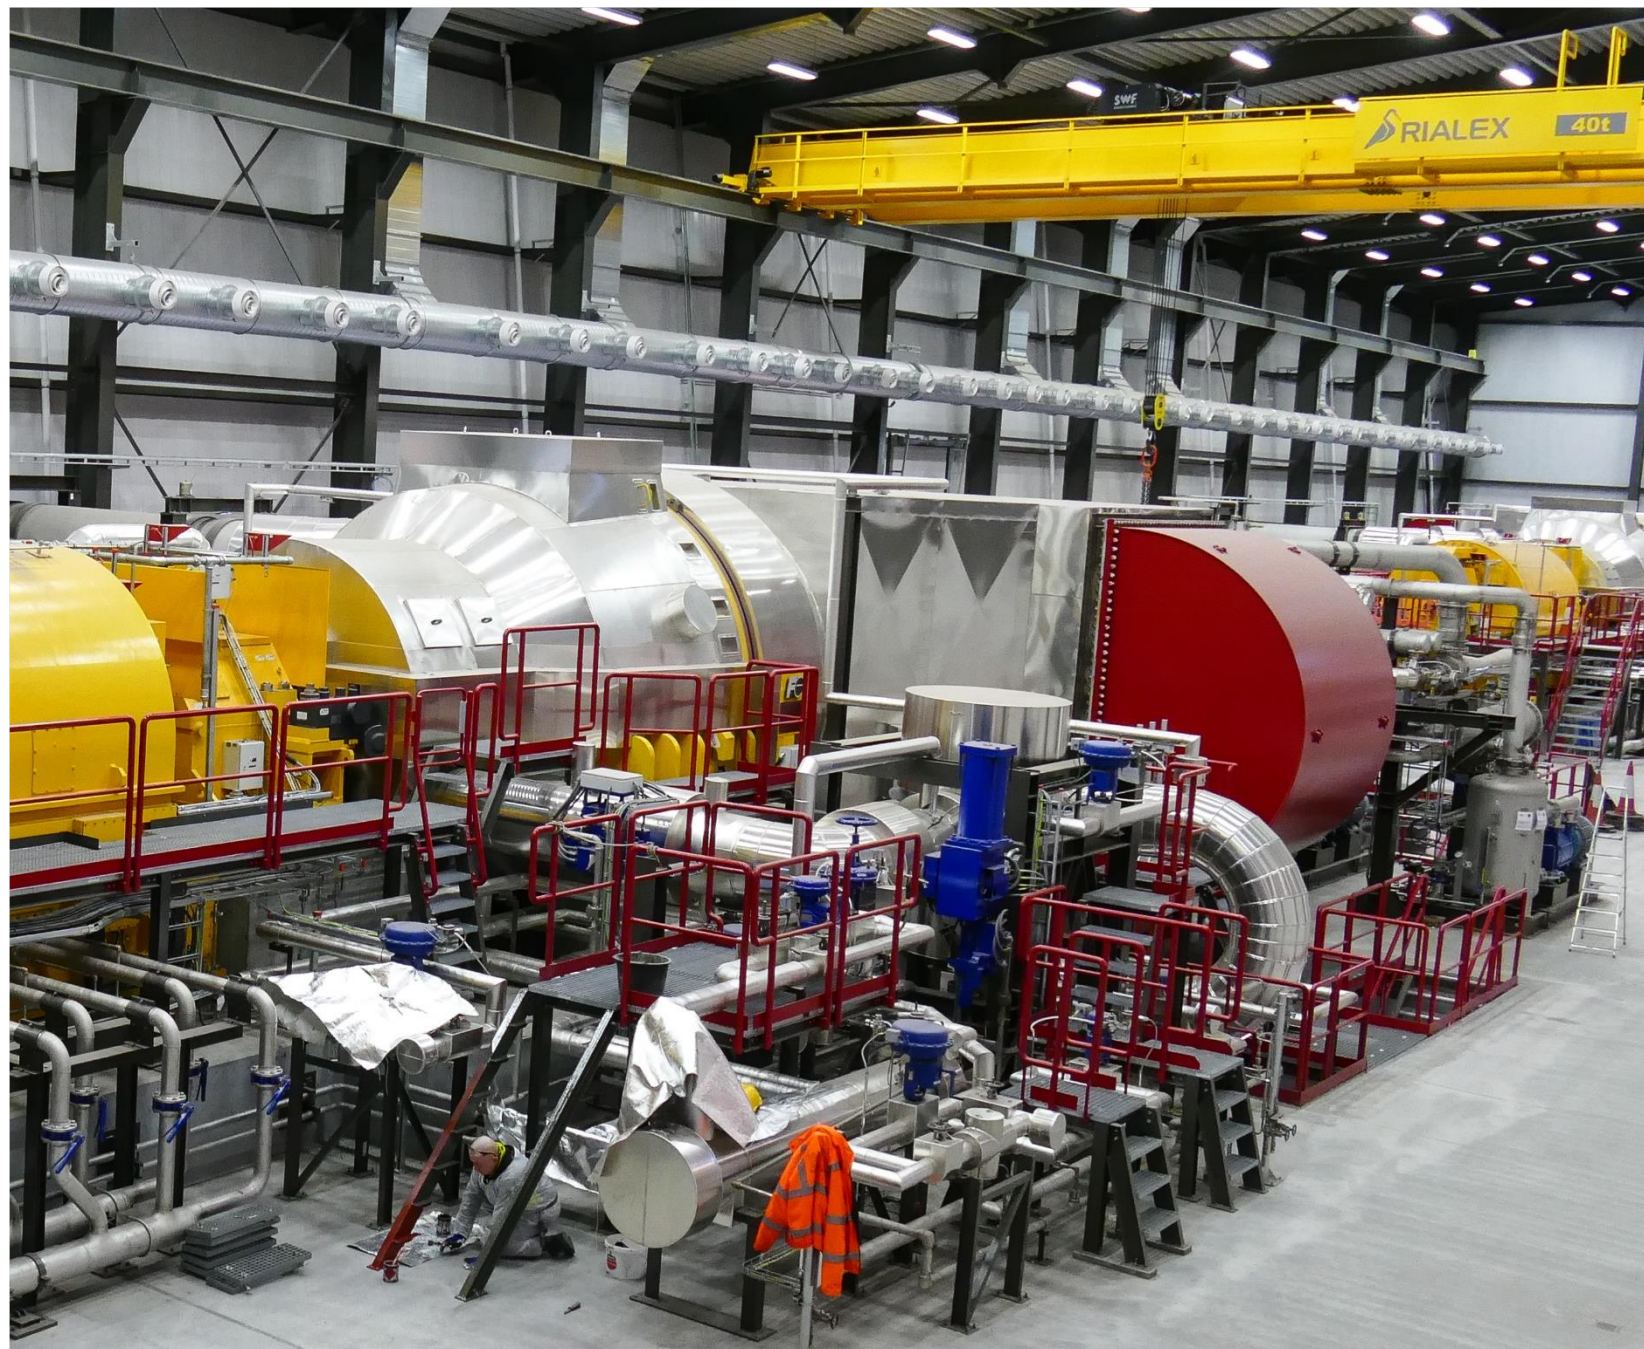

Peistareykjavegur syðri

- Vegtenging frá Peistareykjavirkjun að Þjóðvegi á Hólasandi
- Auðveldar samrekstur jarðvarmastöðva Landsvirkjunar á NA-landi
- Vegurinn verður byggður eftir Þjóðvegastaðli Vegagerðarinnar líkt og nyrðri vegurinn frá Húsavík að virkjuninni
- Bjóðum út í febrúar fyllingar og lagningu neðra burðarlags
 - 17,1 km langur kafli
 - 368.000 m³ af fyllingum
 - 29.700 m³ af neðra burðarlagi
 - Verktími 2019-2020
- Gerum ráð fyrir að bjóða út lagningu efra burðarlags og slitlags eftir u.þ.b. 2 ár með verktíma 2021

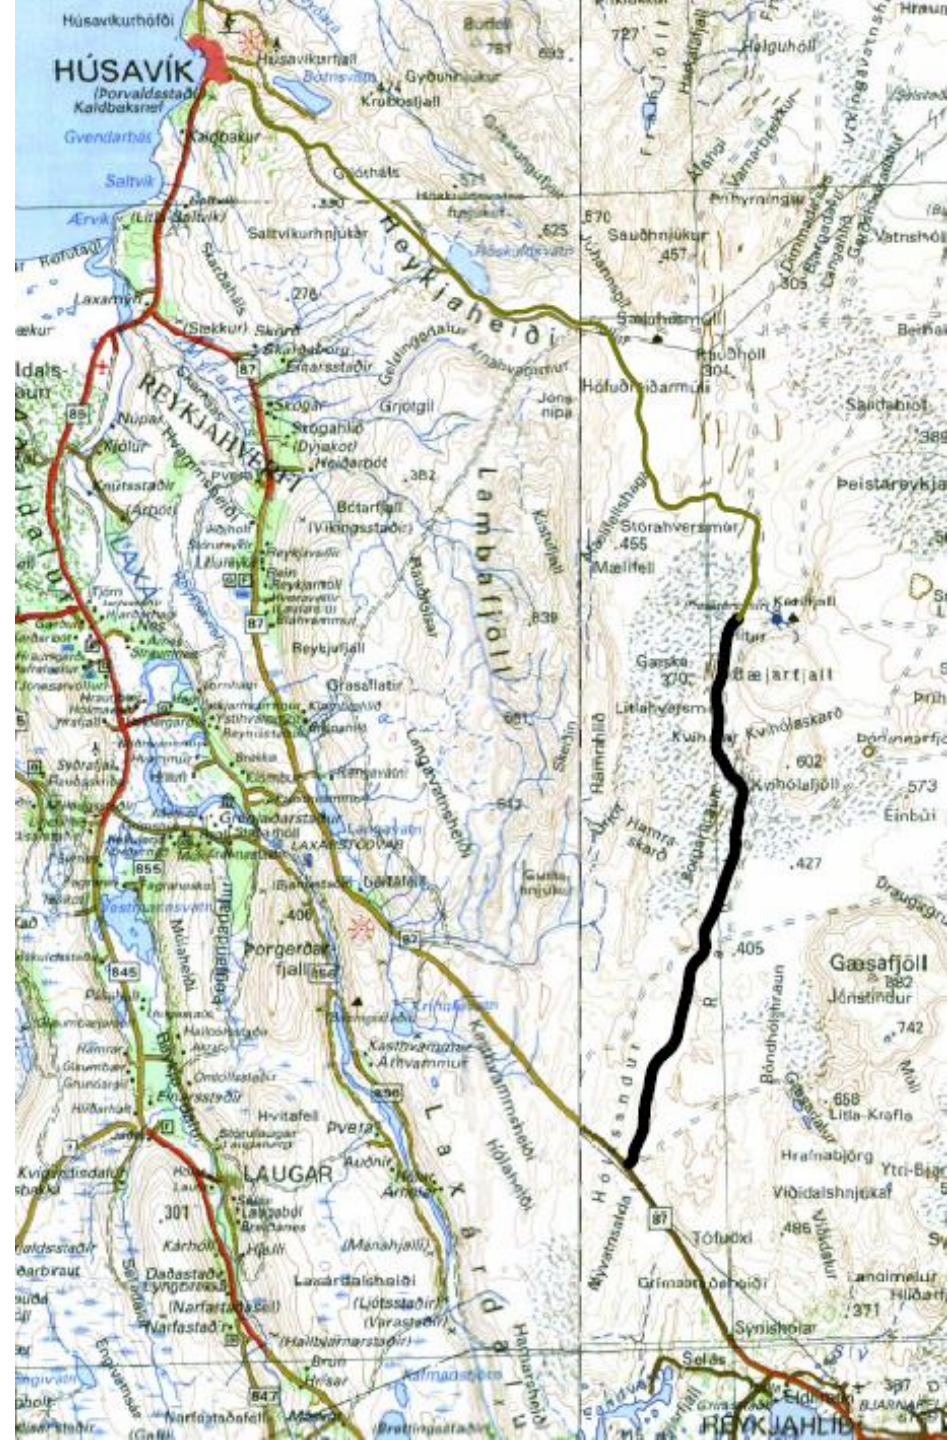



Landsvirkjun

Stækkun Búrfellsvirkjunar 100 MW


Virkjunin var gangsett í júní
2018

Á þessu ári verður unnið að
lokafrágangi á svæðinu



Viðgerðir á Sultartangaskurði

- Skemmdir á bökkum skurðarins á um 250 m kafla ofan við, undir og neðan núverandi brúar
- Gerðum við hluta skemmdanna á árunum 2015-2016 í kjölfar hruns á efni ofan í skurðinn
- Stallar grafnir á skurðbökkunum og unnið frá þeim við hreinsun skurðarins og styrkingu á bökkum hans
- Gerum núna við það sem eftir stendur
- Hluti af verkinu er bygging nýrrar brúar um 100 m ofan núverandi brúar og veltengingar að henni
- Þjóðum út í febrúar
 - 60.000 m³ sprengt
 - 65.000 m³ grafið í lausu
 - 35 m löng brú (stálbitar + steyppt brúargólf)
 - 700 m³ steypa
 - 1 km langar veltengingar
 - Verktími frá apríl/maí og fram á haust
- Verður unnið með Sultartangastöð í rekstri

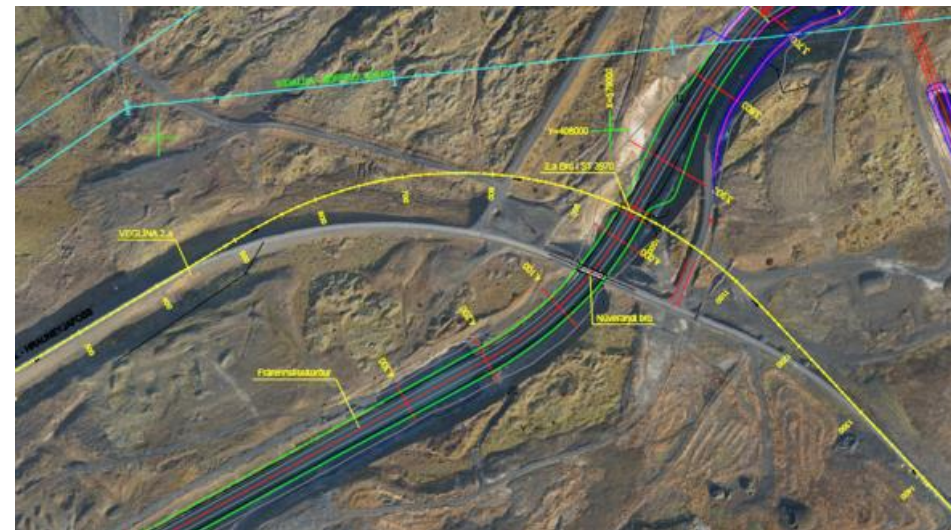

Önnur viðhalds- og endurbótaverkefni

Svæði	Fjöldi verkefna	Áætlaður kostnaður
Þjórsársvæði	22	1.267 Mkr
Sogssvæði	7	58 Mkr
Blöndusvæði	6	35 Mkr
Mývatnssvæði	10	114 Mkr
Fljótsdalssvæði	9	132 Mkr
Sameiginlegt	1	80 Mkr
Samtals	55	1.686 Mkr

- Stærstu verkefni eru endurbætur á tveimur vélasamstæðum í Búrfellsstöð I
- Þessi verkefni hafa verið í undirbúningi frá síðasta ári og samningar við alla helstu verktaka liggja fyrir
- Af öðrum verkefnum var tæpur helmingur þeirra settur í gang á árunum 2017 og 2018



Landsvirkjun

Vinnubúðir

Höfum sett í sölu talsvert af
vinnubúðaeiningum


Íbúðir og skrifstofuhús á
Peistareykjum

Íbúðir í Bjarnarflagi

Skrifstofuhús í Búðarhálsi

Svefnálma í Búrfelli

Einingar í góðu ásigkomulagi
sem hafa reynst vel við okkar
aðstæður

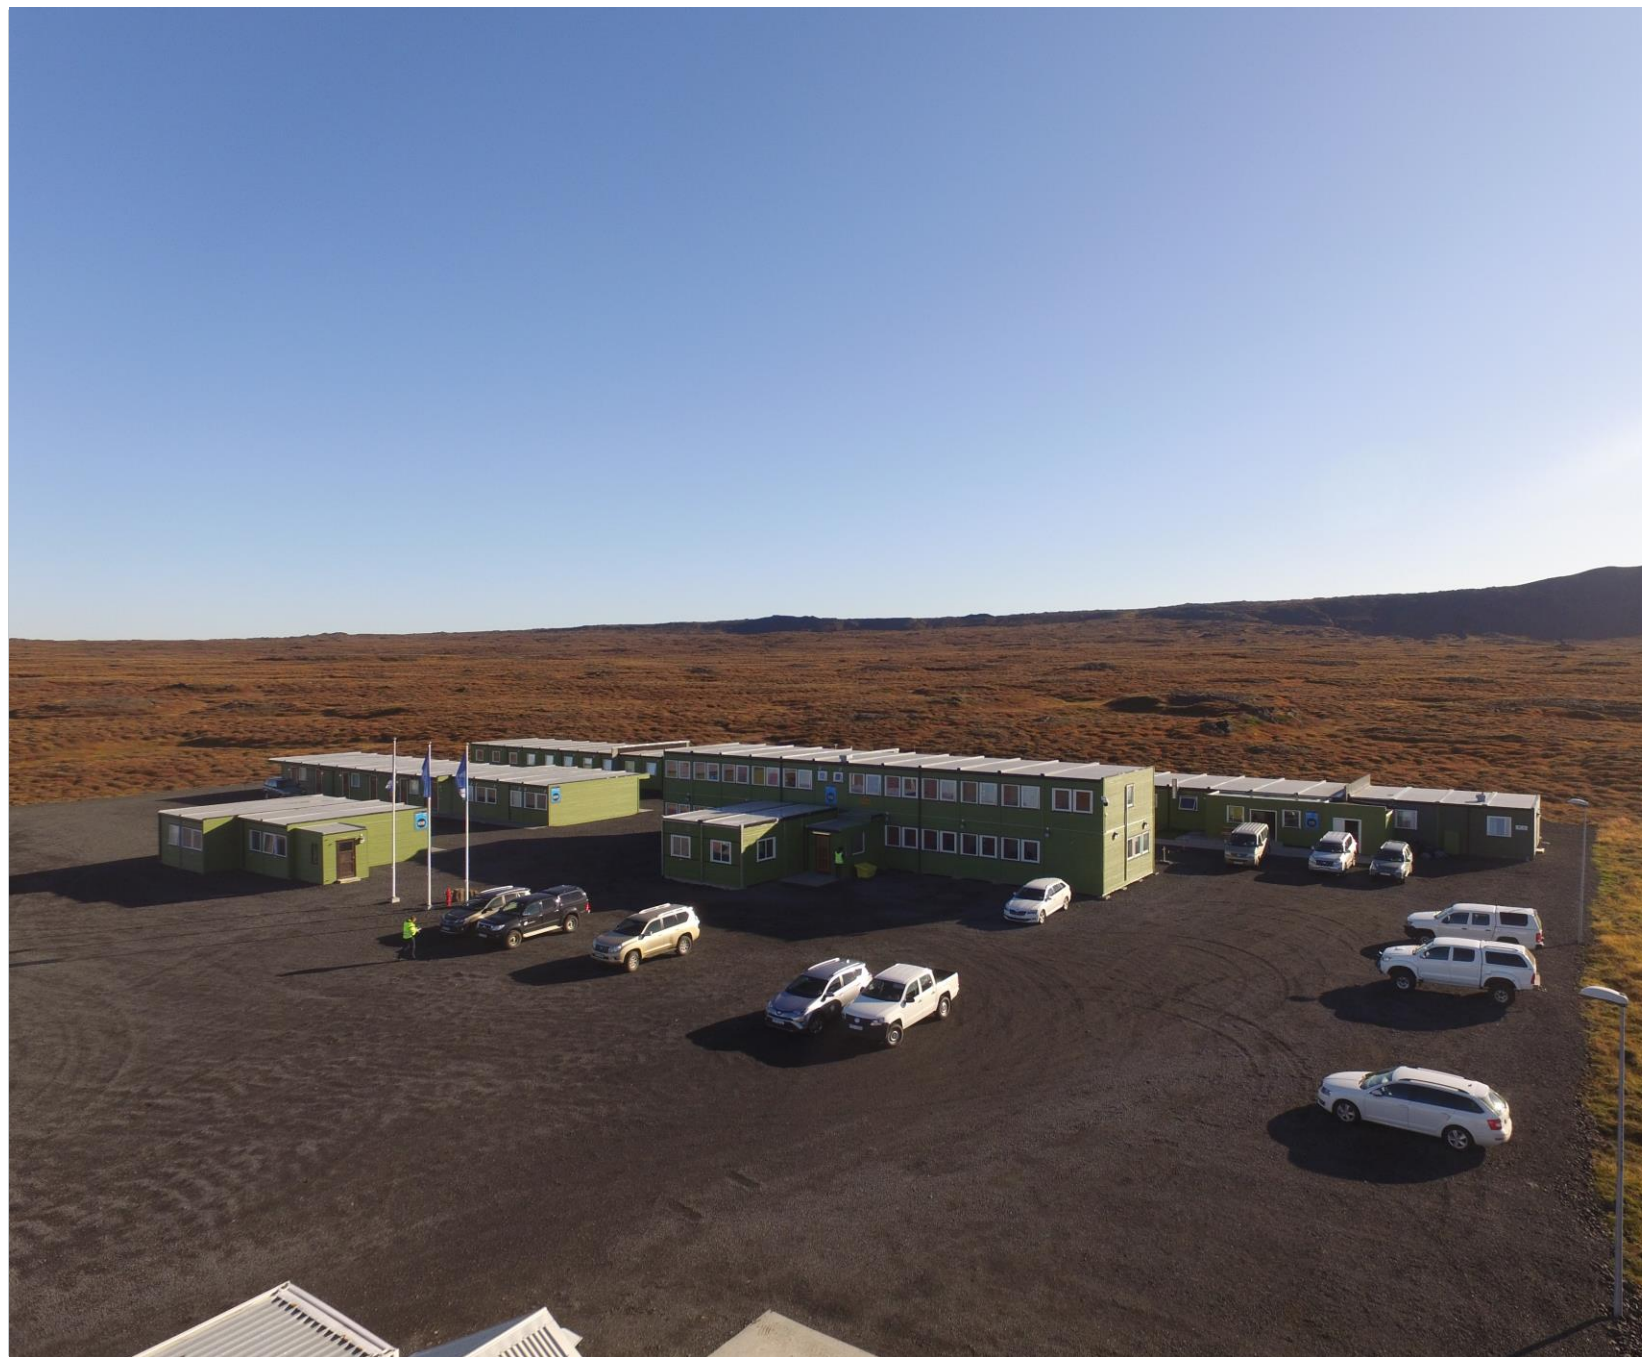



Landsvirkni

Takk fyrir

Kynning á útboðsþingi SI 24.01.2019

Gunnar Guðni Tómasson

framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs





► Landsnet

Unnur Helga Kristjánsdóttir
yfirmaður verkefnastjórnunar framkvæmda

LANDSNET

Framkvæmdir 2019


Unnur Helga Kristjánsdóttir
Yfirmaður verkefnastjórnunar framkvæmda

Útboðsþing SI
24. janúar 2019




Framkvæmdir Landsnets

Helstu verkefni í framkvæmd og undirbúningi

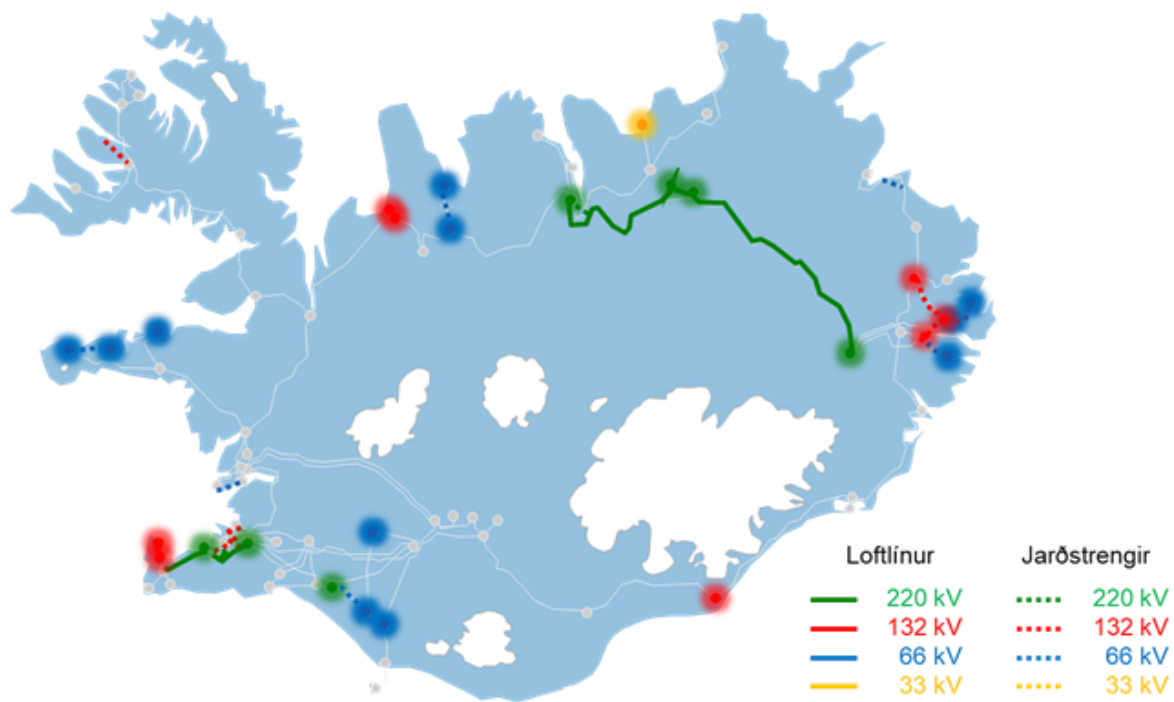

Fjárfestingar í flutningskerfinu

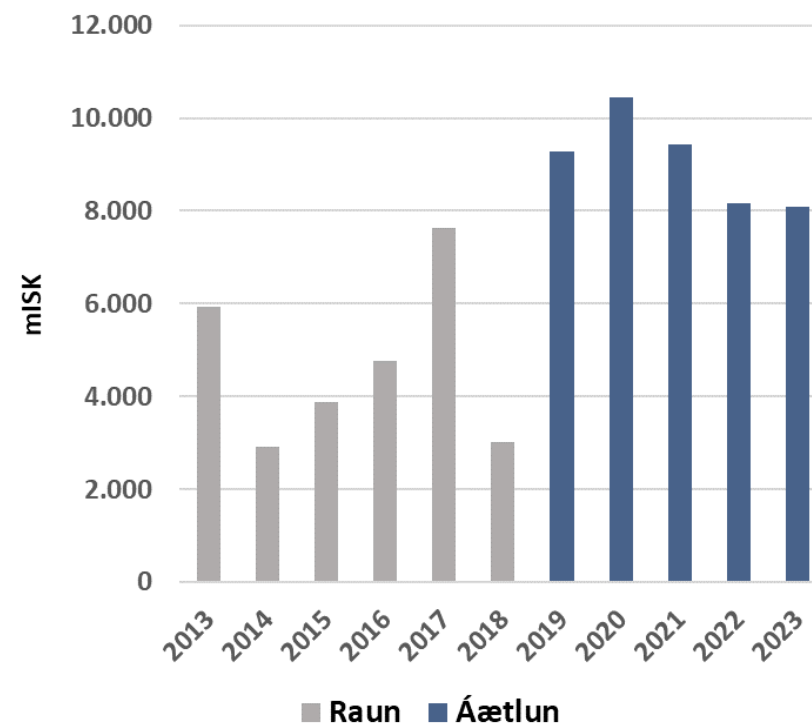

Helstu verksamningar



Jarðstrengir
Jarðvinna og lagning



Loftlínur
Vegslóð, jarðvinna og undirstöður



Tengivirki
Byggingarvirki



Tengivirki
Rafbúnaður og uppsetning

Krafla – Fljótsdalur (Kröflulína 3)


Ný 121 km löng loftlína (220 kV) frá Kröflu að Fljótsdal.

Helstu útböð og útböðstími:

- KR3-01/02/03: Vegslóð, jarðvinna og undirstöður – auglýst í janúar 2019
- KR3-21: Stálsmiði vegna undirstaða – opnað 25. janúar 2019
- KR3-23 (I,II,II): Framleiðsla undirstaða – opnað 6. febrúar 2019
- KR3-25: Flutningur og uppsetning vinnubúða – auglýst í febrúar 2019

Framkvæmdatími: 2019-2020

Heildarfjárfestingarkostnaður: 7,4 milljarðar

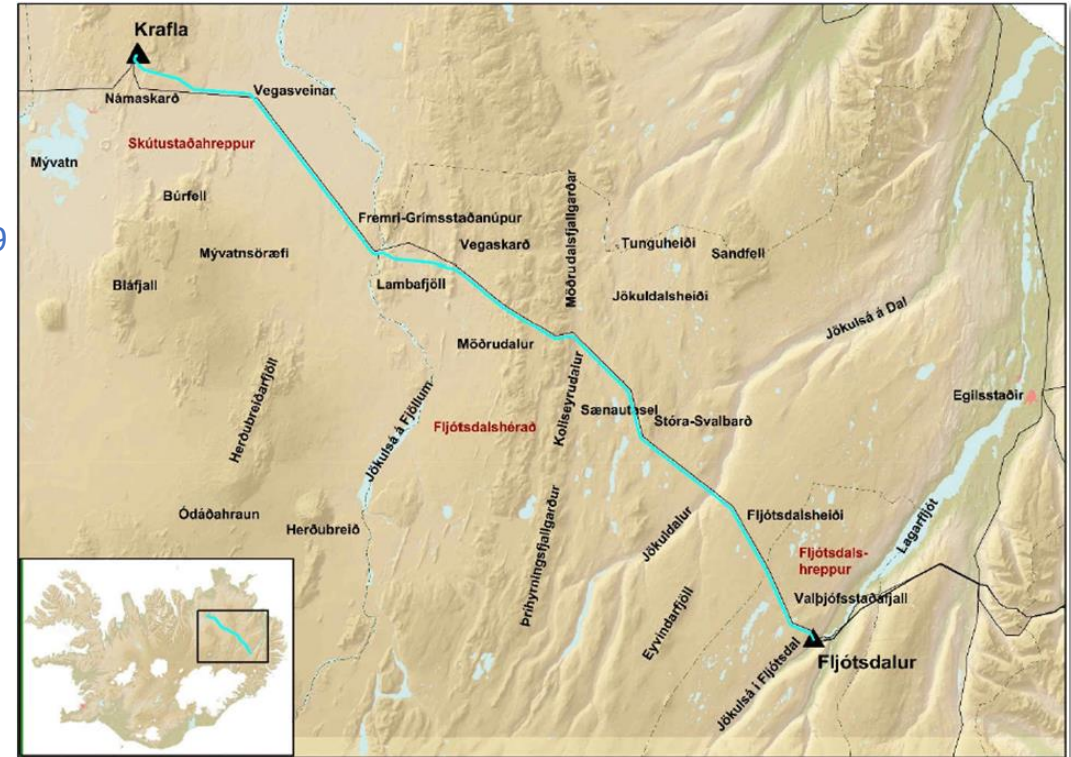

Austurland – spennuhækkun og ný tenging til Norðfjarðar

Helstu framkvæmdir:


- Ný yfirbyggð tengivirki á Eskifirði og Eyvindará (132 kV)
- Viðbyggingar við eldri tengivirki á Eskifirði og Neskaupstað (66 kV)
- Nýr 2 km jarðstrengur, Eskifjarðarlína 1 (132 kV)
- Nýr 17 km jarðstrengur, Neskaupstaðarlína 2 (66 kV)

Helstu útboð og útboðstími:

- AUST-01 (A,B): Bygging tengivirkishúsa (mars 2019)
- AUST-03 (A,B): Bygging tengivirkishúsa (mars 2019)
- AUST-30/31: Rafbúnaður og uppsetning (apríl 2019)
- AUST-02 (A,B): Jarðvinna og lagning (mars 2019)

Áætlaður framkvæmdatími: 2019-2020

Áætlaður fjárfestingarkostnaður: 2,3 milljarður

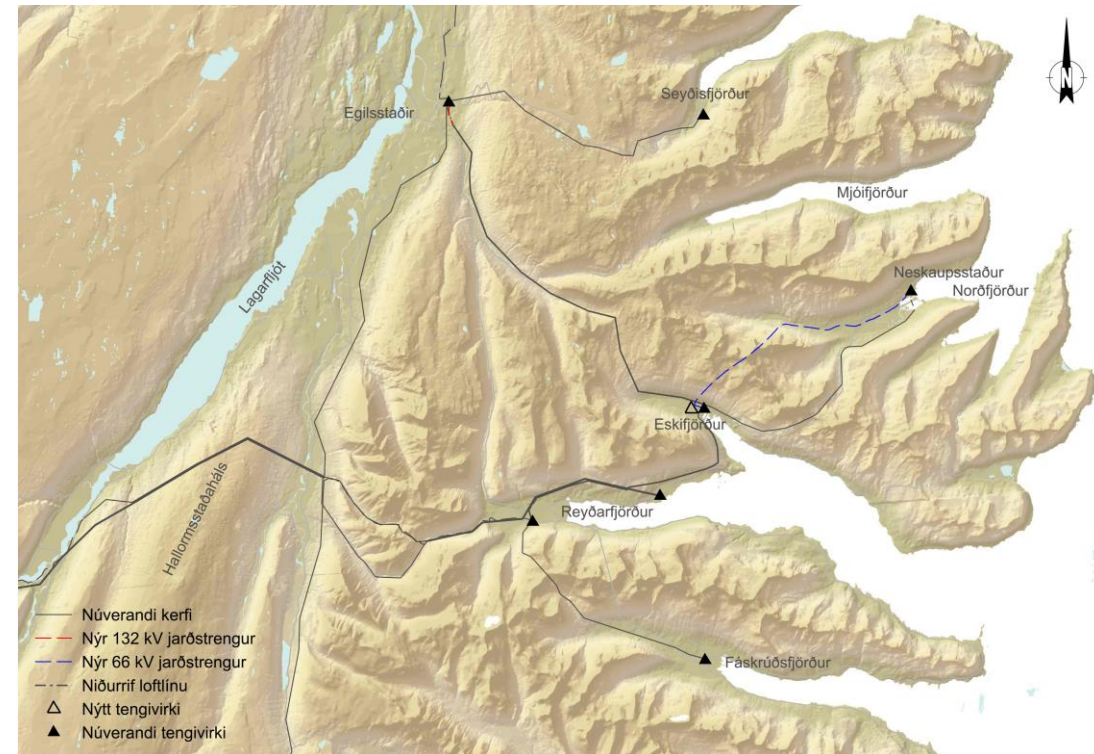

Færsla Hamraneslína 1&2 í Hafnarfirði

Bygging loftlínu á um 2 km leið við Skarðshlíð í Hafnarfirði.

Helstu útboð og útboðstími:

- [HN1&2: Vegslóð, jarðvinna og undirstöður](#) (febrúar 2019)

Áætlaður framkvæmdatími: Maí - júní 2019

Áætlaður fjárfestingarkostnaður: 330 m.kr



Færsla Hafnarfjarðarlínu 2 og Nesjavallalínu 1

Lagning nýs jarðstrengs:

- 1 km kafli meðfram Reykjanesbraut/Ásvallabraut í Hafnarfirði
- 2 km kafli meðfram Vesturlandsvegi í Mosfellsbæ

Helstu útboð og útboðstími:

- HF1-01: Jarðvinna og lagning (janúar 2019)
- NE1-01: Jarðvinna og lagning (febrúar 2019)

Áætlaður framkvæmdatími: Vorið 2019

Áætlaður fjárfestingarkostnaður: 150 m.kr



Sauðárkrókur - Varmahlíð

Helstu framkvæmdir:


- Nýr 24 km langur jarðstrengur, Sauðárkrókslína 2 (66 kV)
- Nýtt yfirbyggt tengivirki á Sauðárkróki (66 kV, 160 m²)
- Nýtt yfirbyggt tengivirki í Varmahlíð (66 kV, 135 m²)

Helstu útboð og útboðstími:

- SA2-01: Jarðvinna og lagning strengs (sumar 2019)
- SVAR-01: Bygging tengivirkishúsa (sumar 2019)
- SVAR-30: Rafbúnaður og uppsetning (sumar 2019)

Áætlaður framkvæmdatími: 2019-2020

Áætlaður fjárfestingarkostnaður: 2 milljarðar

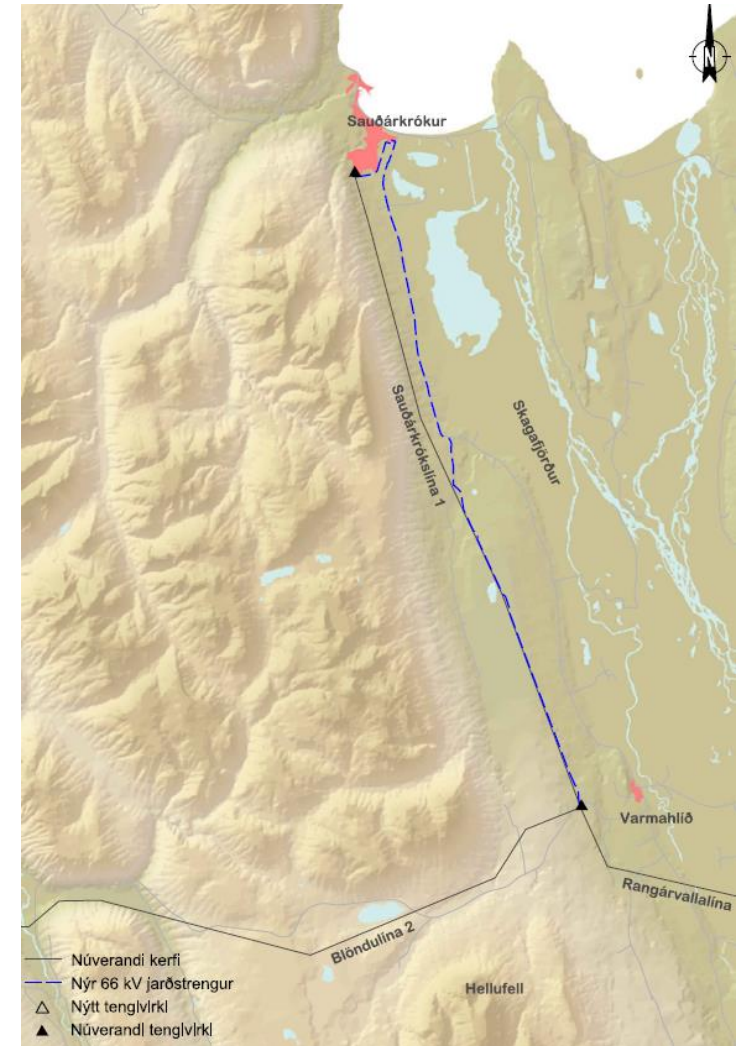

Lagning jarðstrengs við Akranes


Loftlína næst Akranesi lögð í jarðstreng á um 3 km kafla

Helstu útboð og útboðstími:

- Jarðvinna og lagning strengs (sumarið 2019)

Áætlaður framkvæmdatími: Haustið 2019

Áætlaður fjárfestingarkostnaður: 150 m.kr.

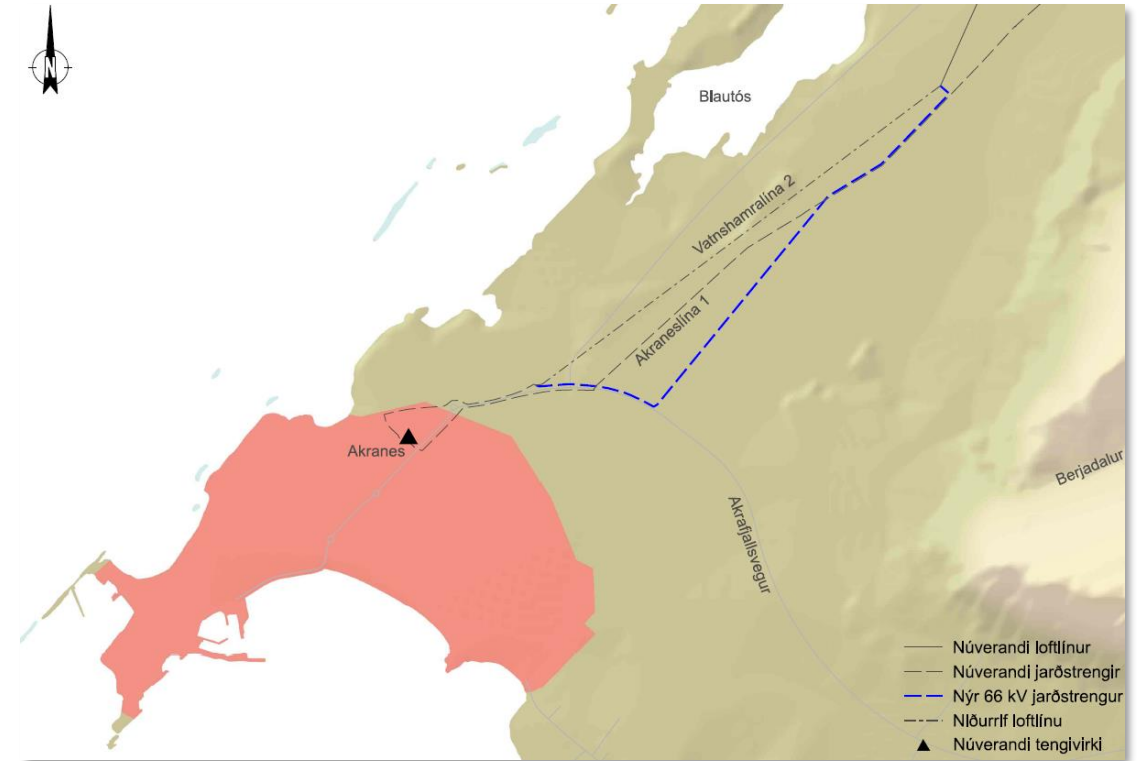

Tengivirki Lækjartúni og Lækjartúnslína 2

Helstu framkvæmdir


- Nýtt yfirbyggt tengivirki við Lækjartún
- Nýr 16 km jarðstrengur, Lækjartúnslína 1

Helstu útboð og útboðstími:

- Bygging tengivirkishúsa (haustið 2019)
- Rafbúnaður og uppsetning (haustið 2019)
- Jarðvinna og lagning strengs (haustið 2019)


Áætlaður framkvæmdatími: 2020-2022

Áætlaður fjárfestingarkostnaður: um 2 milljarðar

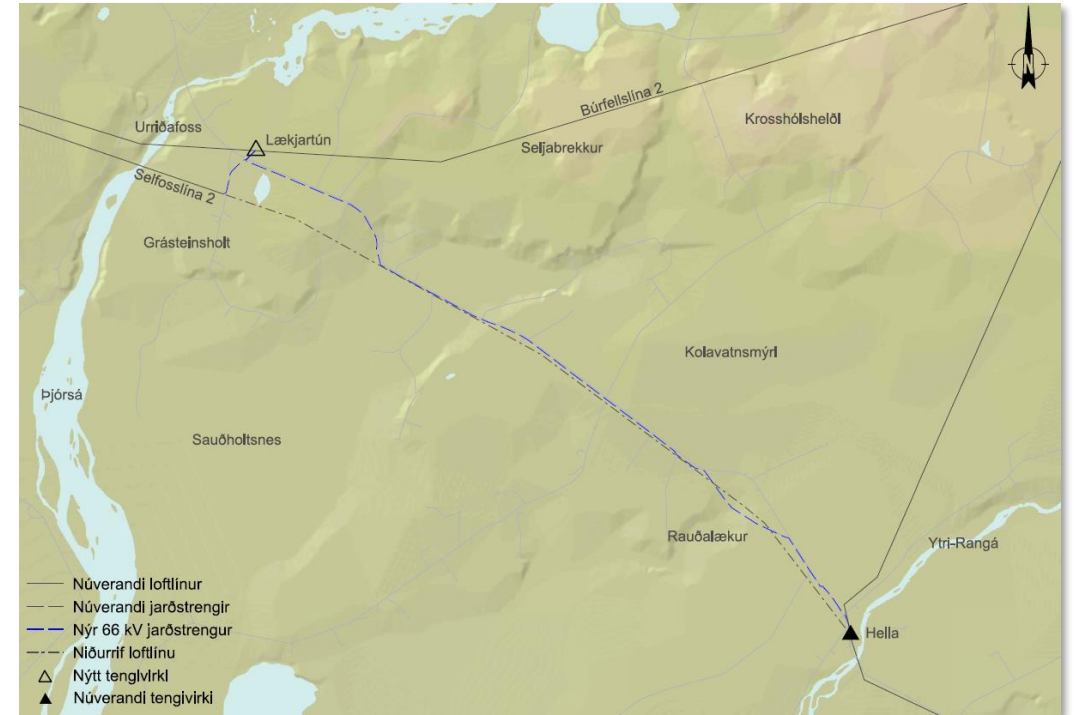


Verkefni í undirbúningi

Hólasandslína 3

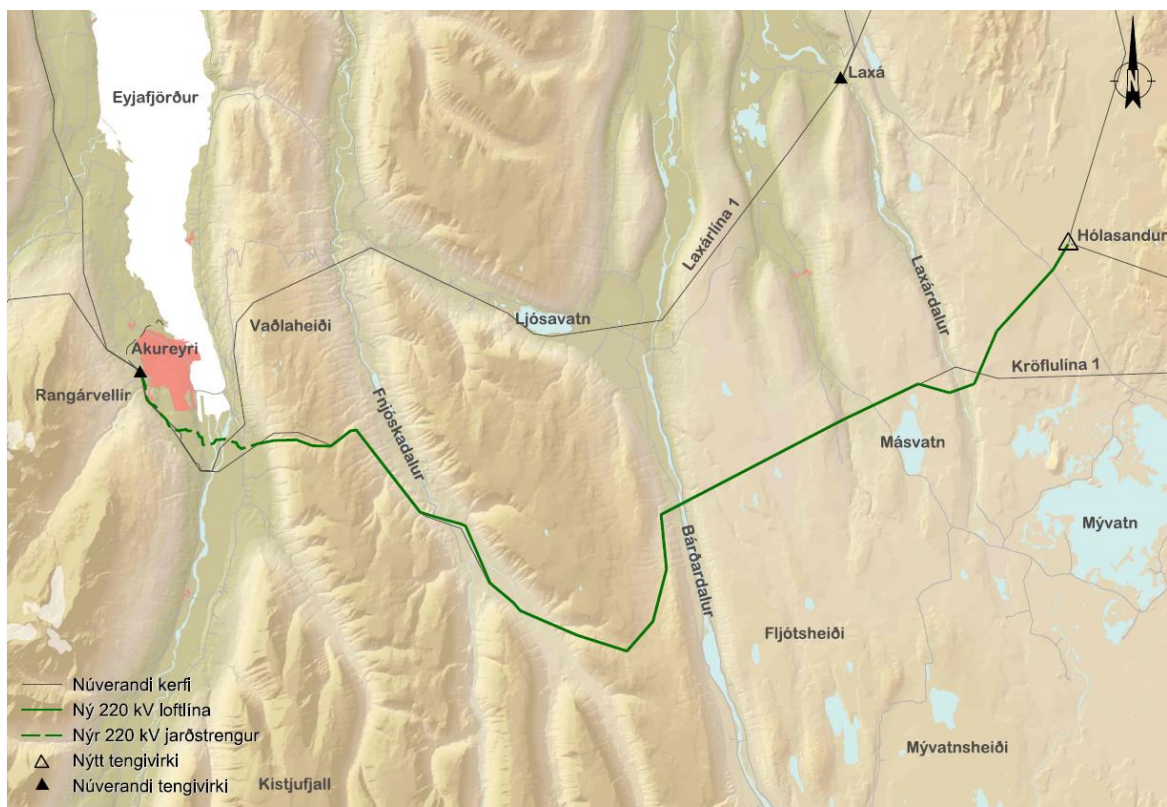

Suðurnesjalína 2

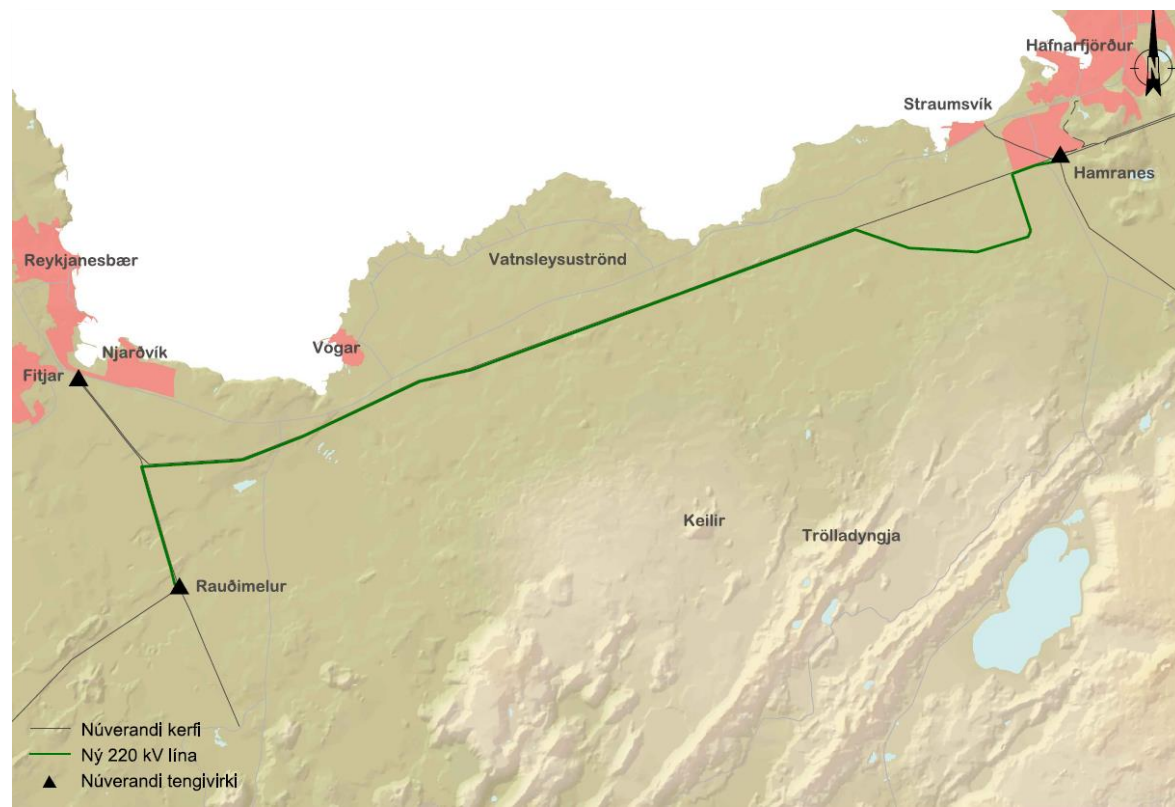

Útboðskerfi Landsnets

Útboðsgögn og skil á tilboðum í In-tend útboðskerfinu

The screenshot shows the Landsnet website interface. At the top, the 'LANDSNET' logo is displayed. Below it is a navigation menu with 'Home', 'Supplier Guidance', 'Tenders', 'Register', and 'Help'. On the left side, there is a login form with fields for 'e-Mail Address' and 'Password', and buttons for 'Login', 'Forgotten Details', and 'Register'. Below the login form is an 'in-community' banner for 'in-supply' with the text 'THE STRENGTH OF EFFECTIVE COMMUNICATION'. A note at the bottom states: 'NOTE: Please be aware that failure to provide correct login information three times will result in your account being locked'. On the right side, a red banner contains the text: 'AS ONE OF OUR SUPPLIERS, WE NEED TO MAKE SURE YOU RECEIVE OUR EMAIL NOTIFICATIONS. TO ENSURE OUR EMAILS REACH YOUR INBOX PLEASE ADD OUR EMAIL DOMAIN @IN-TENDORGANISER.CO.UK TO YOUR SAFE SENDERS AND CHECK YOUR SPAM FILTER SETTINGS. THANK YOU'. Below this is a section titled 'Welcome to the Landsnet electronic tendering process' with a list of features and a 'How do I get started?' section.

LANDSNET

Home Supplier Guidance Tenders Register Help

e-Mail Address :
Password :

Login

Forgotten Details

Register

in-community

NOTE: Please be aware that failure to provide correct login information **three** times will result in your account being locked

AS ONE OF OUR SUPPLIERS, WE NEED TO MAKE SURE YOU RECEIVE OUR EMAIL NOTIFICATIONS. TO ENSURE OUR EMAILS REACH YOUR INBOX PLEASE ADD OUR EMAIL DOMAIN @IN-TENDORGANISER.CO.UK TO YOUR SAFE SENDERS AND CHECK YOUR SPAM FILTER SETTINGS. THANK YOU

Welcome to the Landsnet electronic tendering process

From this web site you can

- View a list of tenders/contracts/quotations.
- View information on contracts that have already been awarded.
- Express interest in a particular tender or quotation.
- Receive tender and/or quotation documentation.
- Safely return your tender or quotation documents.
- Send and receive correspondence.

How do I get started?

- To browse the list of tenders and quotations select the **Tenders** option. If you are interested in any of those listed, click the **View Details** button for further information and to express your interest.
- To gain full access to this web site you must register your **company / organisation** using the **Register** option.
- When your registration has been accepted, you will receive an email containing your Login Information.
- Once you have received your Login Information, or if you are already a registered user, select the **Login** option.

For more information on using the web site select the **Help** option.

Hæfismatskerfi fyrir lokuð útboð

The screenshot shows the Achilles website interface. At the top, the 'Achilles' logo is displayed. Below it is a navigation menu with 'Help and Support', 'About Us', 'English', 'Search', and 'Members' Login'. On the left side, there is a navigation menu with 'Buyers', 'Suppliers', 'Insights', 'Events', 'Training', and a 'Join a community' button. The main content area features a large heading 'Utilities NCE' and three buttons: 'Join this community', 'Supplier Log In', and 'Buyer Log In'. Below this is a section titled 'Explore our Help & Support PDFs' with a plus sign. At the bottom, there is a table with information about the Utilities NCE community.

Achilles

Help and Support About Us English Search Members' Login

Buyers Suppliers Insights Events Training Join a community

Utilities NCE

Join this community Supplier Log In Buyer Log In


Explore our Help & Support PDFs

The global utilities market is fast moving, subject to ever more stringent regulation and new technologies. Combining qualification systems from Connexio and Sellihca, this continually developing community gives members the information they need to do business with less risk, in less time – whilst meeting EU regulations.

INDUSTRY Utilities	BUYERS 70
REGION Central Europe, Northern Europe	QUALIFIED SUPPLIERS 5,000

LANDSNET

Áætluð útboð 2019

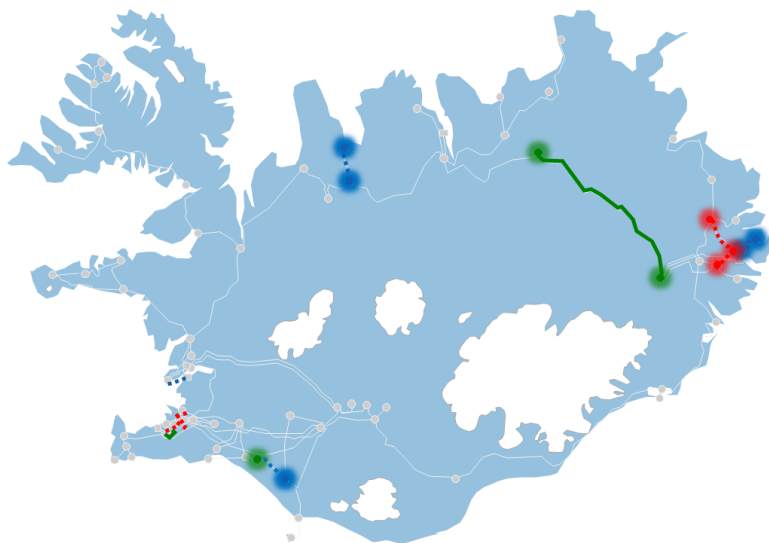

Framkvæmdasvæði	Útboð	2019			
		1	2	3	4
Krafla - Fljótsdalur	KR3-01: Vegslóð, jarðvinna og undirstöður	■			
	KR3-02: Vegslóð, jarðvinna og undirstöður	■			
	KR3-03: Vegslóð, jarðvinna og undirstöður	■			
	KR3-21: Stálsmíði vegna undirstaða	■			
	KR3-23 (I,II,II): Framleiðsla undirstaða	■			
	KR3-25: Flutningur og uppsetning vinnubúða	■			
Höfuðborgar- svæðið	HN1&2: Vegslóð, jarðvinna og undirstöður	■			
	HF1-01: Jarðvinna og lagning	■			
	NE1-01: Jarðvinna og lagning	■			
Austurland	AUST-01 (A,B): Bygging tengivirkishúsa	■			
	AUST-03 (A,B): Bygging tengivirkishúsa	■			
	AUST-30/31: Rafbúnaður og uppsetning		■		
	AUST-02 (A,B): Jarðvinna og lagning	■			
Sauðárkrókur - Varmahlíð	SA2-01: Jarðvinna og lagning strengs			■	
	SVAR-01: Bygging tengivirkishúsa			■	
	SVAR-30: Rafbúnaður og uppsetning			■	
Akranes	Jarðvinna og lagning strengs			■	
Lækjartún	Bygging tengivirkishúsa			■	
	Rafbúnaður og uppsetning			■	
	Jarðvinna og lagning strengs			■	

LANDSNET

Fylgstu með okkur á
appinu, twitter og facebook





▶ Orka náttúrunnar

Marta Rós Karlsdóttir
forstöðumaður tækniþróunar

Orka náttúrunnar Útboðsþing 2019

Marta Rós Karlsdóttir
Forstöðumaður Tækniþróunar



Orka náttúrunnar

framleiðir og selur rafmagn
til allra landsmanna
og sér íbúum
höfuðborgarsvæðisins
fyrir heitu vatni

ON á og rekur þrjár virkjanir

Tvær jarðvarmavirkjanir

Hellisheiðarvirkjun

303 MW í rafmagni og
133 MW af heitu vatni


Nesjavallavirkjun

120 MW í rafmagni og
300 MW af heitu vatni

Ein vatnsaflsvirkjun

Andakílsársvirkjun

Heildarframleiðsla er 8 MW

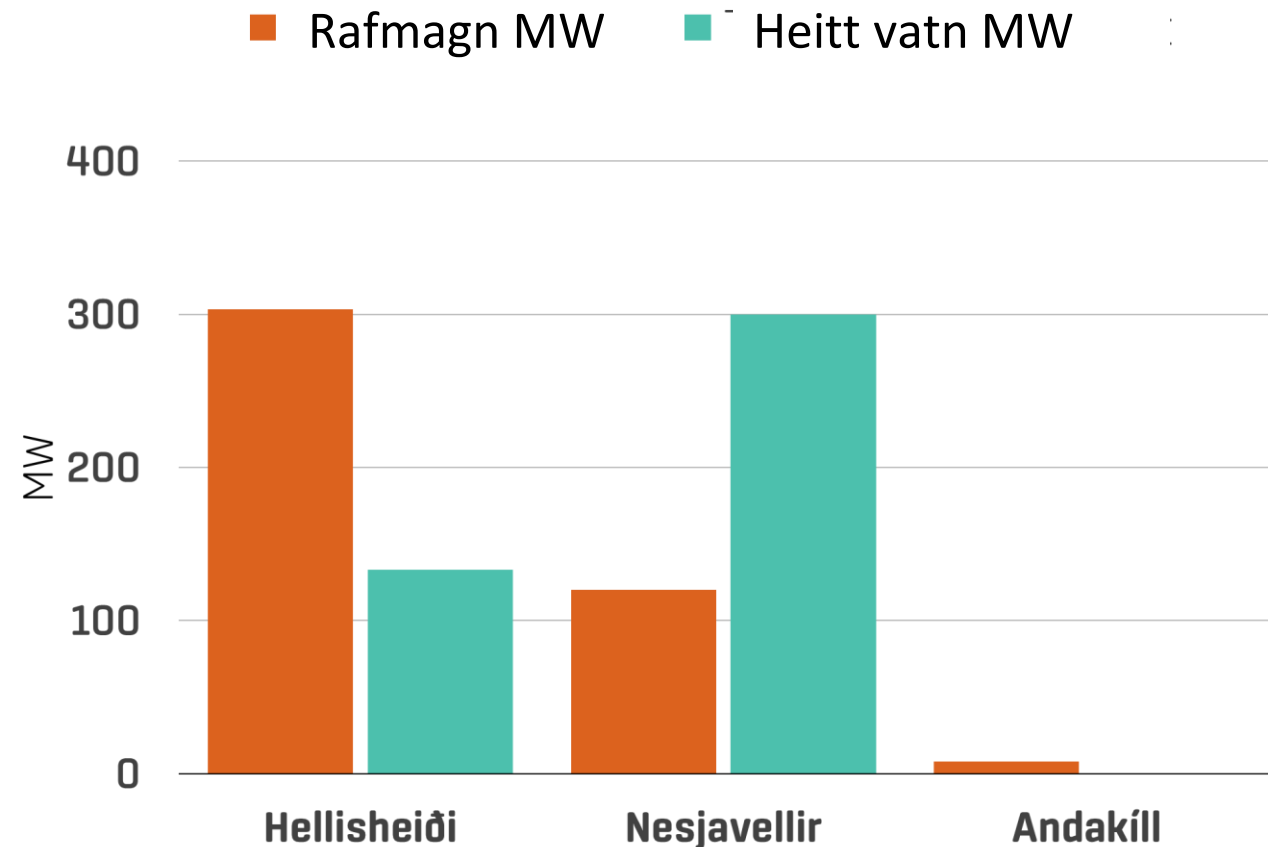


Forgangsröðun í verkefnum ON

1. Öryggis- og umhverfismál


2. Framvinda verkefnis



Öryggismál - kröfur

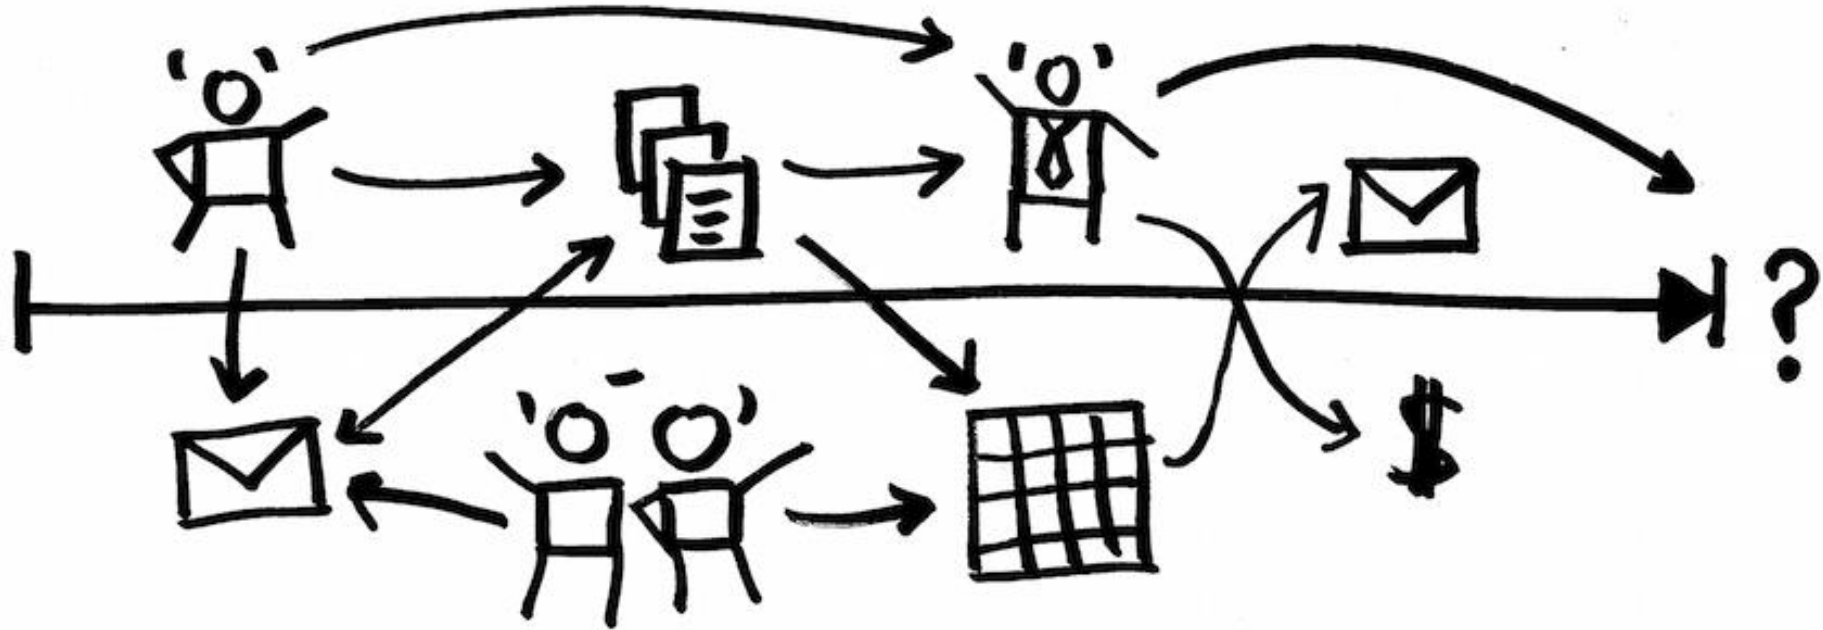

Öryggismál - framkvæmd

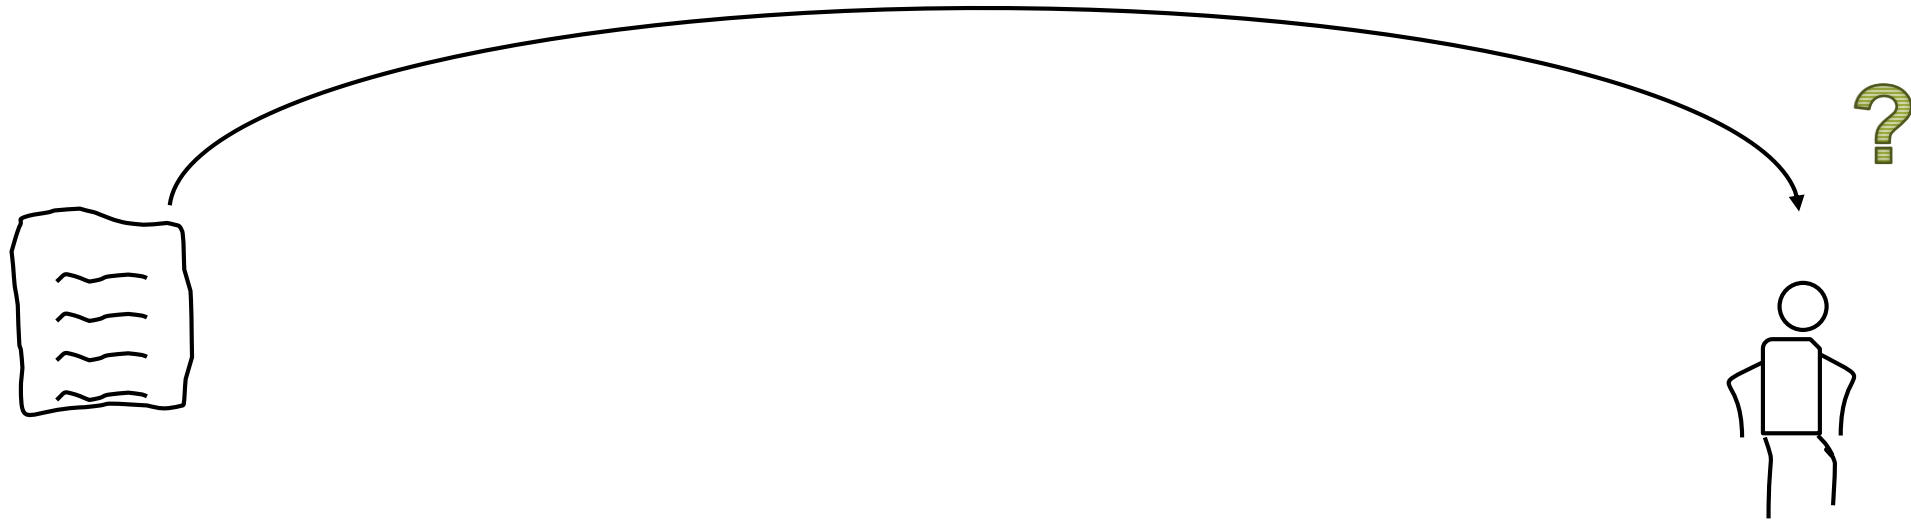



Fjárfestingaáætlun 2019

Fjárfestingaráætlun 2019	mkr
Fjárfestingar samtals	4.412

Helstu framkvæmdir 2019	mkr
Gufuöflun og niðurdæling	2.309
Varmastöð	818
Vél- og rafbúnaður	612
Fjölnýting	426
Hlöður	130
Annað	118





Jarðhitagarður Orku náttúrunnar við Hellsheiðarvirkjun

Um 100 hektara landsvæði vestan við stöðvarhús







Áframhald á uppsetningu hraðhleðslna og hleðslna



Útboð á rammamningum

Á árinu er fyrirhugað að bjóða út rammamninga til nokkurra ára en einnig fyrir stærri stök verk:

- Útboð vegna borana á rannsóknarholum fyrir háhita
- Útboð vegna einangrunar og áklæðningar
- Útboð á verkframkvæmd stækkunar Varmastöðvar við Hellisheiðarvirkjun (lagnavinna, rafmagn og uppsetning búnaðar)

Á síðasta ári voru boðnir út rammamningar fyrir:

- Sandblástur
- Vélvirkjapjónusta/Vélaviðhald
- Ráðgjafa- og verkfræðipjónusta
- Snjómokstur og jarðvinna





TAKK
☺



▶ Faxaflóahafnir

Jón Þorvaldsson
aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna


Útboðsþing 2019

Jón Þorvaldsson


aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna sf




Áætlaðar rekstrartekjur 2019 eru 4.177 millj. Kr

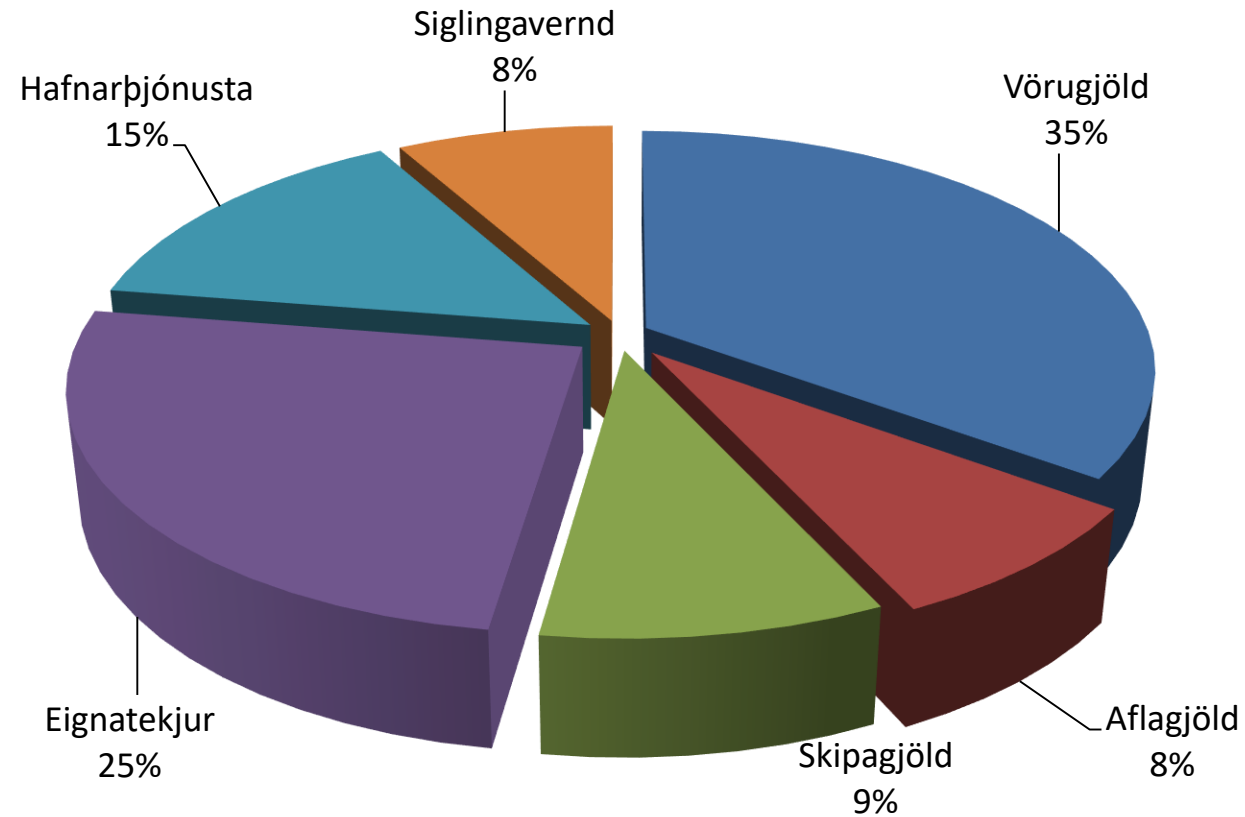


Áætluð rekstrargjöld 2019 eru 3.324 millj. Kr

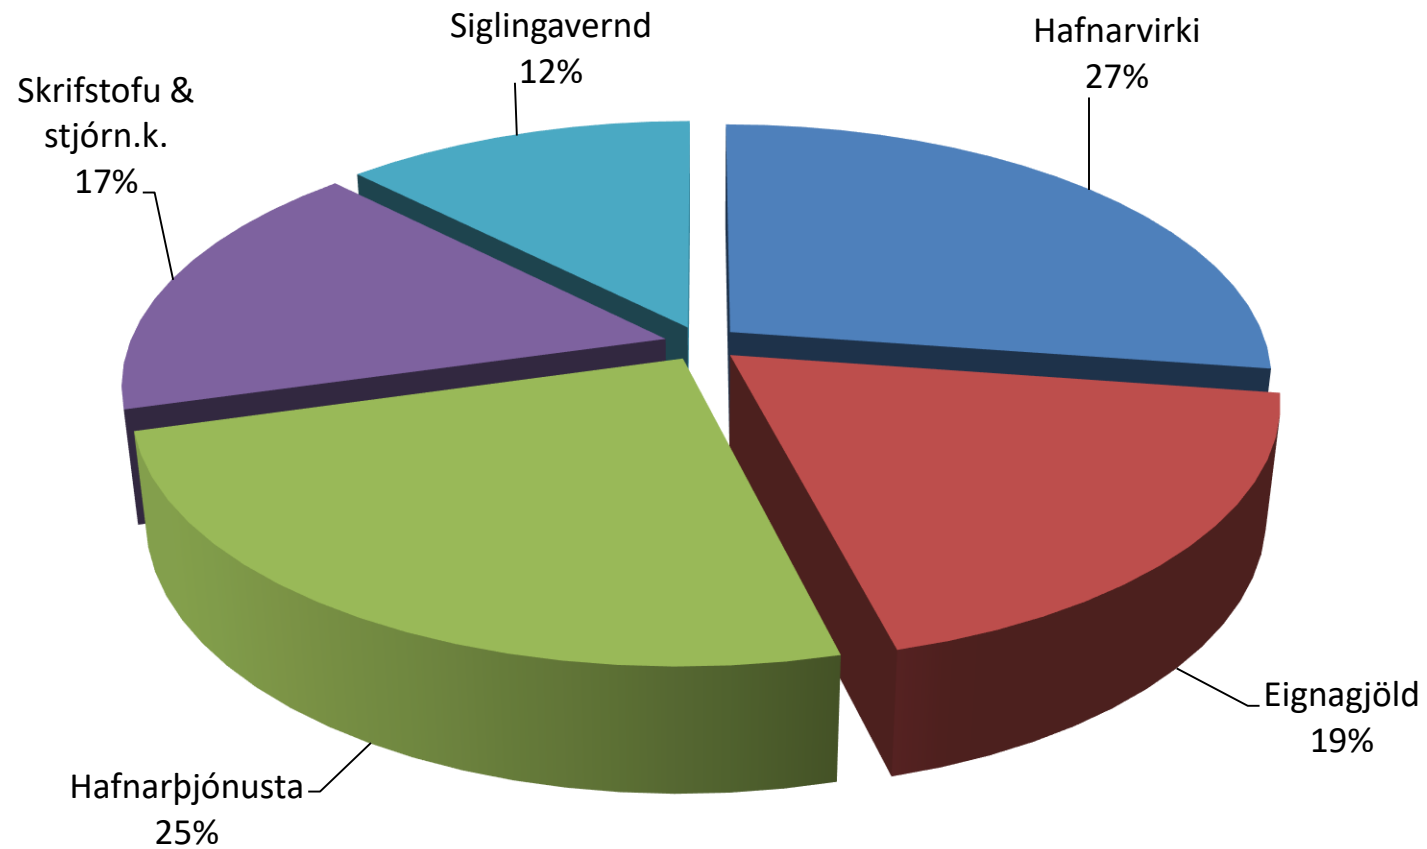


Skipakomur 2005-2017

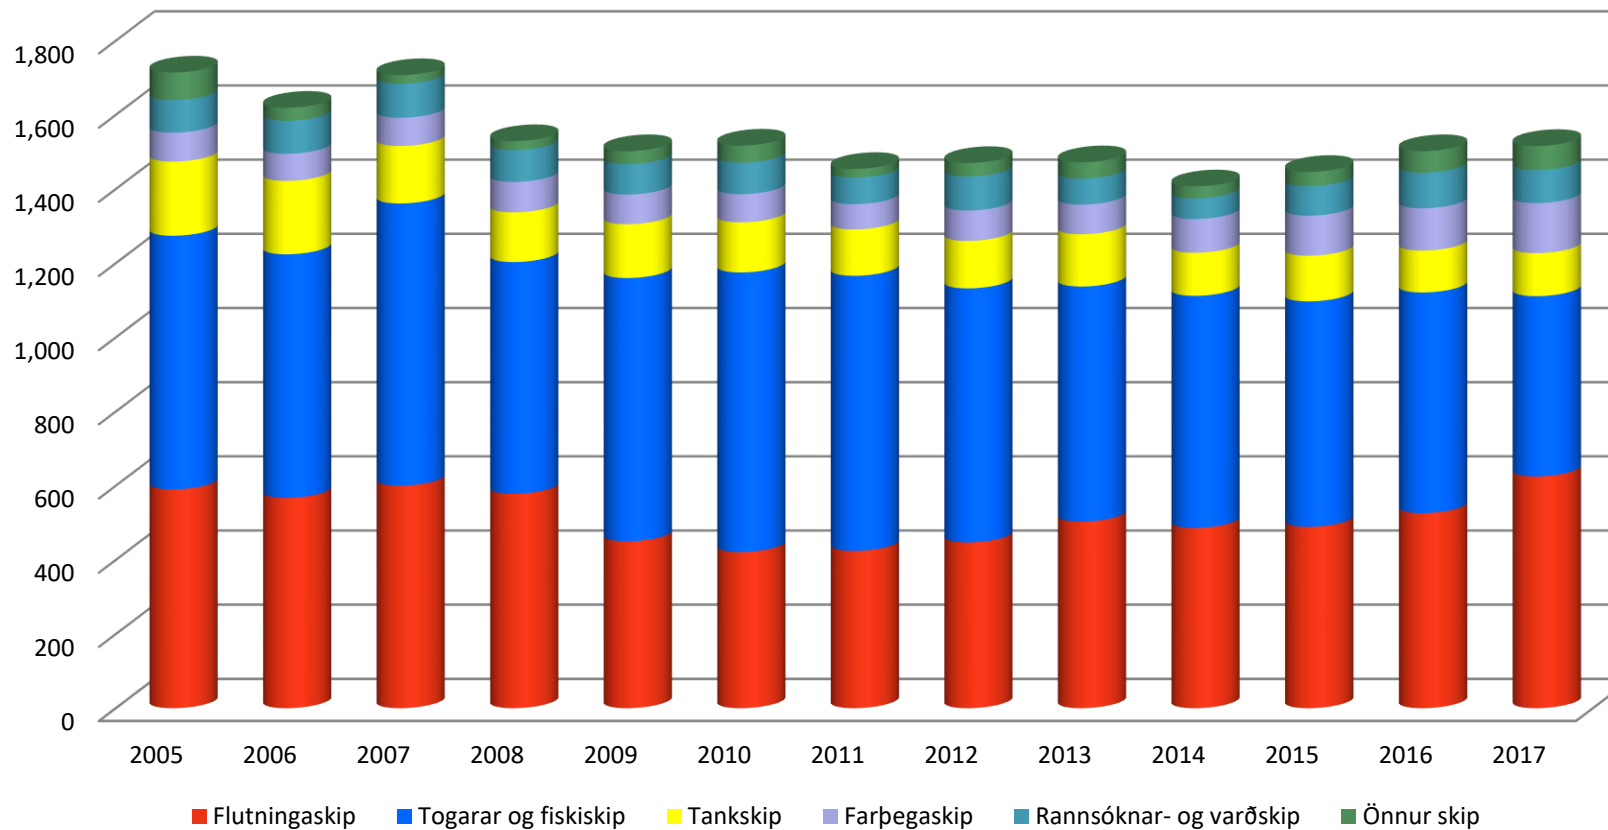


Samanlögð stærð skipa

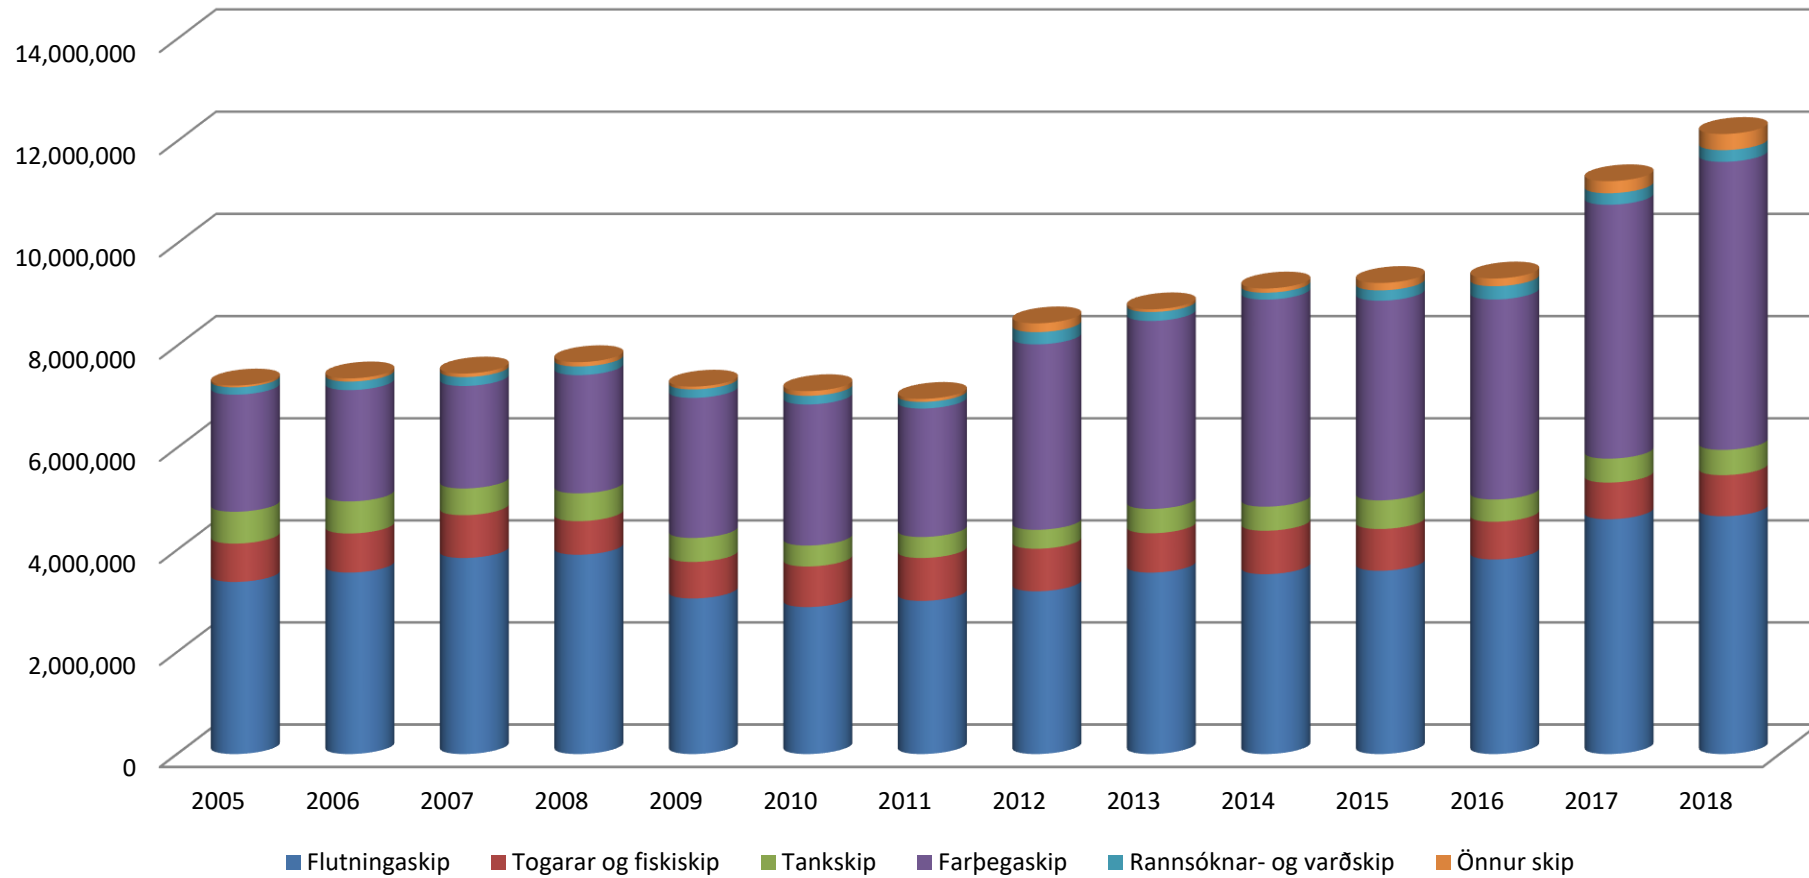

Vöruflutningar 2007-2017

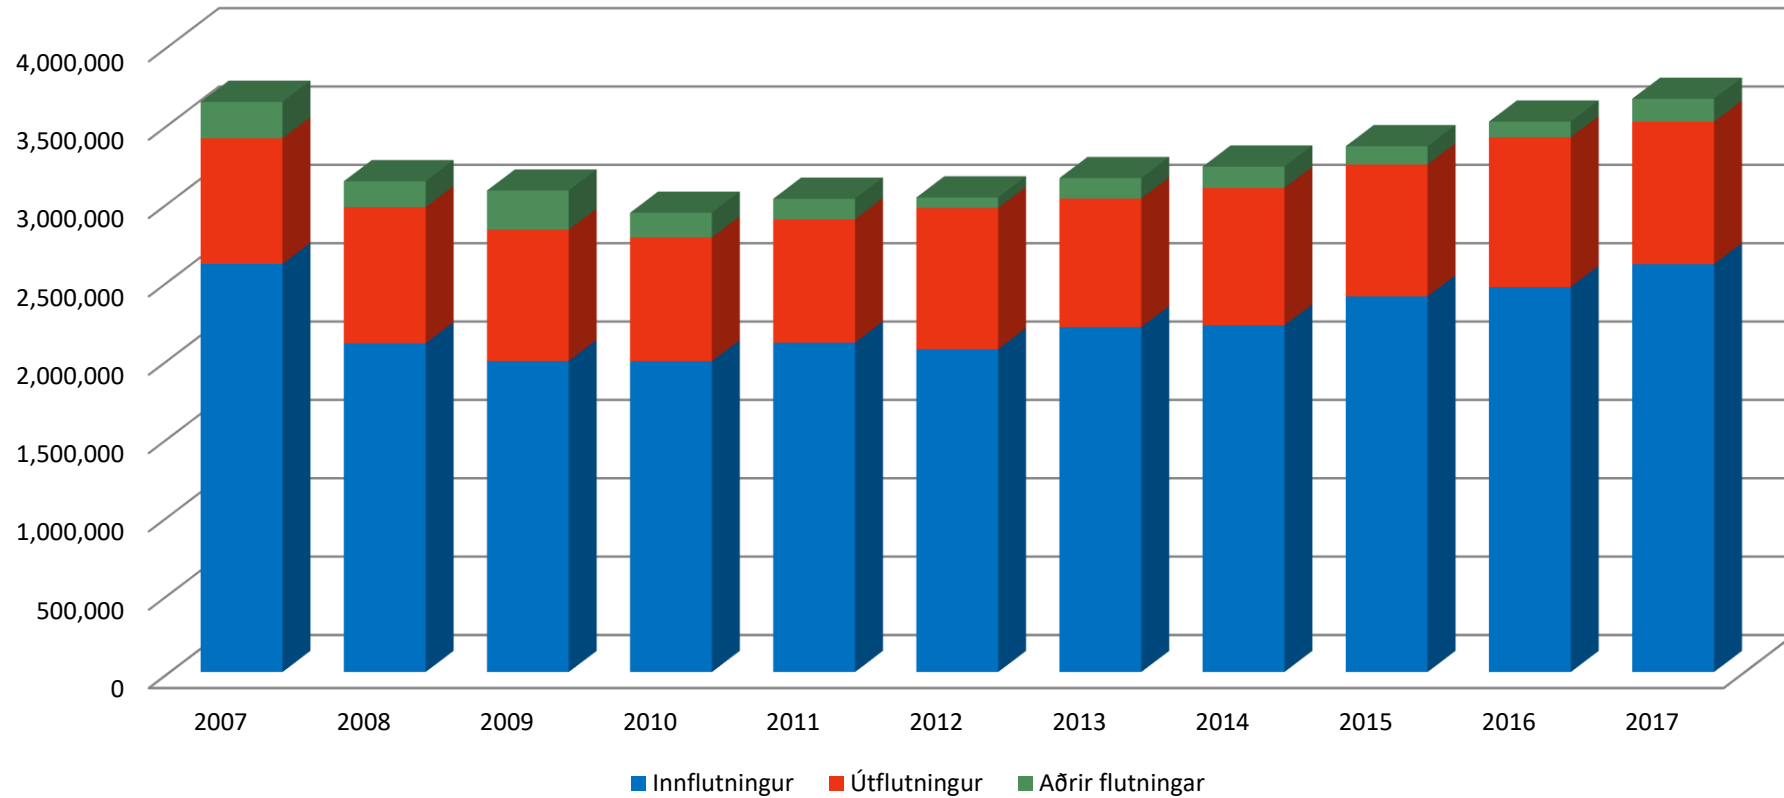

Gámaflutningar um hafnir Faxaflóahafna sf

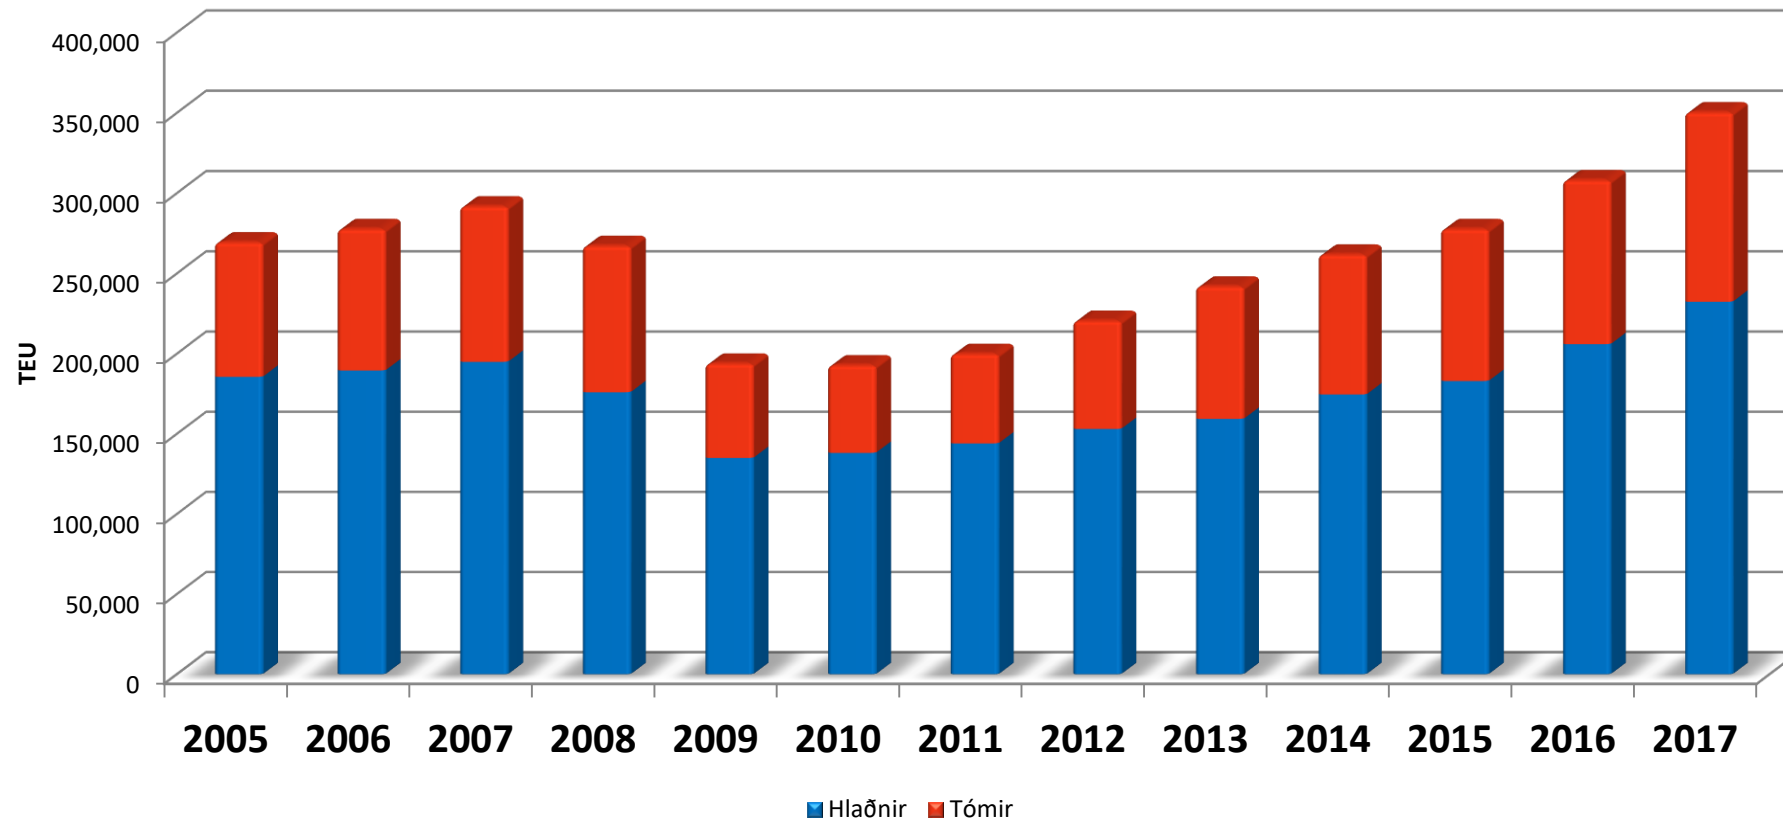

Fjárfestingar og viðhaldsverkefni 2014 – 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	Áætlað 2019
Fjárfesting	1.014,4	931,9	1.934,8	1.731,2	1.845,0	2.330,0
Viðhaldsverk	127,4	175,1	152,0	225,3	236,0	360,0
Alls	1.141,8	1.107,0	2.086,8	1.956,5	2.081,0	2.690,0





Gamla höfnin 2018







Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes







Gamla höfnin

Verkefni á árinu 2019:


- Faxagarður spennistöð og þjónustuhús
- Farþegaaðstaða við Miðbakka
- Rafdreifikerfi fyrir rafmagn til skipa, styrking og endurbætur á kerfi
- Farþega - og þjónustuaðstaða fyrir ferðaþjónustu við Ægisgarð og Suðurbugt
- Ýmis gatnagerðar- og slitlagaverkefni
- Viðhaldsdýpkanir í Gömlu höfninni
- Ný öldubrjótur fyrir Suðurbugt





Ártúnshöfði 2018



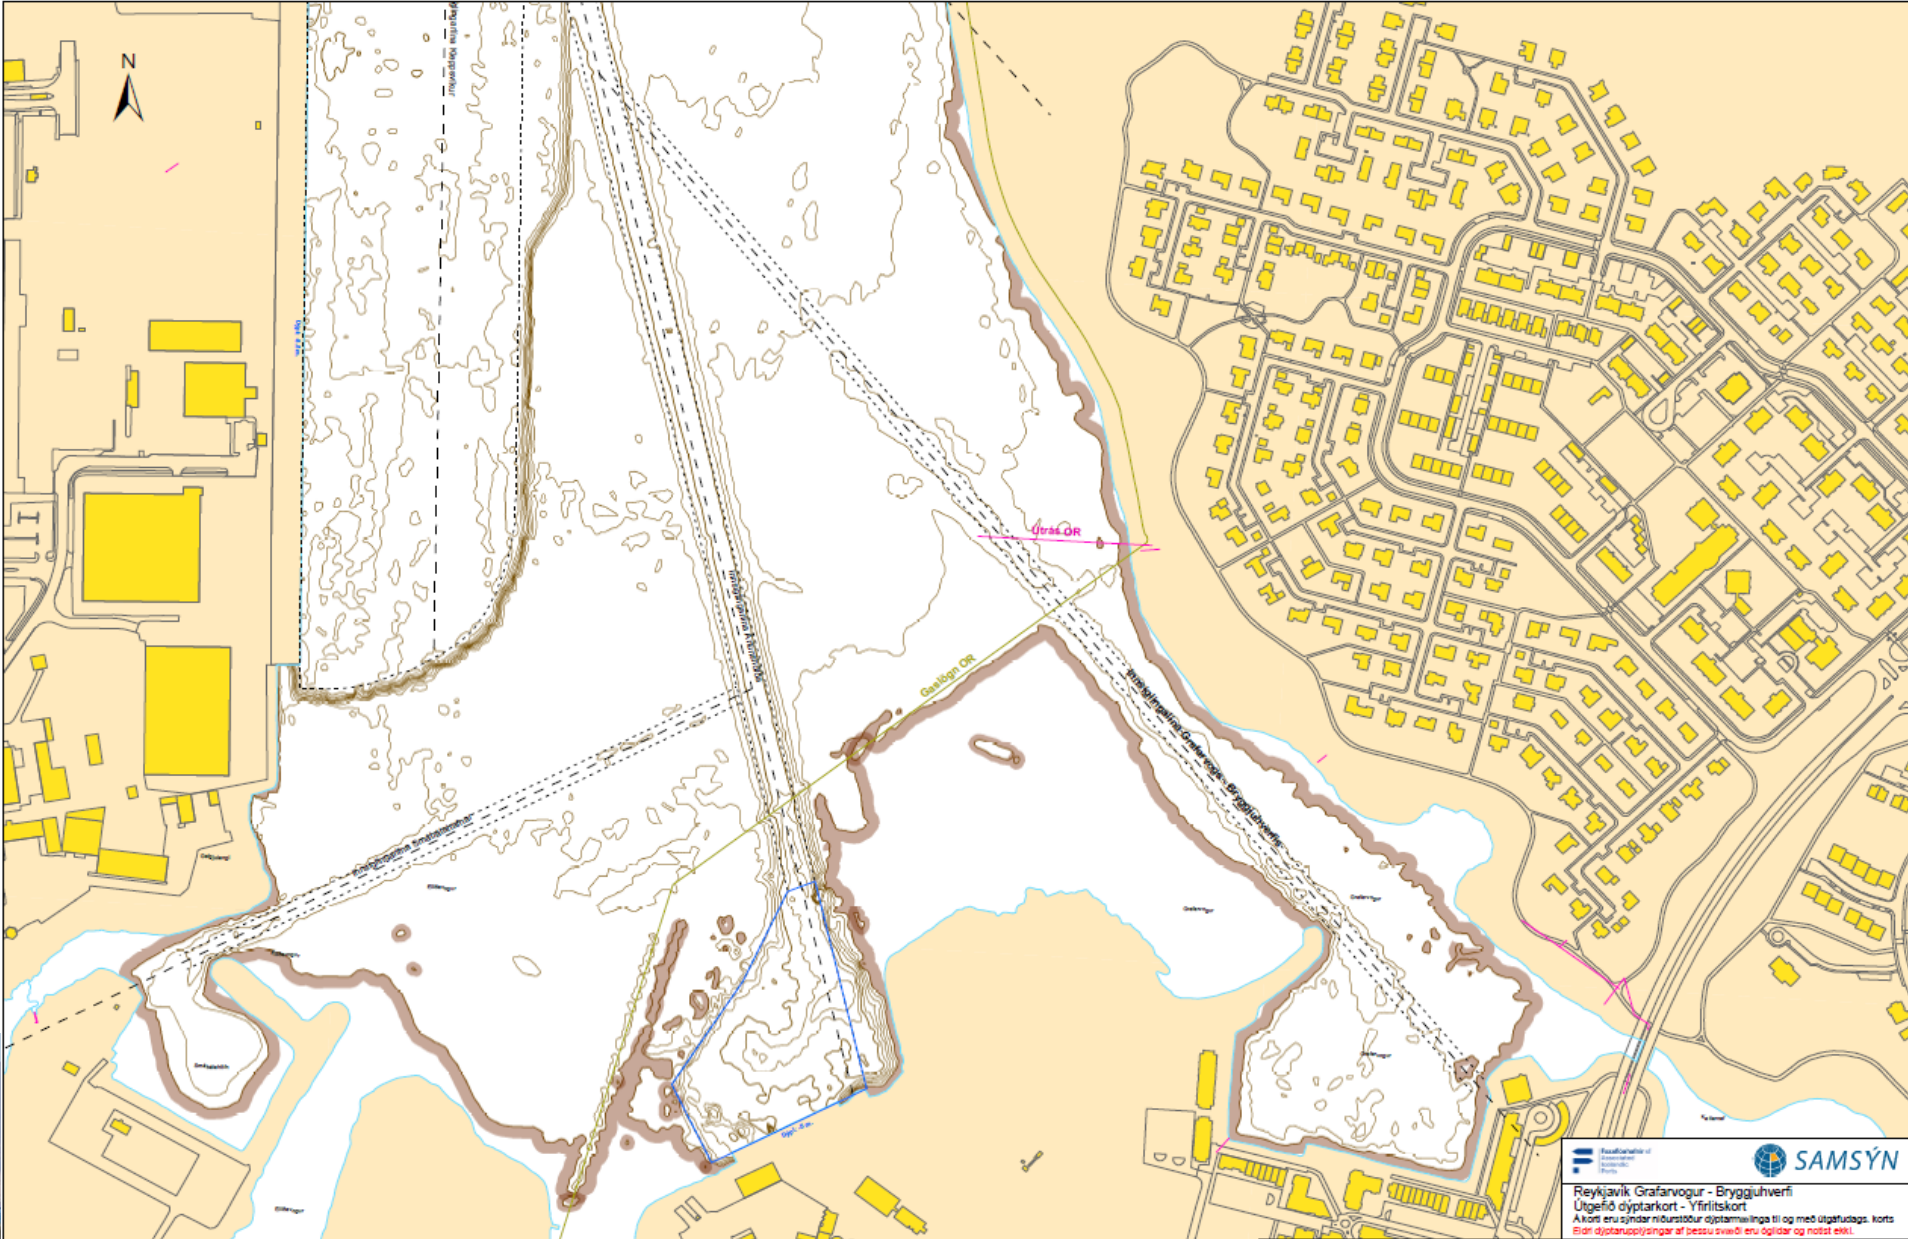


SAMSÝN

Reykjavík Grafarvogur - Bryggjuhverfi
Útgefið djúptarkort - Yfirflitskort
A kort eru sýndar niðurstöður djúptarmælinga til og með útgáfudags. Korts
Eið djúptanupplýsingar af þessu sviði eru ógildar og notað ekki.

Faxaflóahafnir - JF
Útg. Júní 2024
Mér: 1:2.000
Kortgerð: S/G

Djúptarmælingar í lofti Sjómáttálgæta Íslands
Gögn: Lengdir úr L1407 og L1407b
Kortgerð: S/G

0 25 50 100 150 200
Meter

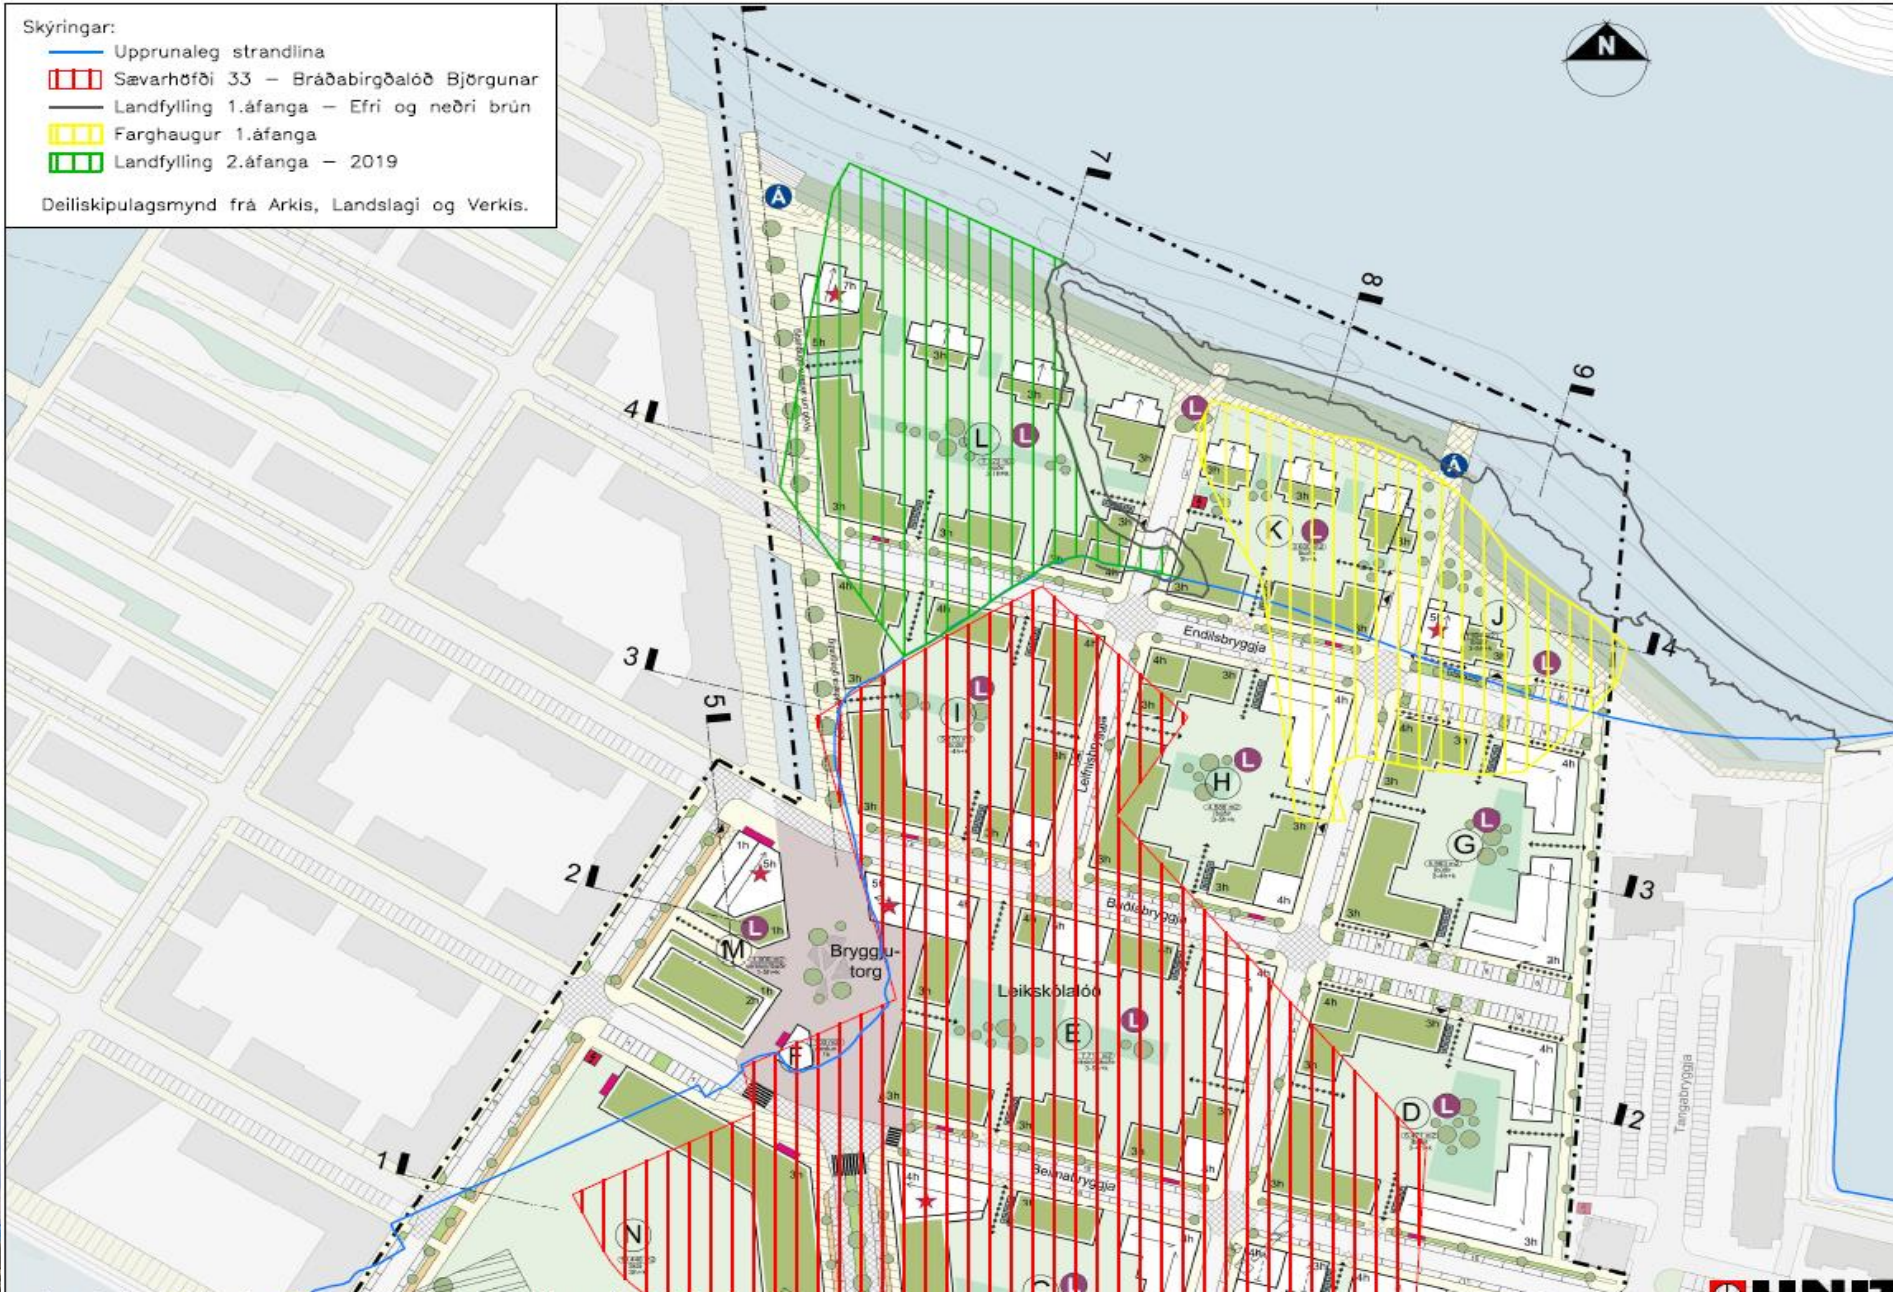










Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Reykjavik
Grundartangi
Akranes
Borgarnes






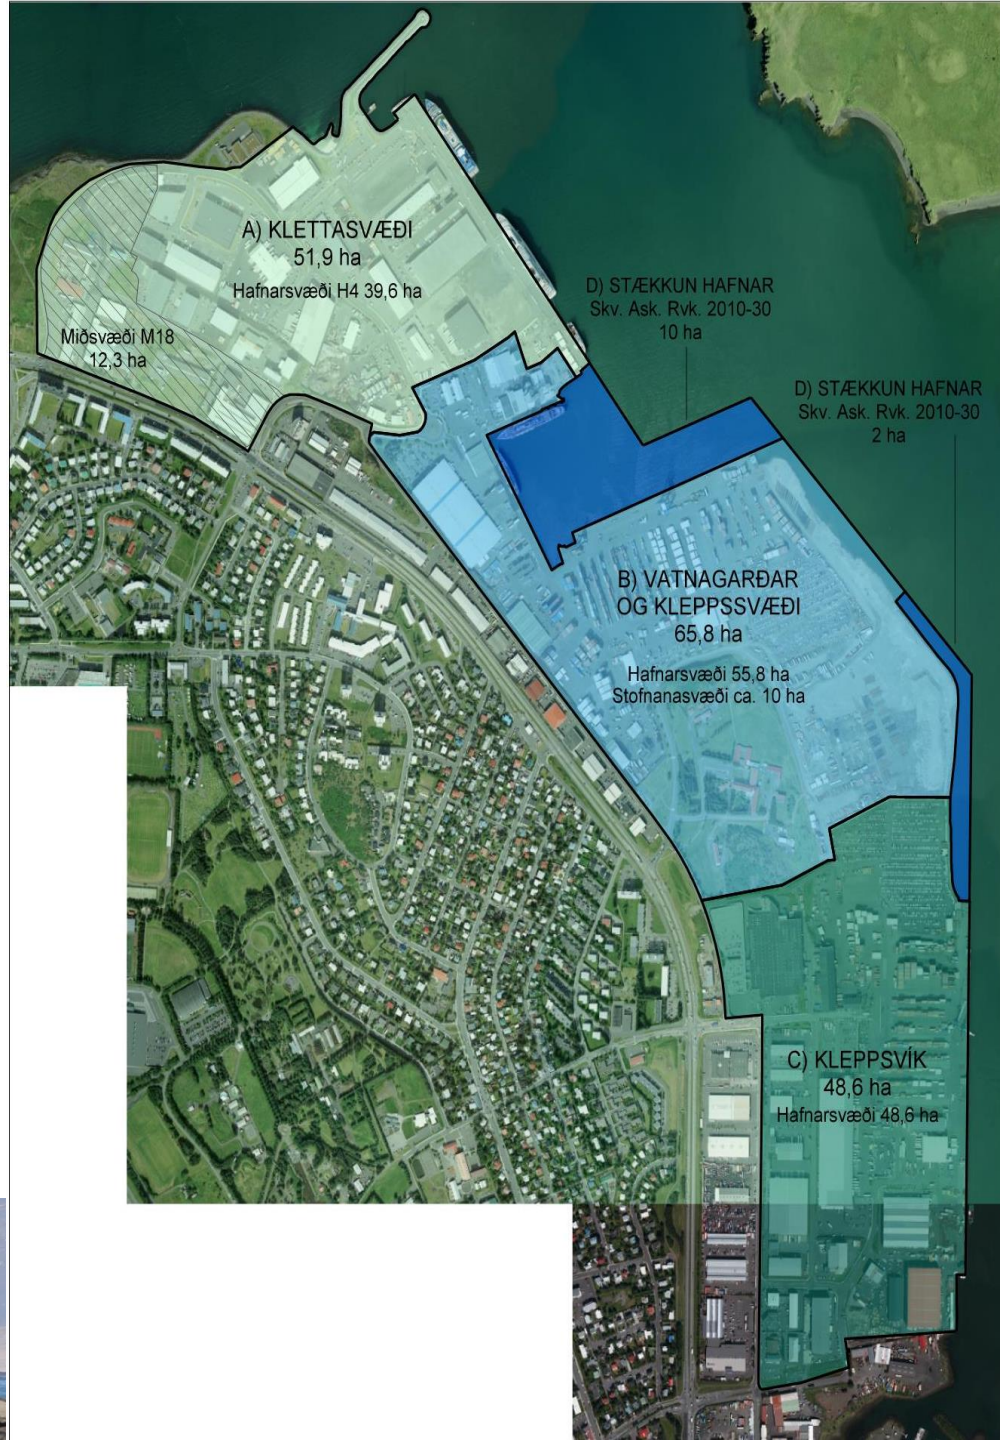


Sundahöfn


Þróun 2010 – 2030

3. áfangi 2020 – 2025

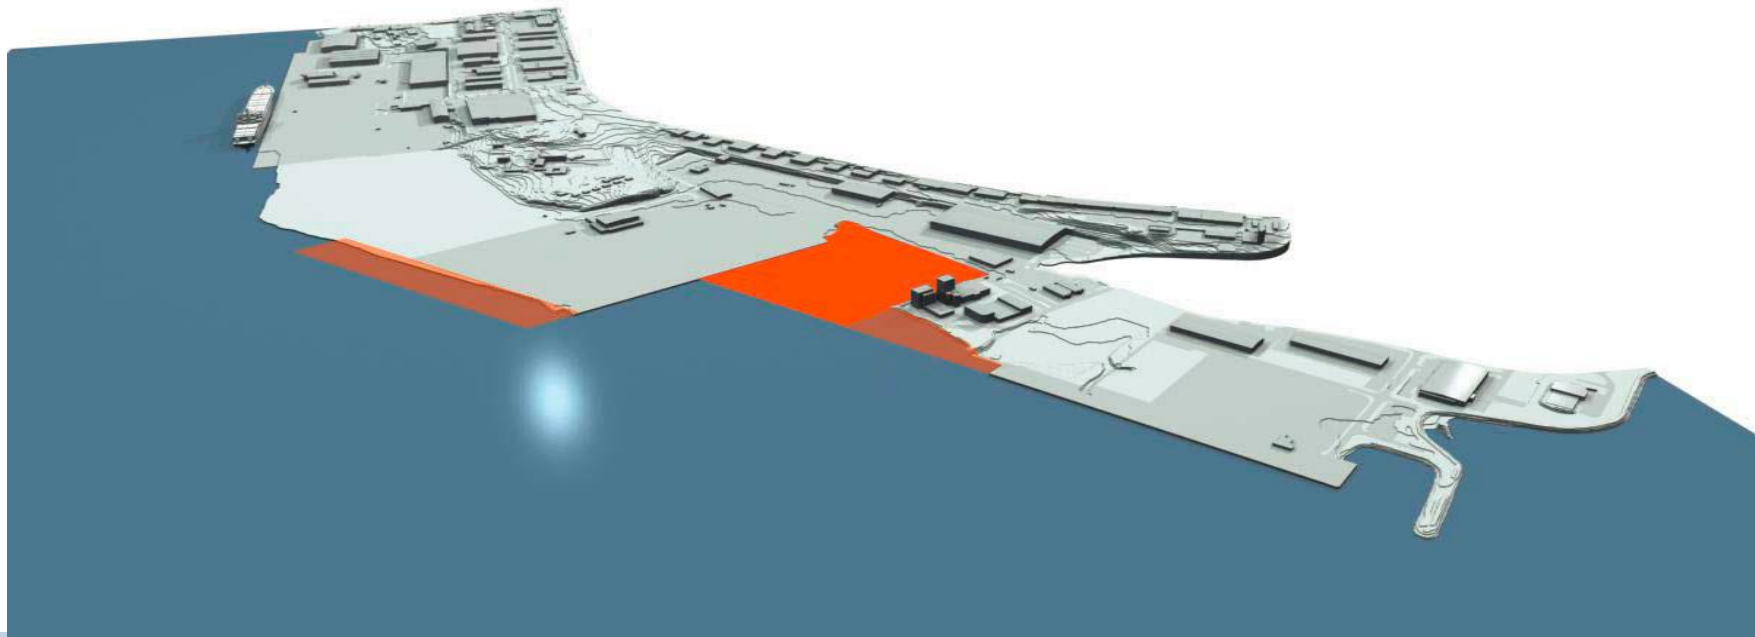

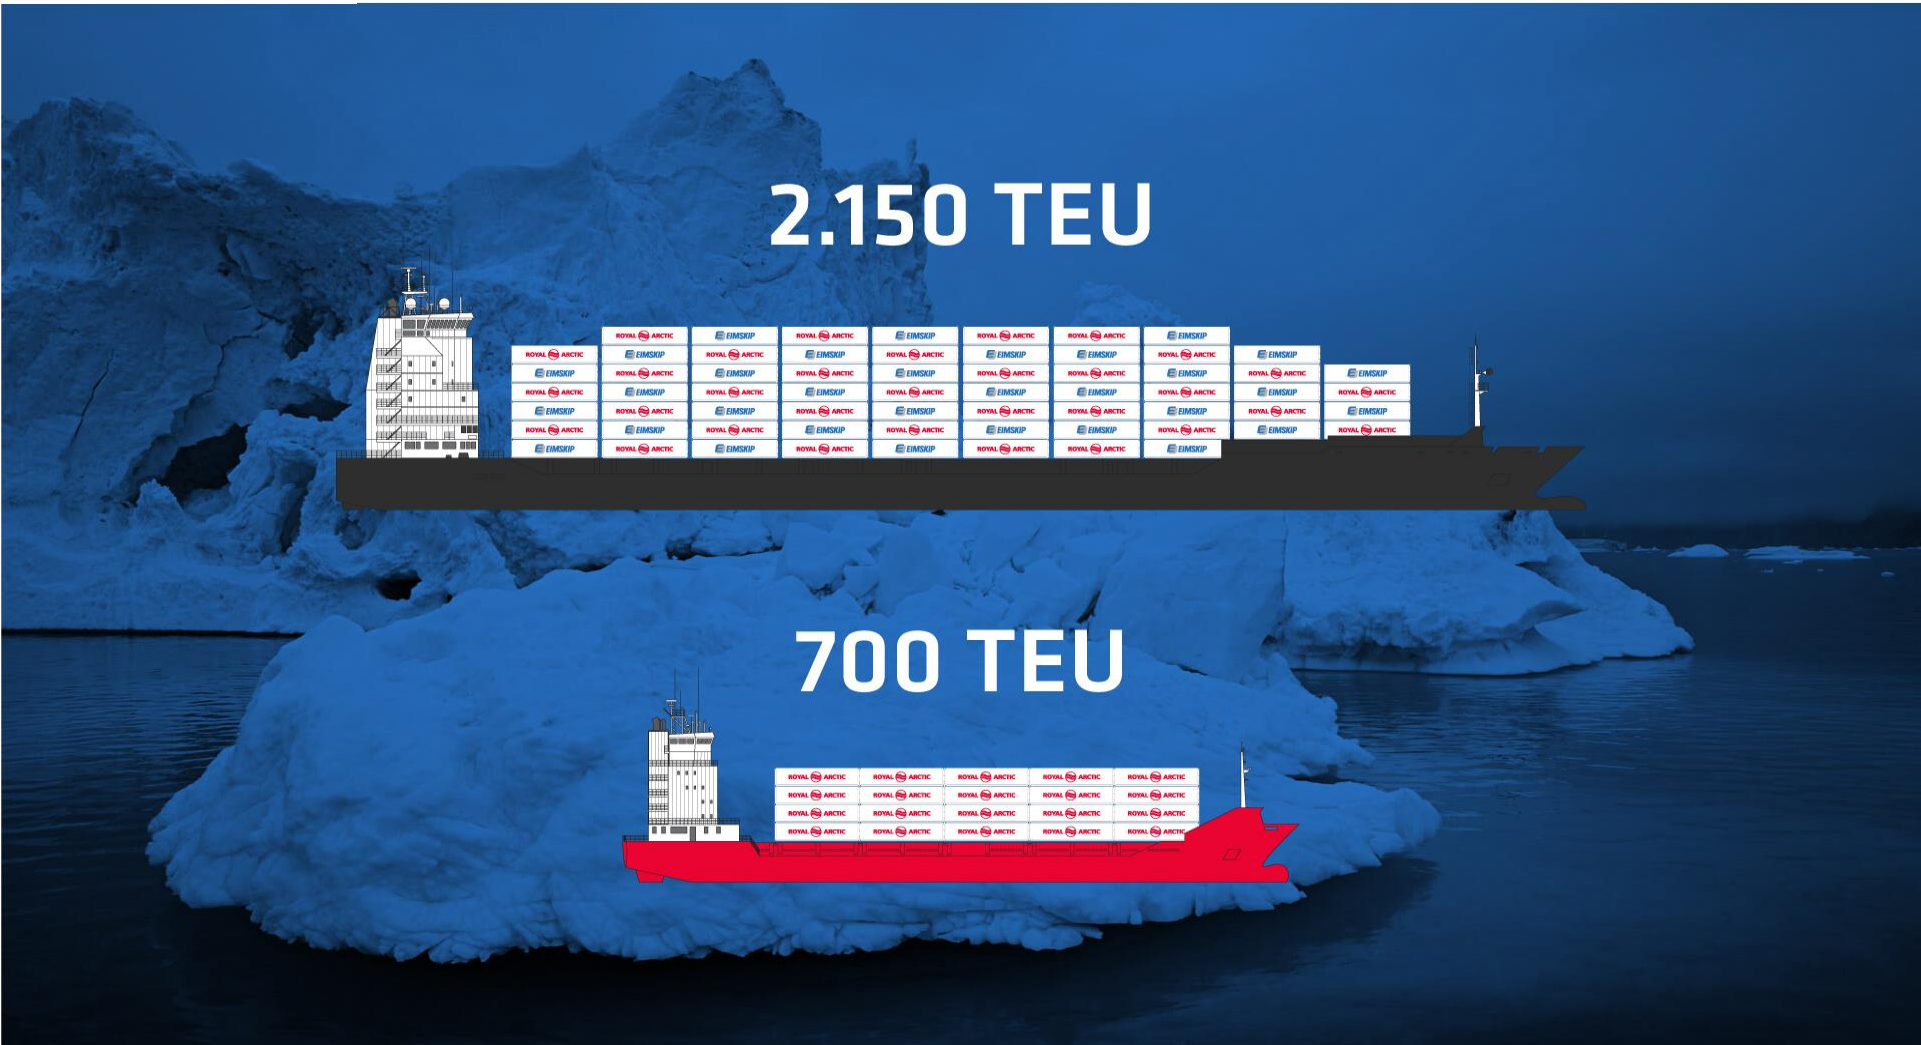



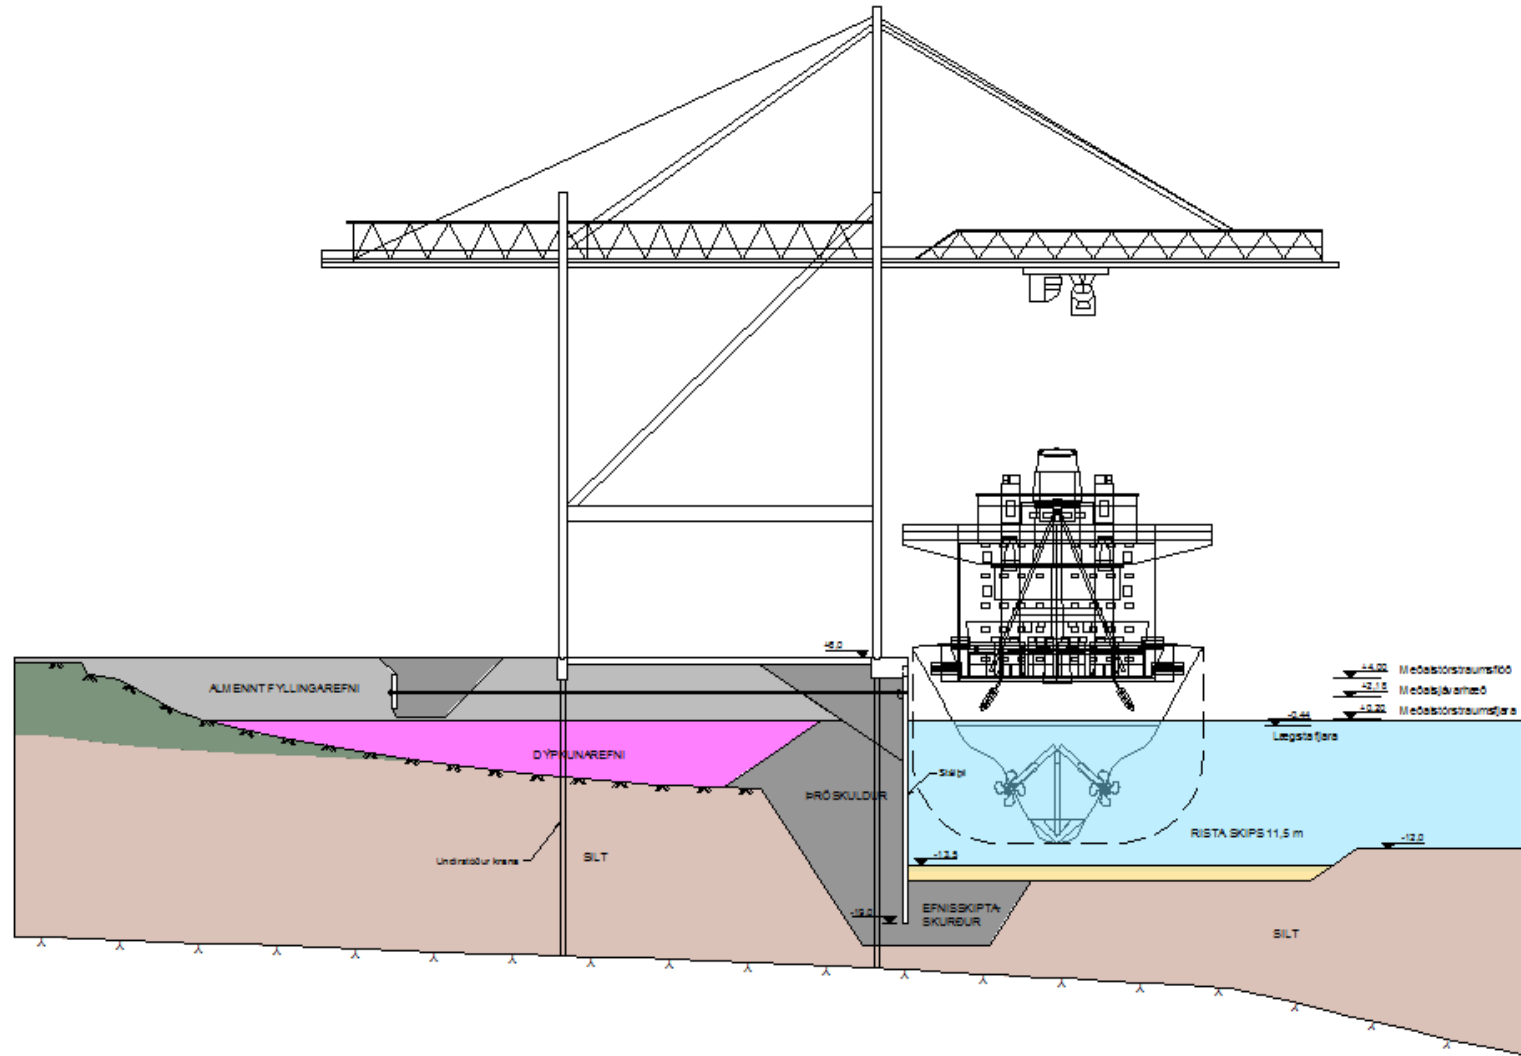

Nýr hafnarbakki utan Klepps – þversnið


mars 2018









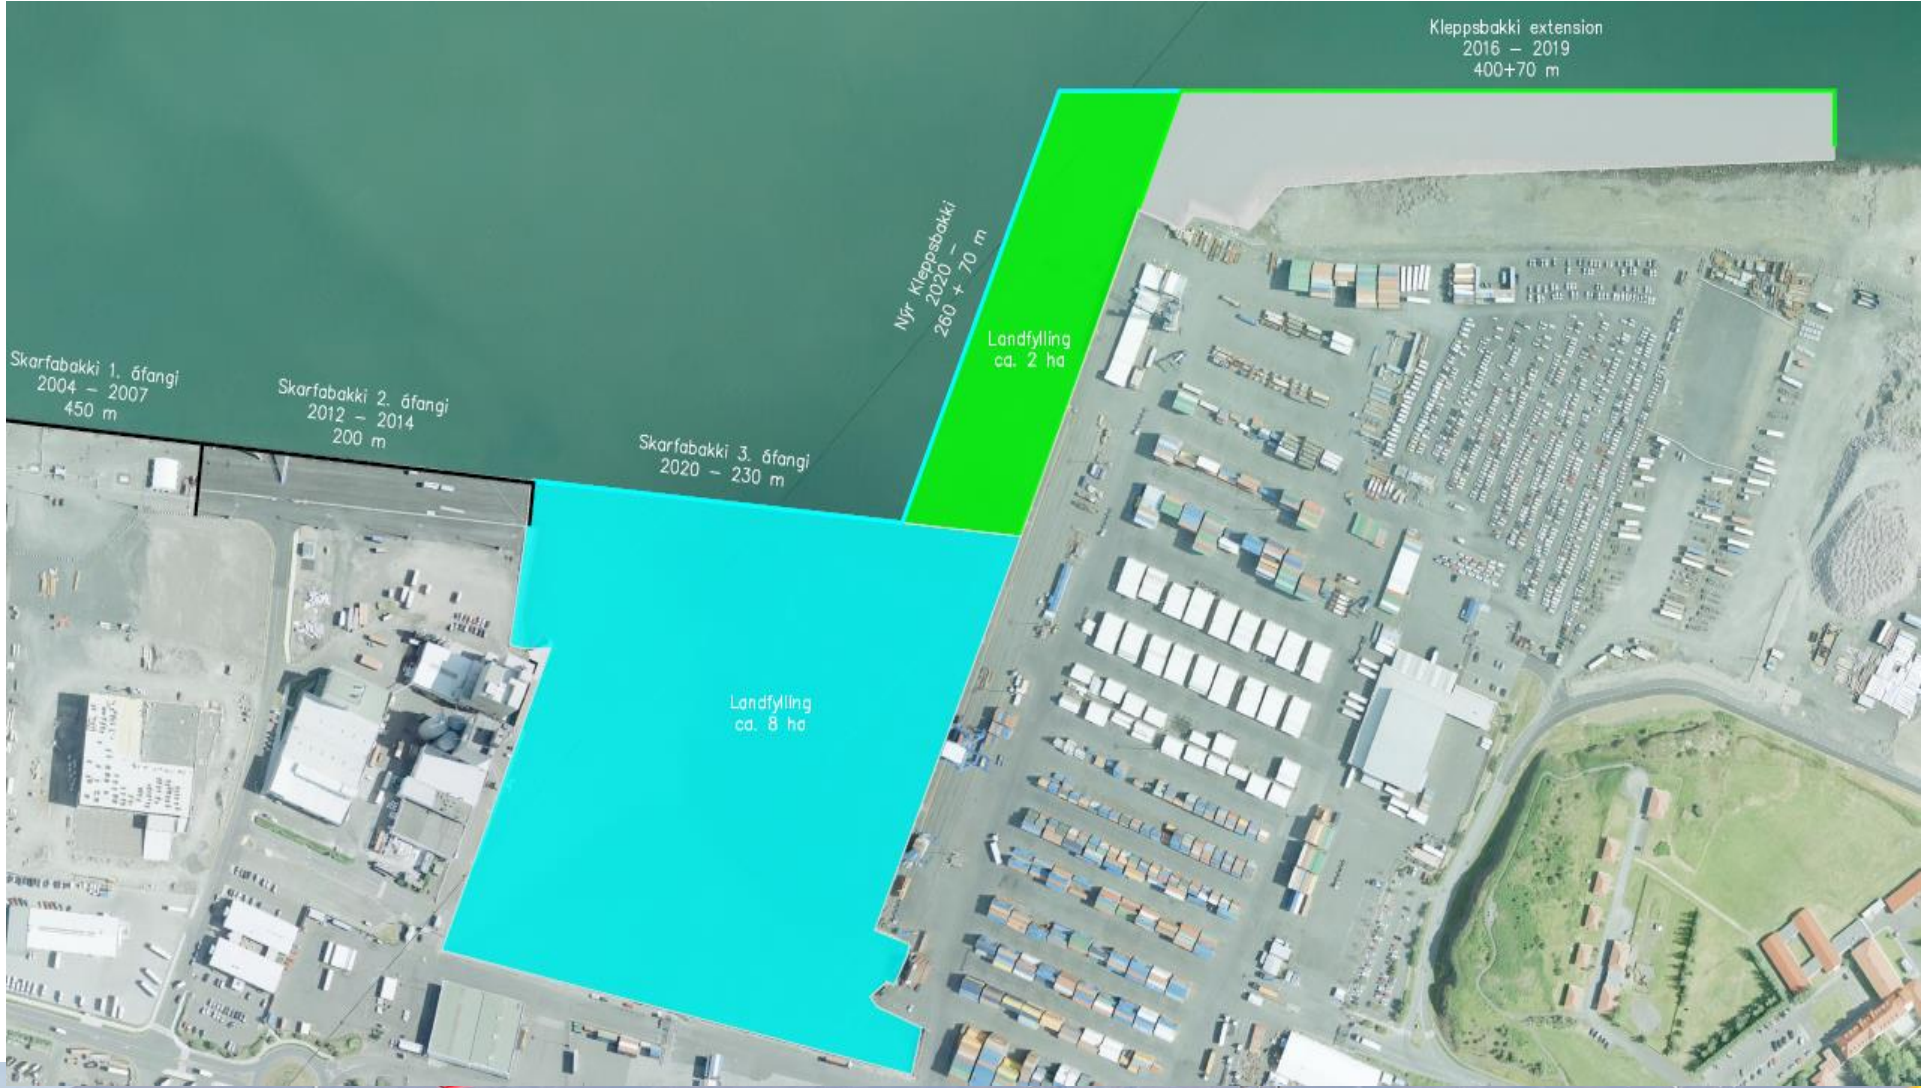

Síðari verkáfangar. Landfylling Skarfabakka 8 ha. Landfylling Kleppsbakka 2 ha. mars 2018



Dýpkun Viðeyjarsunds og Kleppsvíkur í -10 til -11,30 m dýpi



Dýpkanir í Sundahöfn á árunum 2019 - 2025

- Ýmsar rekstrar og viðhaldsdýpkanir fyrir Sundahöfn
 - $\approx 120.000 \text{ m}^3$
- Dýpkun Viðeyjarsunds og snúningssvæðis við nýjan hafnarbakka utan Klepps – verktími á árunum 2019 -2021
 - 600.000 m^3
- Dýpkun Kleppsvíkur – verktími síðar eða á árunum 2022 -2025
 - 500.000 m^3





Sundahöfn

Verkefni á árinu 2019:

- Nýr hafnarbakki utan Klepps -verklok á byggingu bakkans, kaup búnaði, yfirborðsfrágangur og veitukerfi
- Sundahöfn innsiglingamerki
- Dýpkun Viðeyjarsunds og snúnings-svæðis skipa við nýja hafnarbakka
- Viðhaldsdýpkanir í Sundahöfn
- Landgerð austan Laugarness
- Farþegaaðstaða við Skarfabakka
- Ýmis gatnagerðar- og slitlagaverk





Akranes 2018









Akranes

Verkefni á árinu 2019:

- Aðalhafnargarður endurnýjun fremri hluta garðs og bygging á nýjum hafnarbakka
- Hönnun, undirbúningur og útboð stálþilis og staga
- Endurbætur á pollum og bindingum skipa
- Akraneshöfn dýpkun



Grundartangi 2018







Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes





Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes







Grundartangi

Verkefni á árinu 2019:

- Tangabakki - ýmis frágangsverk
- Tangabakki - endurbætur á þybbum (fenderum)
- Tangabakki -farmvernarbúnaður, girðingar og fl
- Þróun lands og lóða á Grundartanga
- Ýmis gatnagerðarverk á Vestursvæðum Grundartanga





Borgarnes 2018





Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes







Takk fyrir





▶ ISAVIA

Maren Lind Másdóttir
deildarstjóri farangurskerfa
tækni- og eignasvið Keflavíkurflugvallar

A yellow snowplow with a blue and white brush is clearing snow on an airport tarmac. In the background, the wing and tail of a white airplane with a blue tail are visible. The sky is overcast and it appears to be snowing. A white semi-transparent box is overlaid on the left side of the image, containing text.

ÚTBOÐSPING SI

Maren Lind Másdóttir
24. Janúar 2019



ISAVIA

HLUTVERK

Isavia er þjónustufyrirtæki
í flugvallastarfsemi
og flugleiðsögu sem leggur
grunn að flugsamgöngum
Íslands




UM ISAVIA

- / Hjú Isavia starfa yfir 1.400 manns
 - Þar af starfa um 280 manns hjú dótturfélögunum Fríhöfninni, Tern systems og Suluk
- / Starfsstöðvar Isavia eru um allt land
 - Höfuðstöðvar Isavia eru í Reykjavík
 - Keflavík er stærsti vinnustaðurinn með yfir 600 starfsmenn
 - Starfsmenn flugleiðsögubjónustu í Reykjavík eru yfir 200



STARFSEMI ISAVIA

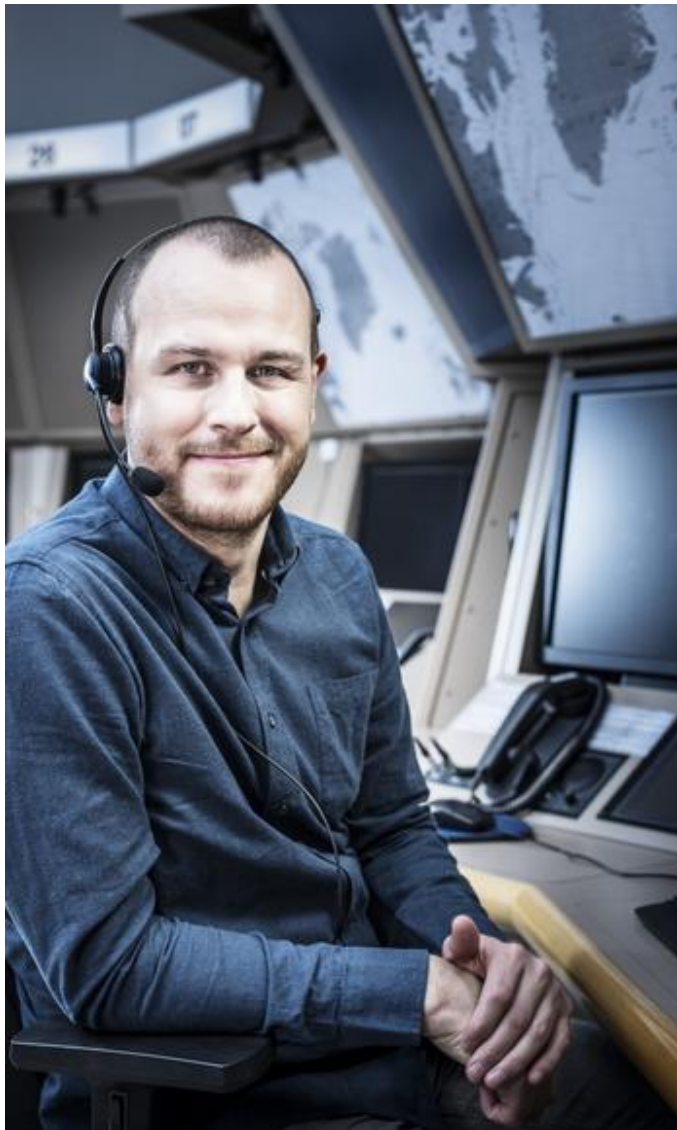

Rekstur flugvalla

/ Alþjóðaflugvellir

/ Innanlandsflugvellir

Flugleiðsaga

/ Á flugvöllum

/ Í flugstjórnarsvæðinu



SAMFÉLAGSLEGA ÁBYRGT FYRIRTÆKI


- / Isavia er samfélagslega ábyrgt fyrirtæki
- / Starfsemin skiptir miklu máli fyrir þjóðarhag
 - Sér um rekstur og viðhald á grunninnviðum flugsamgangna
 - Leggur áherslu á að efla tengingar við umheiminn
 - Stýrir flugi á milli þriggja heimsálfa á stóru svæði
- / Starfsfólk leggur sig fram um að haga störfum sínum á öruggan og skilvirkan hátt í sátt við samfélagið
- / Megináhersla er lögð á þrjá þætti:
 - Samfélag
 - Efnahag
 - Umhverfi



KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR

Rekstrarsvið

- / Umsjón með flugtengdum rekstri
- / Flugvernd
- / Flugvallarþjónusta
- / Tæknipjónusta
- / Farþegaþjónusta

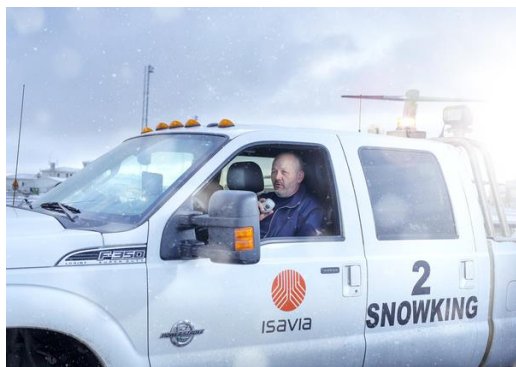

Tækni- og eignasvið

- / Uppbygging og rekstur fasteigna og þróun flugvallar
- / Verkfræðideild
- / Umhverfismál
- / Viðhald og rekstur
- / Farangurskerfi




Viðskiptasvið

- / Umsjón með óflugtengdum rekstri
- / Verslunar- og veitingasvæði KEF
- / Bílastæði og samgöngur
- / Þróun leiðarkerfis og samskipti við flugfélög




UPPBYGGING HEFUR BEIN ÁHRIF Á HAGVÖXT

- / Fyrir hverja 10% aukningu í flugtengingum eykst þjóðarframleiðsla um 0,5%
- / Um 19.700 störf eru tengd flugvöllum á Íslandi
- / 1.000.000 farþegar búa til u.þ.b. 1.000 bein störf

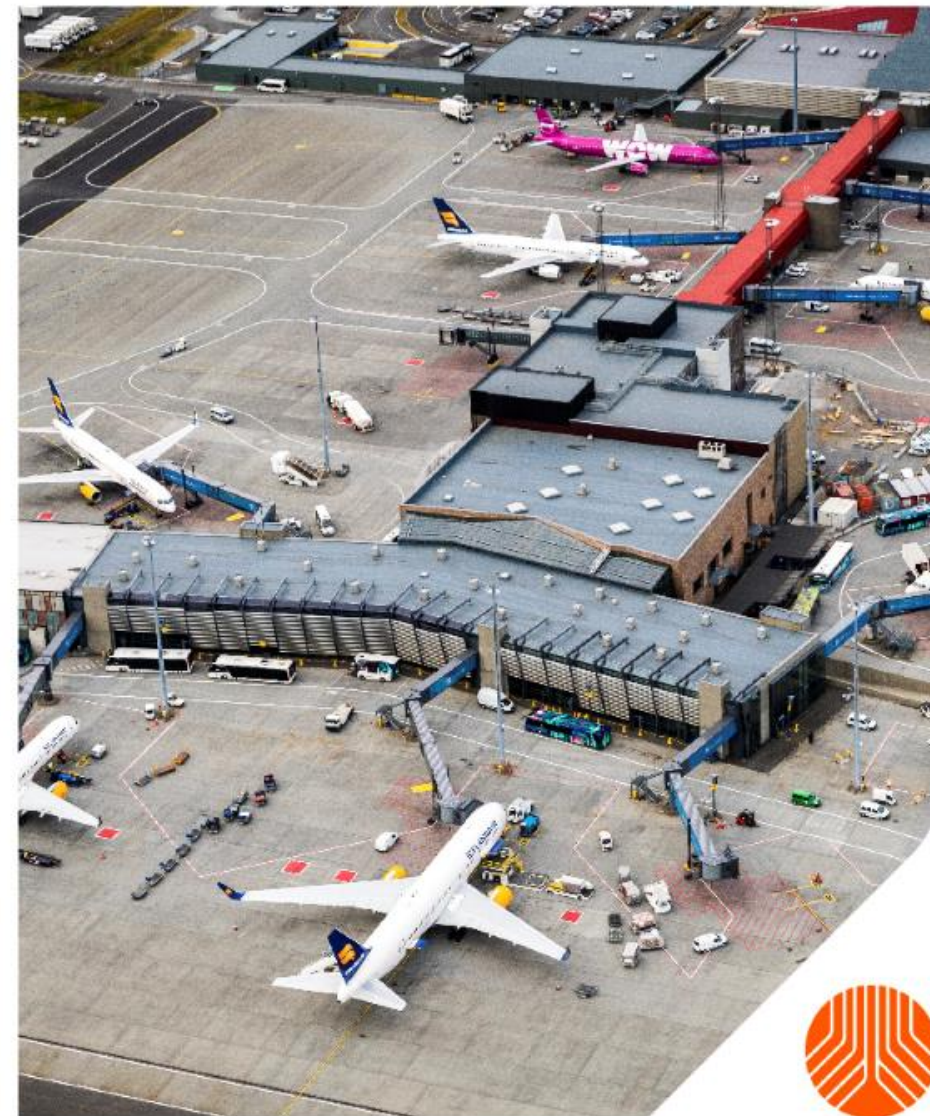

FARÞEGARÞRÓUN KEFLAVÍKURFLUGVALLAR

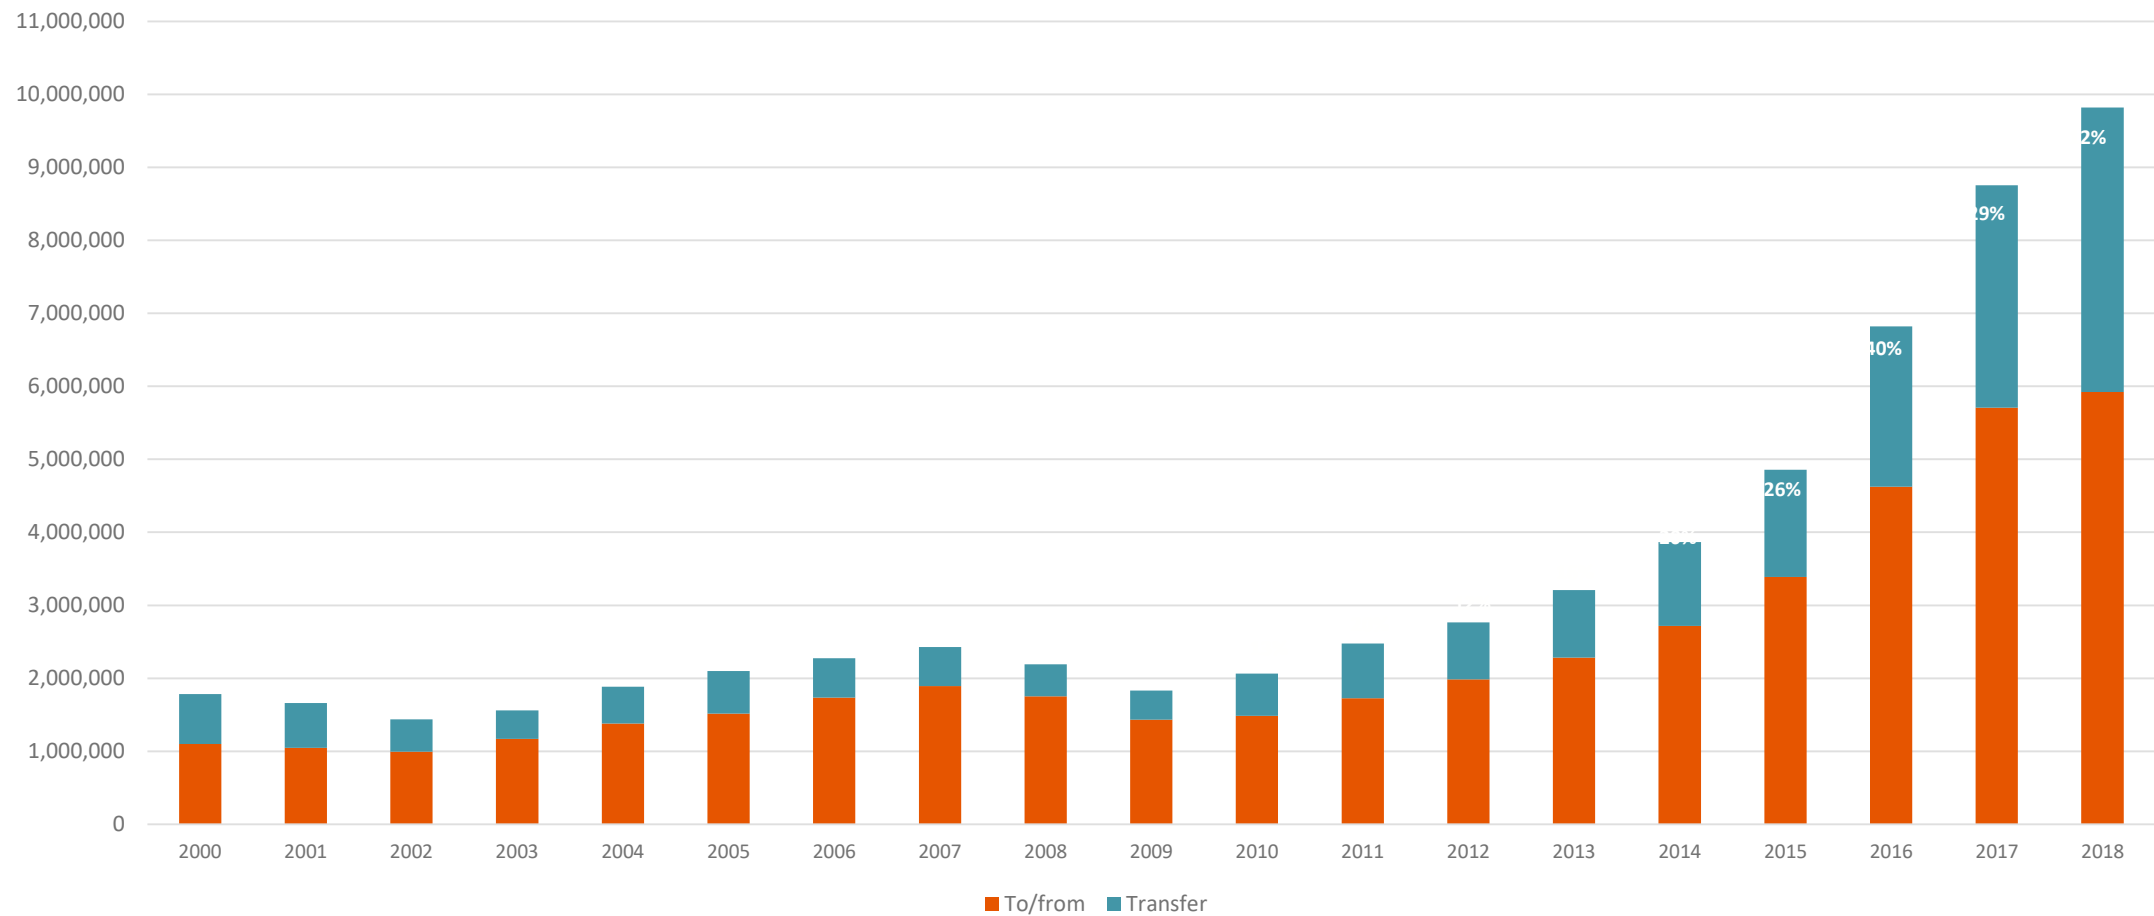

A stylized map of Europe with a light grey background and blue water. A network of yellow lines represents flight routes, all originating from a central hub in Iceland. These lines radiate outwards to various destinations across Europe, with a particularly dense network of routes in the Western and Southern regions. Small orange dots mark the destination points along these routes.

Sumar 2018

93 áfangastaðir

**26 flugfélög, þar af 12 sem
fljúga allt árið**




RAMMASAMNINGAR



RÁÐGJÖF OG HÖNNUN - FLUGSVÆÐI

- / Rammasamningur er í útboðsferli
- / Hönnun og ráðgjöf fyrir verkefni á athafnasvæði flugvalla.
Rammasamningurinn nær yfir alla flugvelli Ísavia
- / Fyrsta fasa, PQQ, lýkur 31.janúar kl.12:00
 - Enn hægt að ná í gögn!

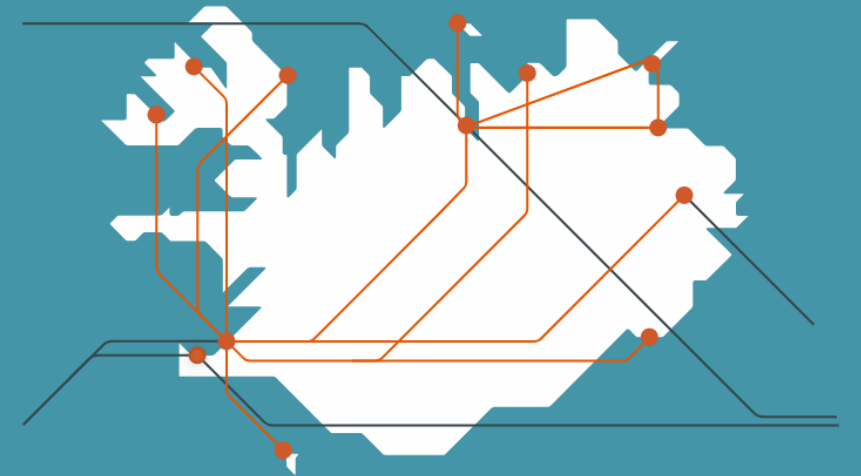

FLUGBRAUTAKERFI



VIÐHALD FLUGBRAUTA OG AKBRAUTA

/ Tilgangur

- Lengja líftíma slitlaga
- Tryggja rekstraröryggi
- Hækka staðal á flugbrautakerfi í CAT IIIB

/ Verkefnið

- Nýtt slitlag á TWY S3 og S4
- Minni viðgerðir á TWY E1, N1 og Stand 46
- Yfirsprautun á NOV-3, NOV-4, NOV-5, CHA-3
- Yfirsprautun á RWY 01/19 og partur af RWY 10/28
- Framkvæmd hefst í Júní 2019, skal lokið í September 2019.

/ Möguleiki á útboði rammasamnings til 5 ára




AKBRAUTARLJÓSS ENDURNÝJUN

/ Tilgangur

- Endurnýja akbrautarljós
- Ný miðlínuljós
- Tryggja rekstraröryggi
- Hækka staðal á flugbrautarkerfi í CAT IIIB

/ Verkefnið

- Hönnun hafin að hluta, þarf að hanna fyrir allan flugvöllinn
- Útboð 2019
- Framkvæmd hefst 2020
- Lýkur 2022

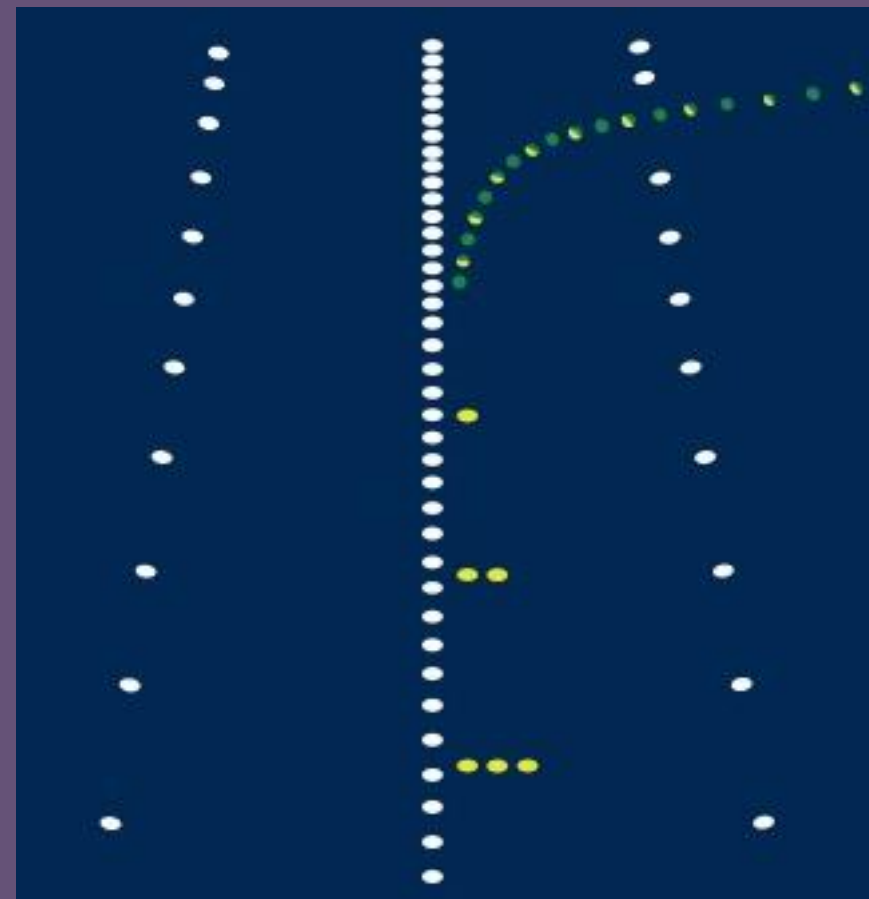

MANNVIRKI OG VEGIR





APRON BOARDING STATION

/ Tilgangur

- Bæta þjónustu á Keflavíkurflugvelli
- Auka öryggi


/ Verkefnið

- Kaup á búnaði: 4 Landgöngubrýr
- Framkvæmd: 4 þjónustuhús
 - 400fm og rúmar 350 manns hvert
- Staðsetning á stæðum 70-73
- Útboð í lok mars 2019
- Framkvæmd hefst 2019

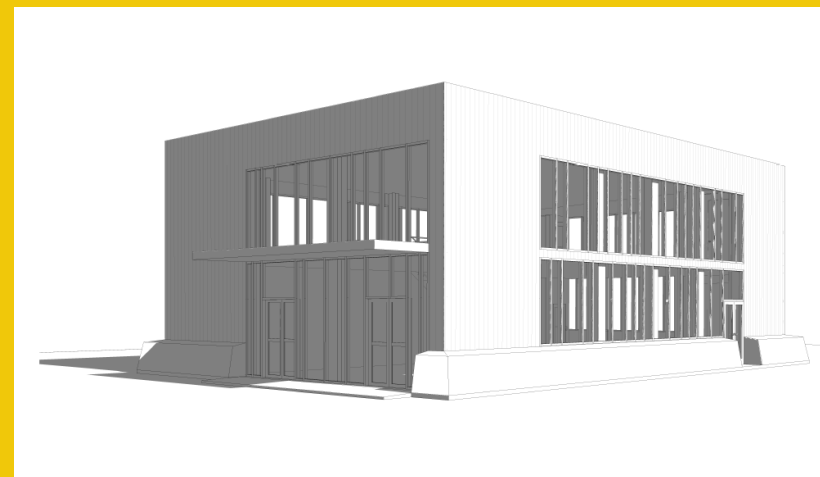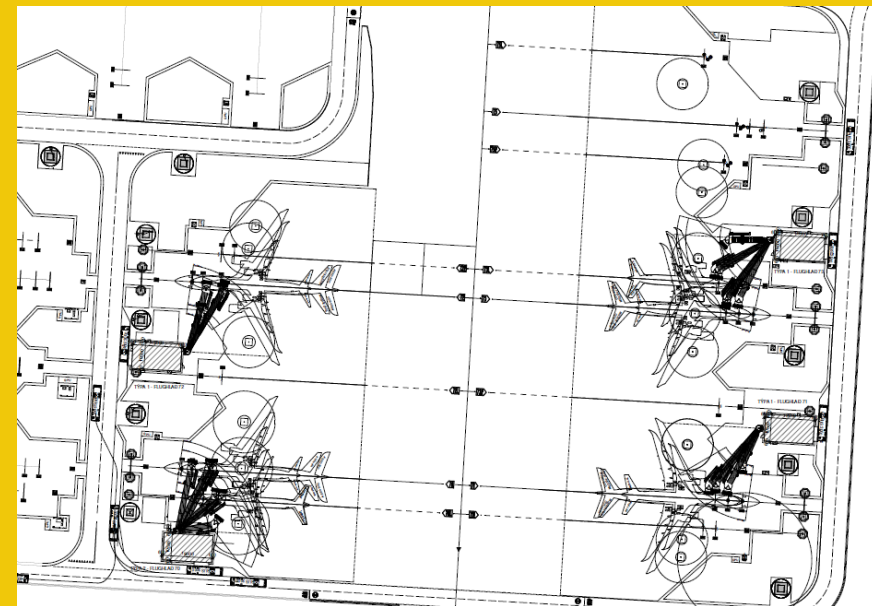

VEGAKERFI

- / Unnið er að útboði á vegagerð á sveitafélagsvegum samkvæmt deiliskipulagi Isavia.
 - Vegagerð
 - Fráveitu- og regnvatnslagnir
 - Veglýsing
- / Forhönnun í gangi
- / Tímasetning útboðs ekki ákveðin

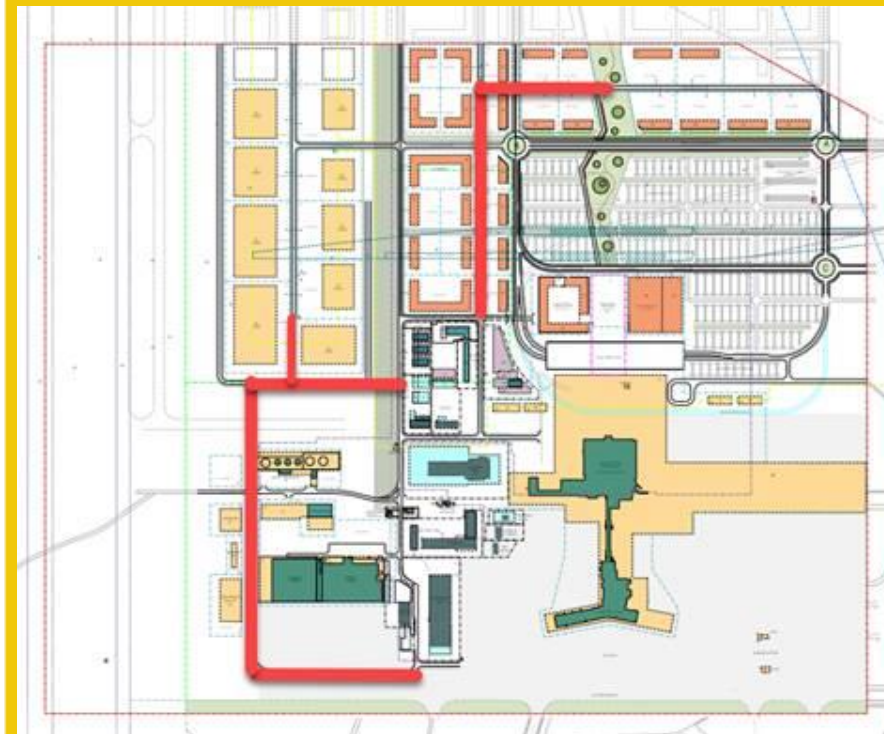


UPPBYGGING KEFLAVÍKURFLUGVALLAR




UPPBYGGINGARÁÆTLUN

- / Uppbyggingaráætlun Keflavíkurflugvallar er ætlað að meta uppbyggingarþörf til skemmri tíma, byggt á nýjustu farþega- og flughreyfingaspám
- / Tekur mið af 25 ára þróunaráætlun en er aðlöguð að þörfum næstu 7-10 ára
- / Er uppfærð og kynnt stjórn Isavia 2x á ári

www.isavia.is/uppbyggingkef

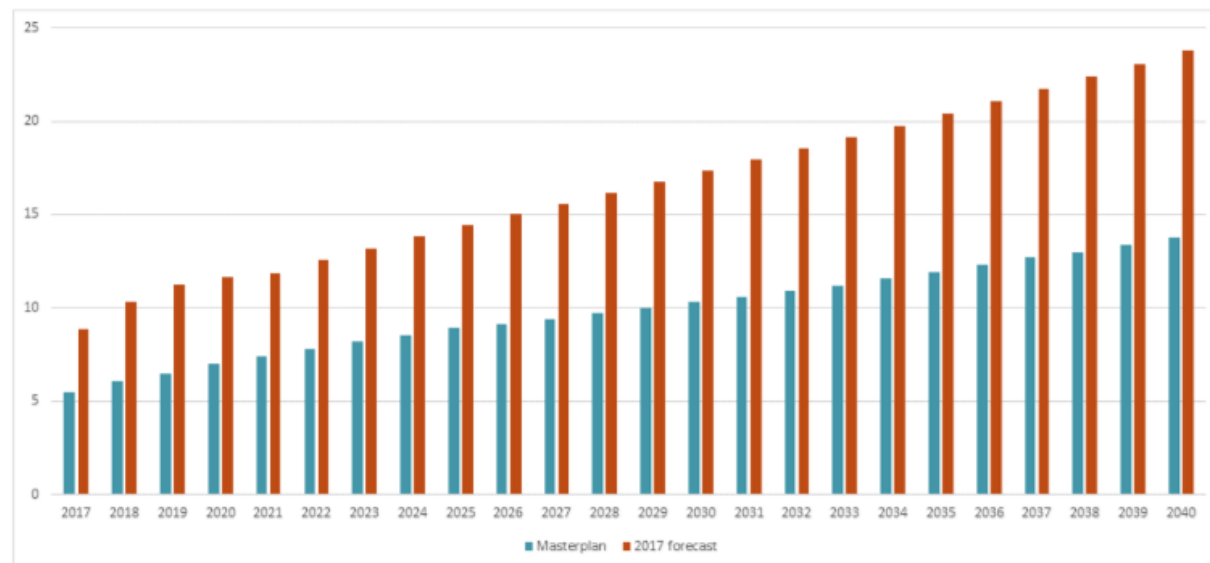



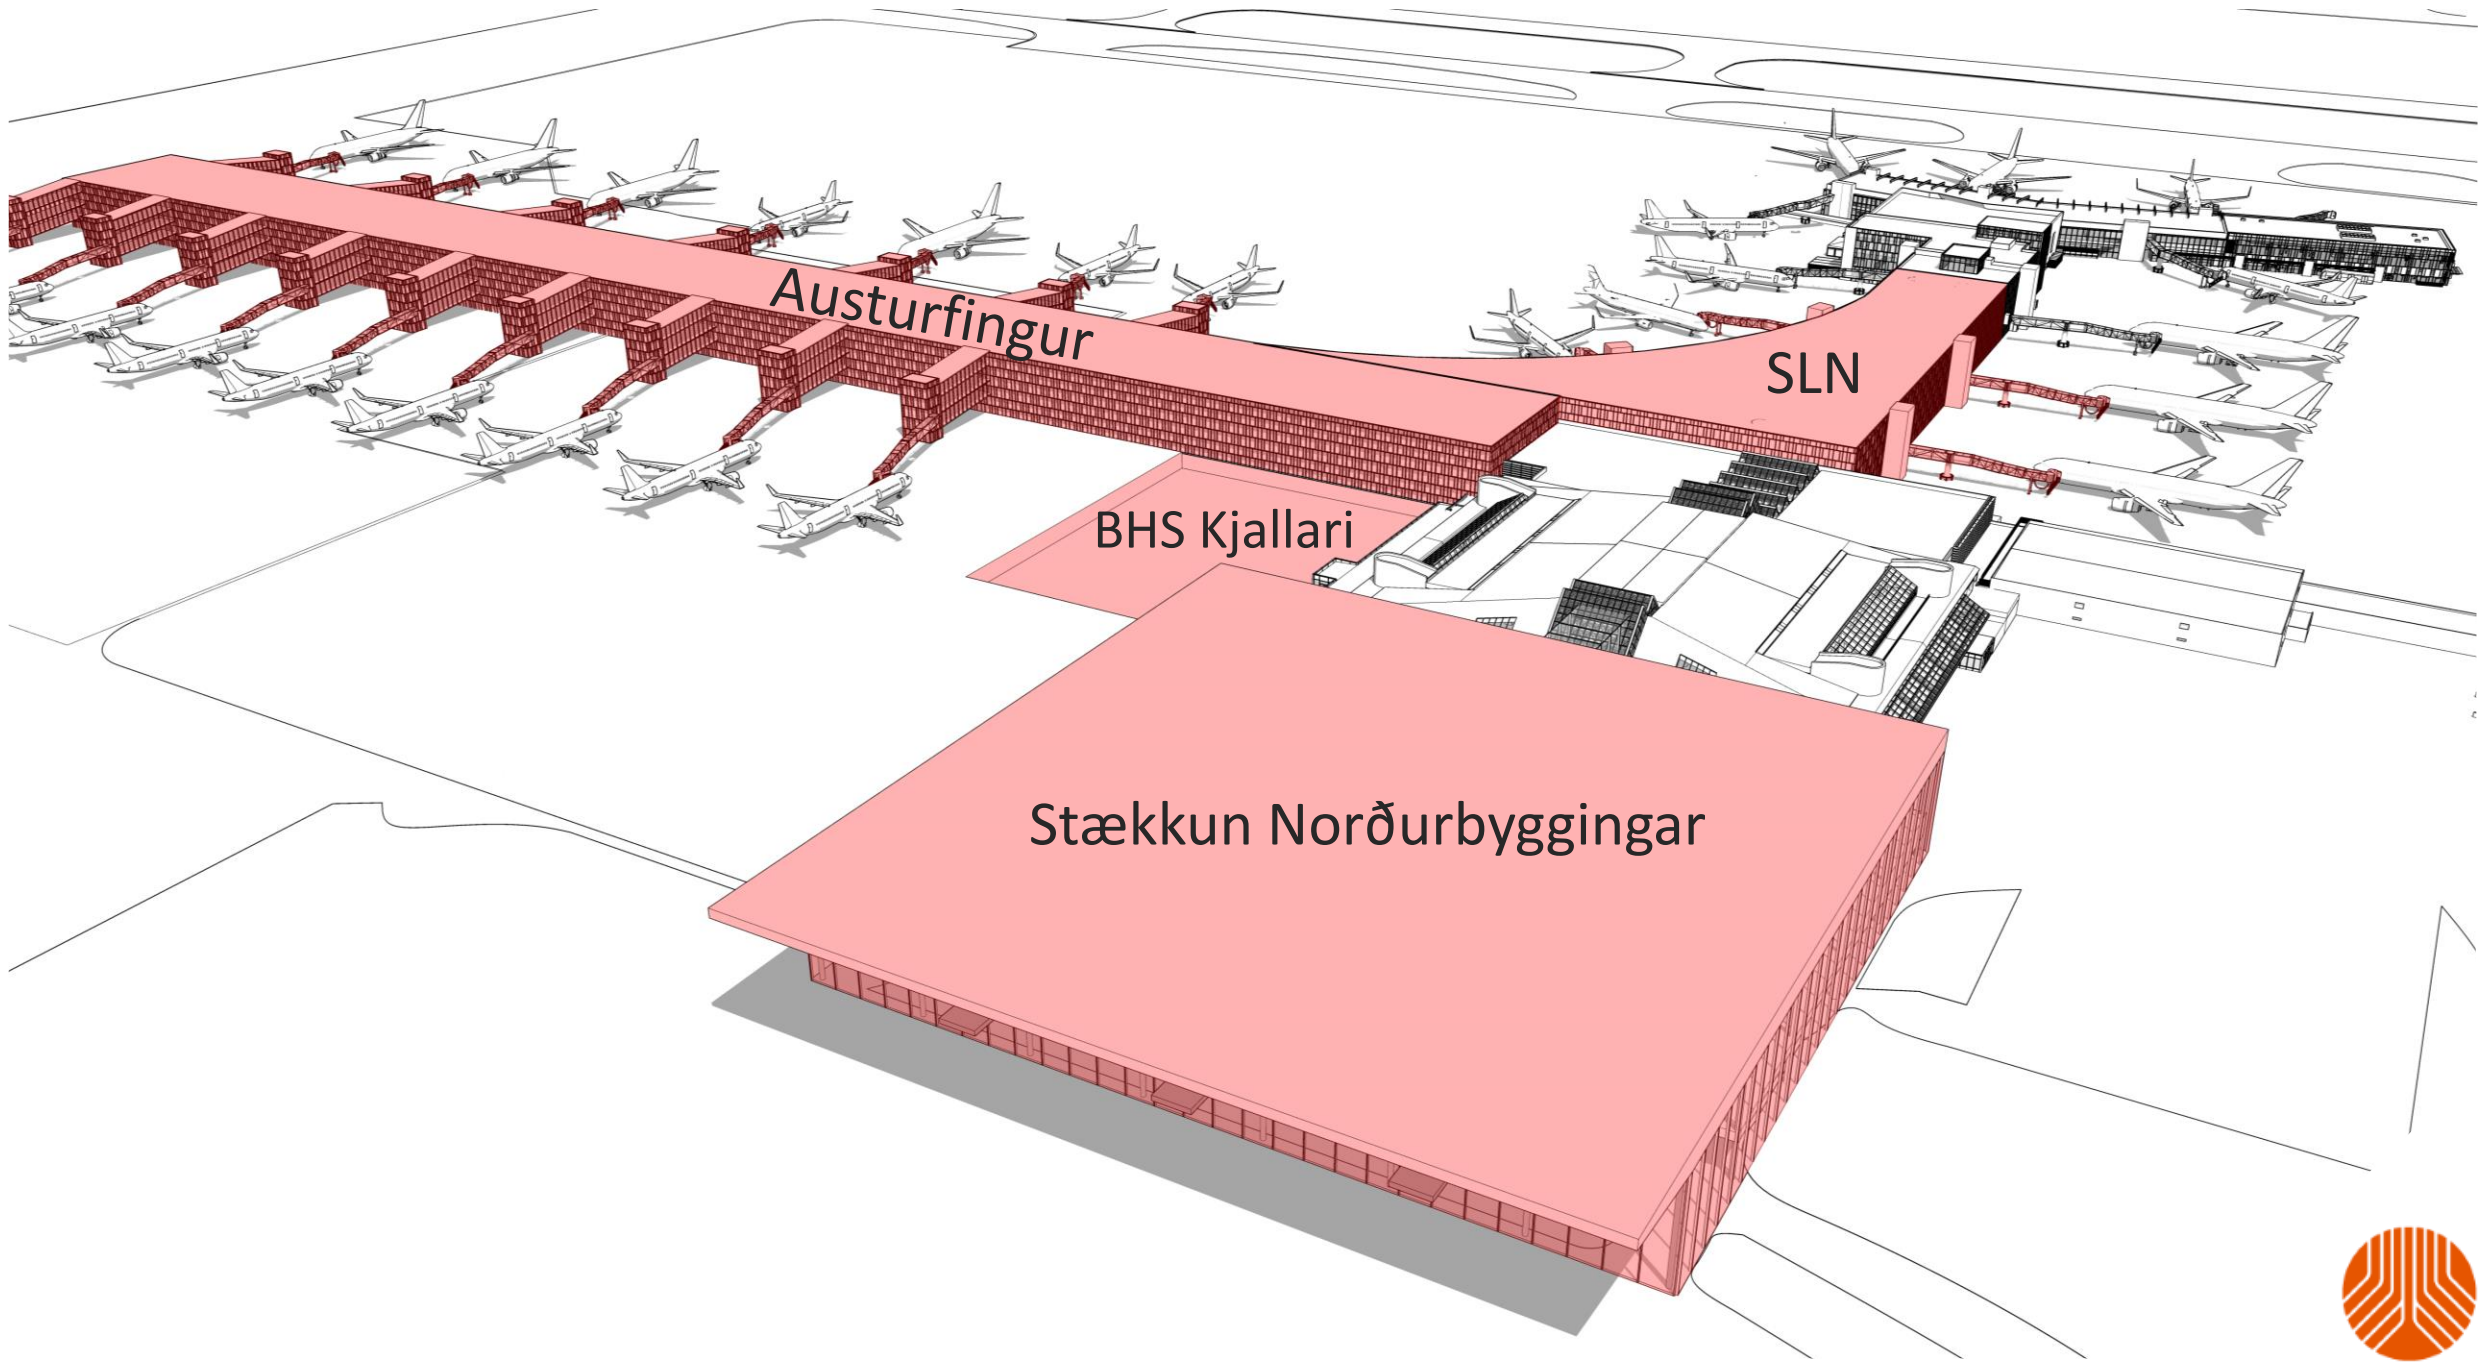

Austurfingur

SLN

BHS Kjallari

Stækkun Norðurbyggingar



STÆKKUN LANDGANGS TIL NORÐUR

/ Tilgangur

- Stækka landamæri til að uppfylla kröfur Non Schengen farþega
- Tenging farþegaflæðis milli suðurbyggingar, norðurbyggingar og austurfingurs með breikkun landgangs og byggingar til austurs
- Stækkun verslunar og veitingasvæðis norðurbyggingar

/ Verkefnið

- Hönnun í gangi skv. rammisamningi
- Útboð framkvæmdar Q4 2019
- Framkvæmd 2020-2025
- Bygging 25.000-35.000 fermetrar



FÆRSLA Á TÖSKUAFHENDINGU

/ Tilgangur

- Vegna SLN framkvæmdar þarf að færa afgreiðslu á komufarangri.

/ Verkefnið

- Hanna svæði fyrir töskuafhendingu
- Framkvæmd mannvirkis í SLN
- Búnaður og uppsetning í útboð
- Hönnun hafin
- Útboð Q3 2019



PROGRAM MANAGEMENT TEAM

/ Tilgangur

- Aðalráðgjöf fyrir þróun austurfingurs og norðurbyggingar
- Hönnunarstjórnun
- Framkvæmdastjórnun

/ Verkefnið

- Ráðgjöf og stjórnun í stærsta verkefni Isavia
- Markaðskönnun í gangi, tveir opnir dagar á vegum Isavia, 24. og 25. janúar.
- Útboð í mars 2019



UTBOD.ISAVIA.IS





▶ **Vegagerðin**

Óskar Örn Jónsson

forstöðumaður framkvæmdadeildar

Framkvæmdir Vegagerðarinnar 2019

Útboðsping Samtaka iðnaðarins

Óskar Örn Jónsson

Forstöðumaður framkvæmdadeildar

Verkfræðingur, M.Sc. Rekstrarverkfræðingur, M.Sc.

FAGMENN
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



Fjárheimildir til framkvæmda 2019


- Nýframkvæmdir 12.2 milljarðar kr.
- Viðhaldsframkvæmdir 9.7 milljarðar kr.



FAGMENN
ÖRYGGI
FRAMSÝNI




m.kr.

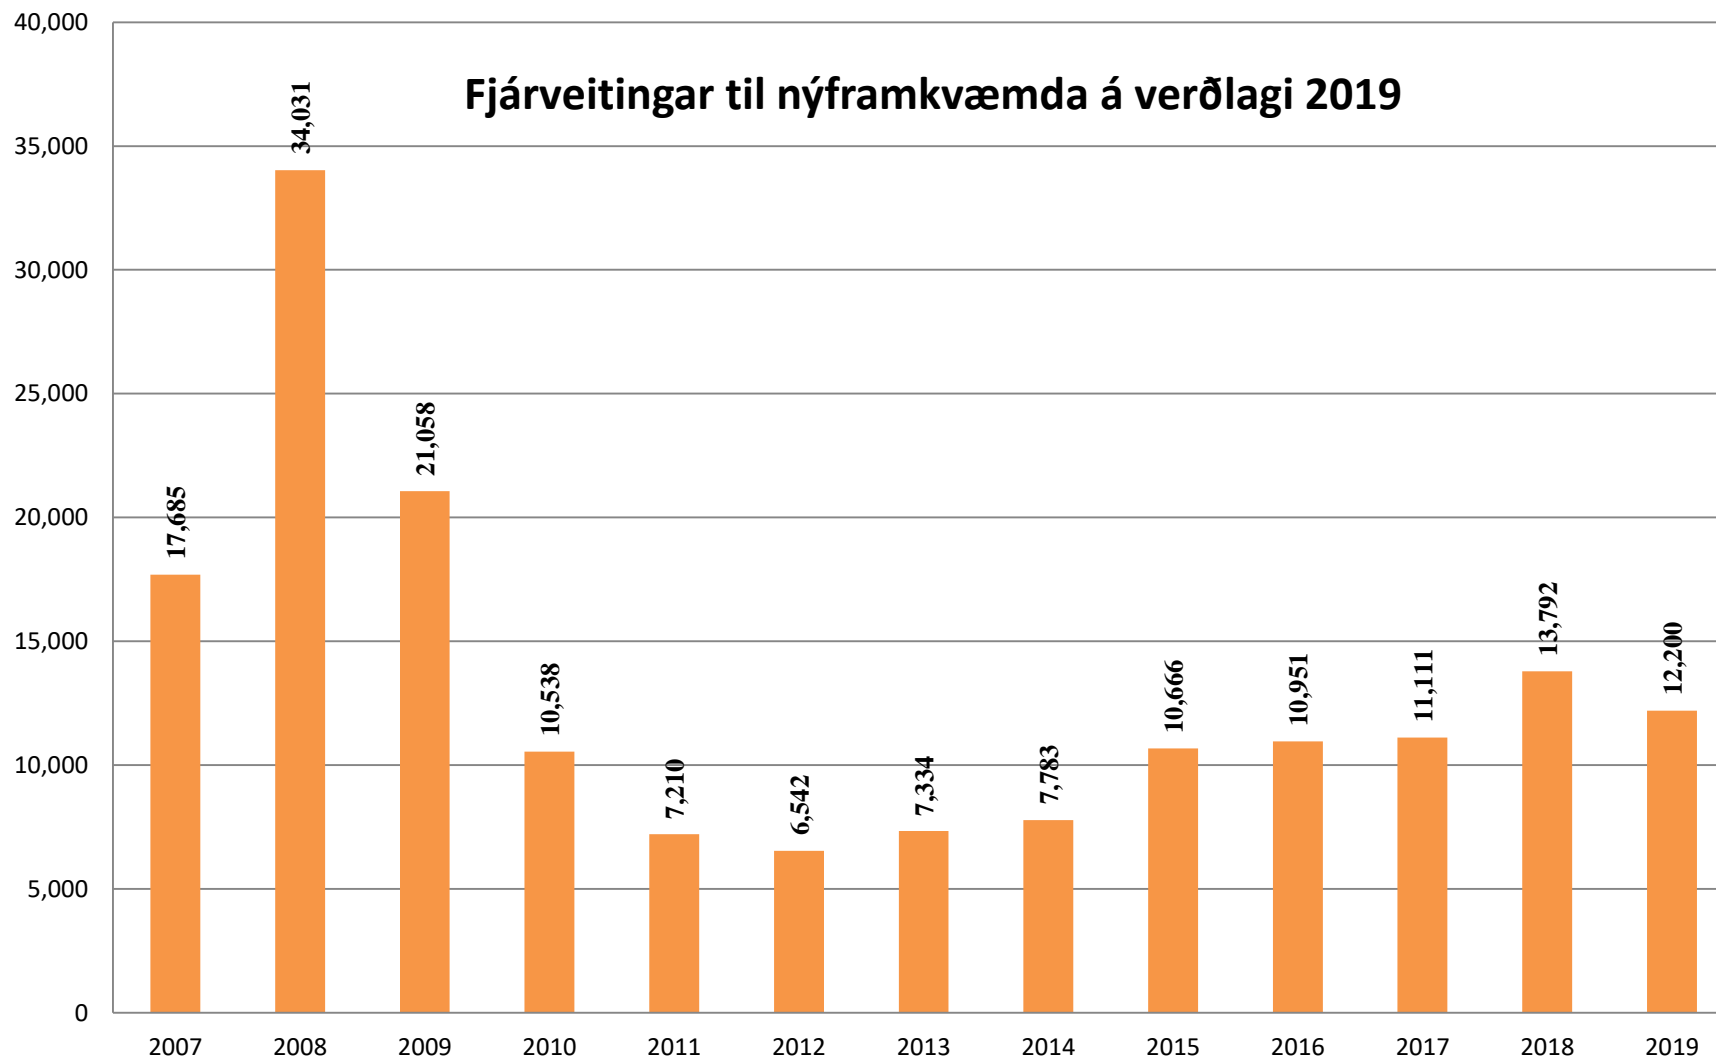

FAGMENN
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



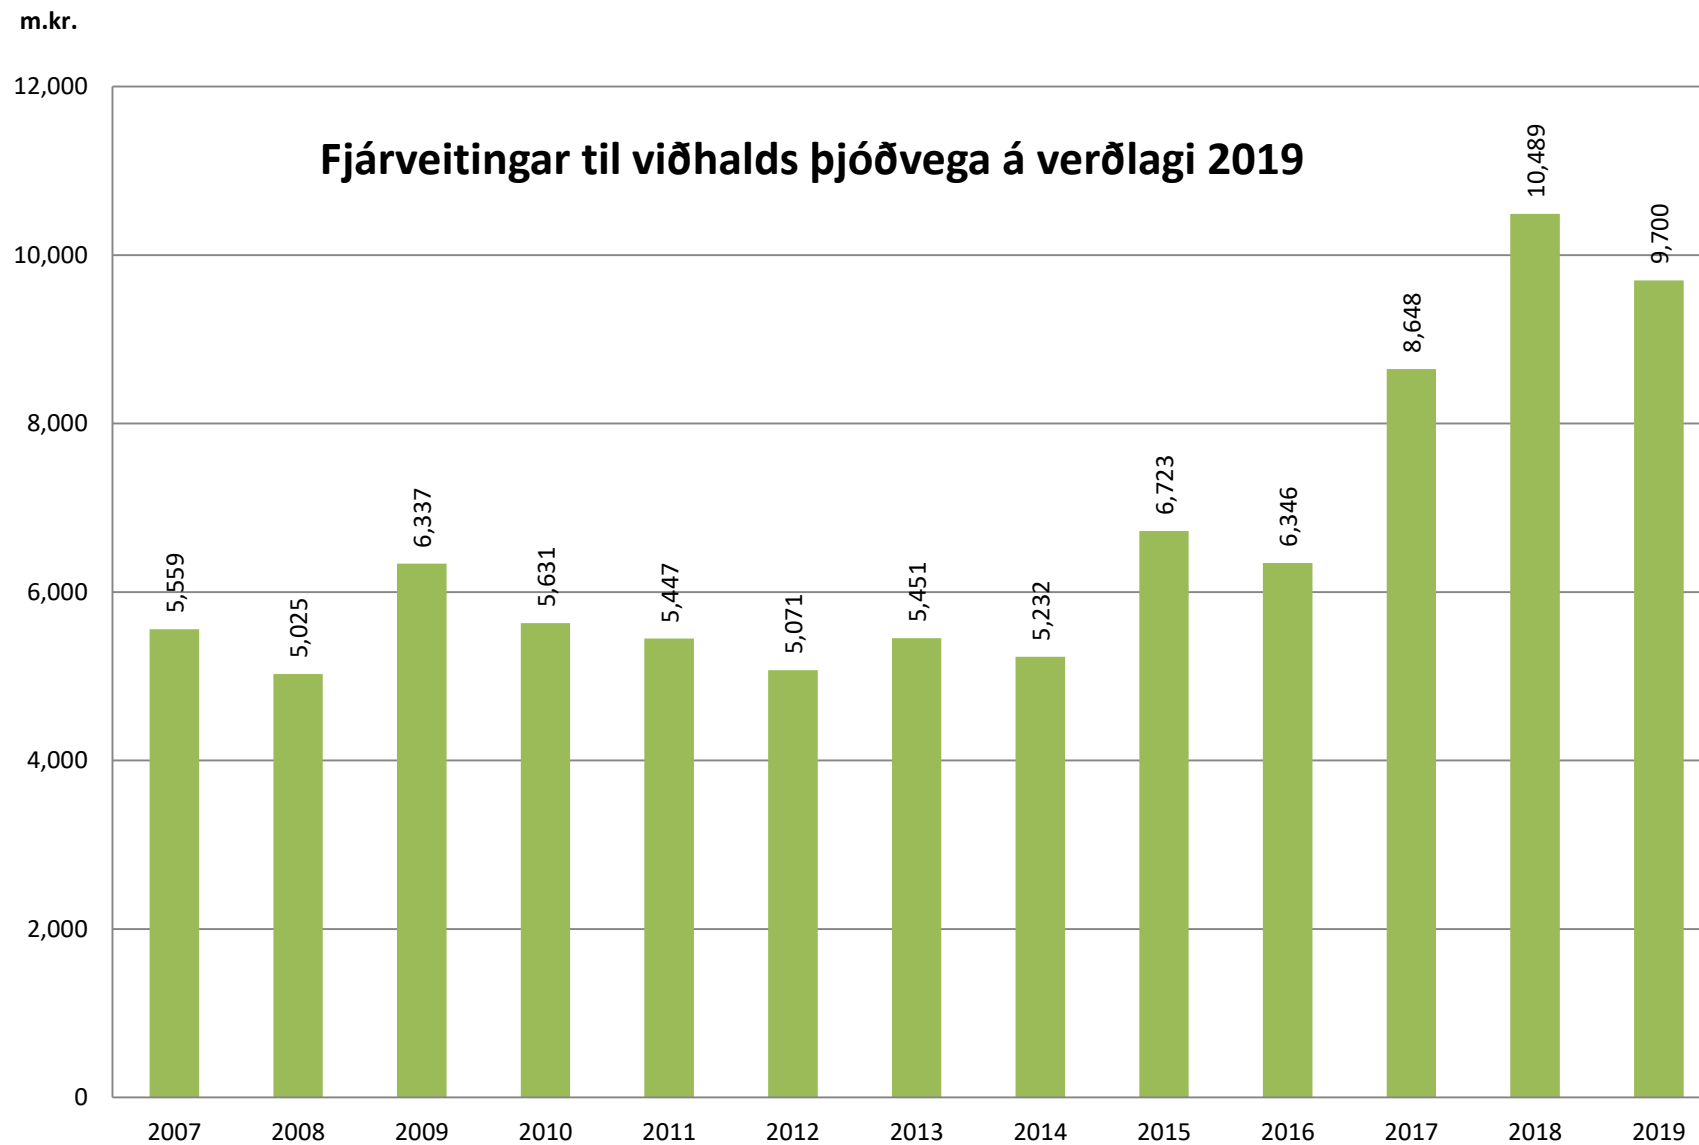

FAGMENN
ÖRYGGI
FRAMSÝNI




Vísitala meðalumferðar eftir landssvæðum

á Hringvegi (16 lykilteljarar)



Vísitala umferðar í mælipk. eftir landssvæðum
árið 2005 = 100

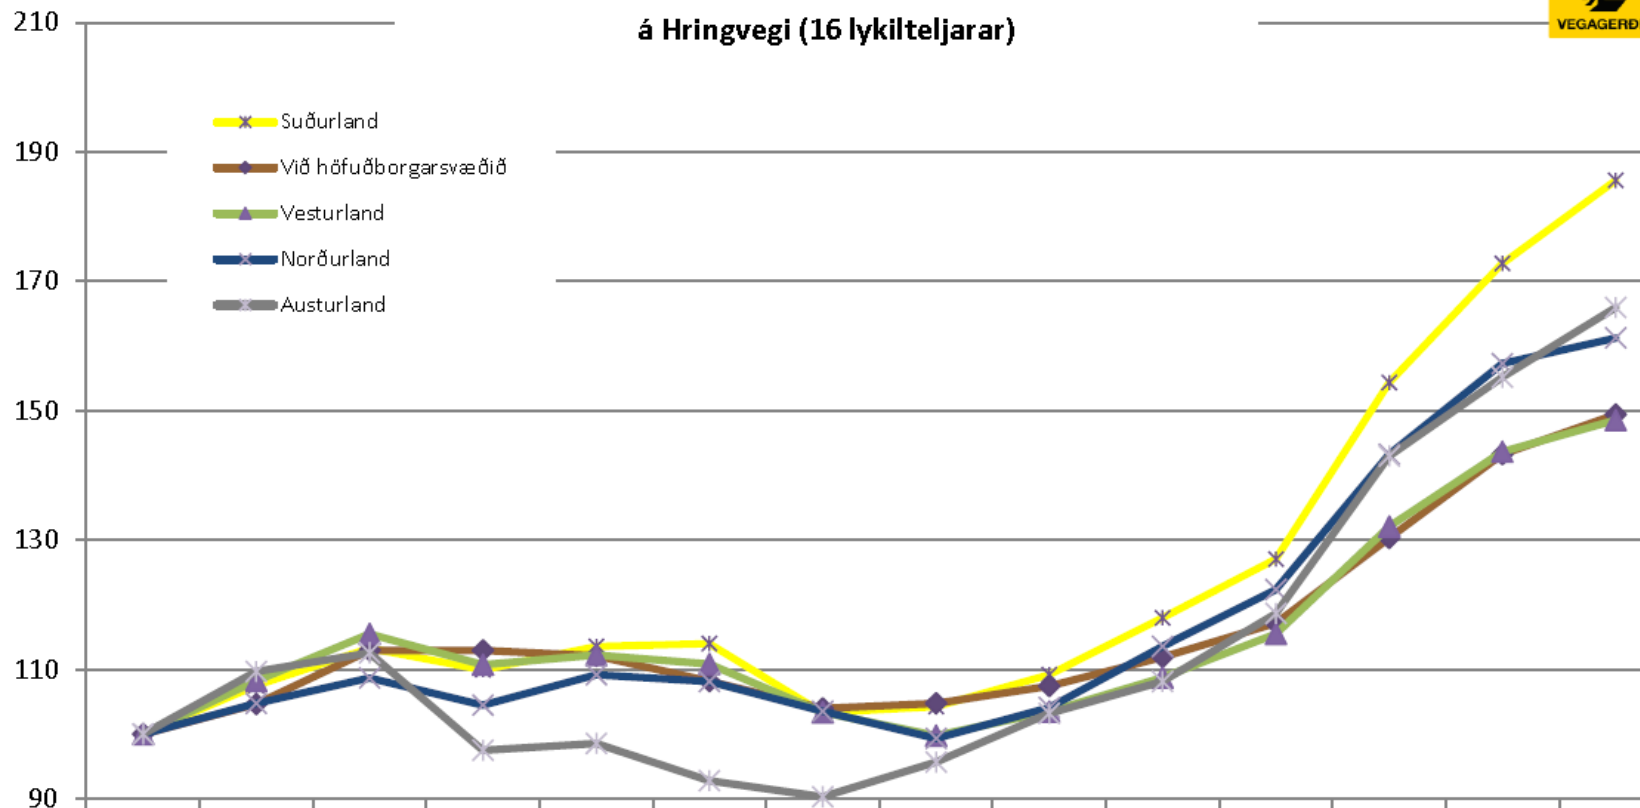


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Suðurland	100	107,5	113,3	110,0	113,5	114,0	103,3	104,3	109,2	118,0	127,1	154,3	172,7	185,6
Við höfuðborgarsvæðið	100	104,7	112,9	112,9	112,1	108,2	104,0	104,8	107,4	111,9	117,2	130,3	143,3	149,4
Vesturland	100	108,2	115,5	110,7	112,2	110,8	103,4	99,8	103,5	108,7	115,5	132,1	143,7	148,5
Norðurland	100	104,8	108,7	104,5	109,2	108,1	103,6	99,3	104,1	113,6	122,4	143,3	157,3	161,2
Austurland	100	109,7	112,5	97,5	98,6	92,8	90,3	95,7	103,2	108,2	118,6	143,0	155,2	165,9

FAGMENNСКА
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



Viðhaldspörf

- **Bundin slitlög:**
 - Uppsöfnuð þörf vegna of lítils viðhalds undanfarin ár er metin á **11.300 m.kr.**
- **Styrkingar og endurbætur:**
 - Árleg þörf er metin á **3.000 m.kr./ári** og uppsafnaður vandi er metinn á **50.000 m.kr.**
- **Brýr og varnargarðar:**
 - Á þjóðvegakerfinu eru 1.225 brýr og þar af 709 einbreiðar. Eðlileg viðhaldspörf er metin **1.400 m.kr./ári.**
 - **Átakspörf í endurnýjun vegriða – 1.500 m.kr**
- **Malarvegir:**
 - Uppsafnaður vandi er metinn á **2.000 m.kr.**

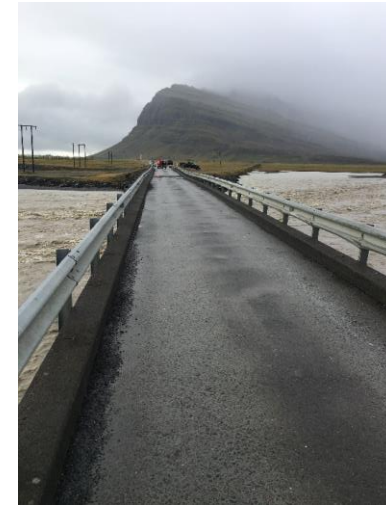

FAGMENN
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



Viðhaldspörf - samantekt

- Viðhaldspörf m.v. eðlilegar aðstæður er **9.500 m.kr/ári**
- Uppsafnaður vandi vega er á bilinu **60 – 65 milljarðar kr.** auk brúarverkefna.
- Gert er ráð fyrir 9.7 milljörðum í viðhaldsframkvæmdir í ár



Útboð á viðhaldsverkefnum 2019

Yfirlagnir klæðing og malbik – 4.4 milljarðar

- Yfirlagnir á öllum svæðum, klæðing
- Hjólfarafyllingar og axlarviðgerðir
- Yfirlagnir á Suðursvæði malbik
- Fræsun og malbik
- ***Malbik verður sett á vegi sem eru með klæðingu þar sem umferð hefur einna mest aukist***
- Efnisvinnsla **2-300 m.kr.**
- Viðhald brúa **800 m.kr.**



FAGMENNASKA
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



Styrkingar og endurbætur – 1,8 milljarðar kr.

- Verk sem samið þegar hefur verið um – **1.400 m. kr.**
- Fræsun, festun og minni verk – **450 m. kr.**



FAGMENN
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



Nýframkvæmdir – hafnagerð – sjóvarnir


Verk í gangi - 2400 m.kr.

- Skagaströnd: Smábátahöfn
- Akureyri: lenging Tangabryggju, stálþil
- Hornafjörður: viðhaldsdýpkun
- Landeyjahöfn:
 - Endurbætur hafnamynni
 - Steyptur vegur
 - Viðhaldsdýpkun 2019-23
- Þorlákshöfn: dýpkun innsiglingar
- Grindavík: Endurbygging Miðgarðs og dýpkun
- Sandgerði: Endurb. Suðurgarðs stálþil
- Snæfellsbær: sjóvarnir, Ólafsvík, Hellissandur og Hellnar
- Norðurþing: sjóvarnir á Húsavík
- Garðarbær: sjóvarnir á Álftanesi



Nýframkvæmdir – hafnagerð – 1800 m.kr

- Ólafsvík: Lenging Norðurgarðs vor
- Arnarstapi: Dýpkun hafnar
- Grundarfjörður:
 - Lenging Norðurkants landfylling Janúar
 - Lenging Norðurkants stálþil, grjótgarður Haust
 - Viðhaldsdýpkun Haust
- Stykkishólmur: Dýpkun við flotbryggjur vor
- Flatey: Styrking ferjubryggju sumar
- Bíldudalur: Hafskipabryggja, stálþil sumar
- Dalvík: Hafskipabryggja, þekja vor
- Akureyri: Torfunesbryggja, endurbygging haust
- Bolungarvík: Endurbygging Brjóts stálþil vor
- Flateyri: Endurbygging þekju vor
- Suðureyri: Endurbygging Vesturkants haust
- Sandgerði: Endurb. Suðurgarðs þekja vor
- Reykjaneshafnir: Lenging Helguvíkurbakka haust
- Norðfjörður: Netagerðabryggja þekja júní
- Norðurfjörður: endurbygging Togarabryggju, stálþil sumar
- Eskifjörður: Netagerðabryggja þekja sumar
- Stöðvarfjörður: Trébryggja vor

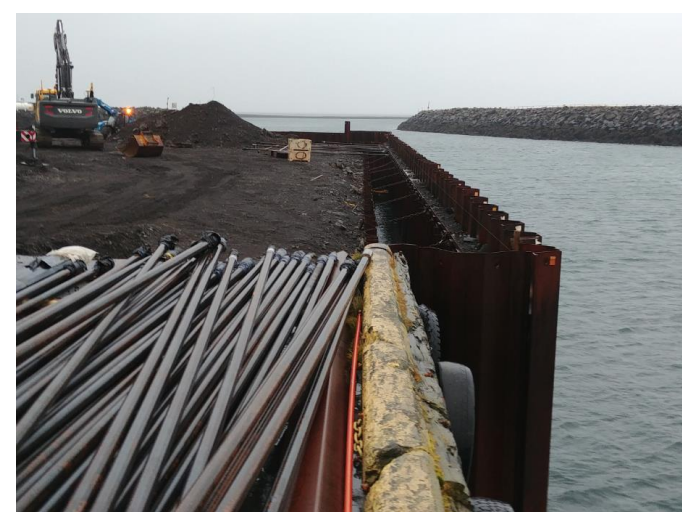

FAGMENNASKA
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



Nýframkvæmdir – sjóvarnir – 130 m.kr

- Akranes: Breiðin vor
- Flatey: Þorpið sumar
- Dalabyggð: Ægisbraut vor
- Vesturbyggð: Kollsvík vor
- Dalvíkurbyggð: Dalvík og Árskógsandur sumar
- Grindavík: Arfadalsvík, Staðarbót og Selatangar vor
- Seltjarnarnes: Við Golfvöll, Ráðagerði haust



FAGMENNASKA
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



Nýframkvæmdir 2019 stærri verk í gangi:

- Dýrafjarðargöng 3.500 m.kr.
- Hringvegur um Berufjörð 300 m.kr.
- Þingvallavegur 500 m.kr.
- Laugarvatnsvegur 200 m.kr.
- Brú yfir Eldvatn 600 m.kr.
- Reykjavegur 970 m.kr.



FAGMENN
ÖRYGGI
FRAMSÝNI





Helstu framkvæmdaverk

Samkvæmt vegaáætlun sem er til umræðu á Alþingi

Suðursvæði

- Selfoss – Hveragerði – fyrsti áfangi, nýsamið við verktaka fyrir fyrsta hluta - **1.250 m.kr** – næsti hluti boðinn út í lok árs
- Gatnamót við Vífilsstaðaveg – **900 m.kr.**
- Gatnamót við Kaplakrika – **200 m.kr.**
- Grindavíkurvegur – seinni hluti – **500 m.kr.**
- Bæjarháls - Vesturlandsvegur – **400 m.kr.**
- Skarhólabraut - Hafravatnsvegur – **510 m.kr.**
- Kjalarnes – **400 m.kr.**
- Reykjanesbraut um Hafnarfjörð – **2.4 milljarðar kr.**

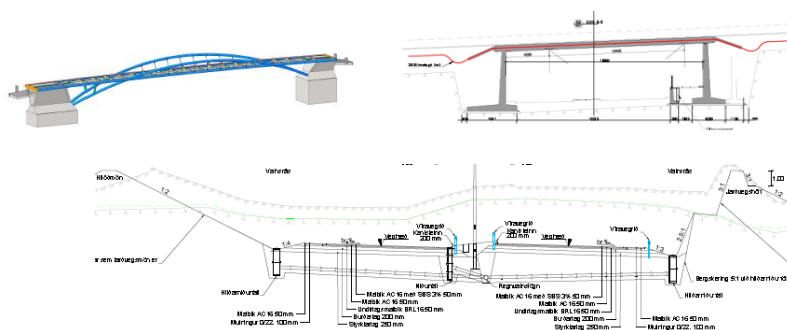

FAGMENNSKA
ÖRYGGI
FRAMSYNI



Helstu framkvæmdaverk fr.h.

Vestursvæði

- Vestfjarðavegur um Gufudalssveit ~7.000 m.kr. (kostnaður eftir leiðarvali)
- Skógaströnd – *valdir kaflar* **120 m.kr. á leið í útboð**
- Grímastaðavegur, Hvanneyri - Hvítárvallabrá – 7 km **100 m.kr. á leið í útboð**
- Litla Kleif í Norðurfirði – **50 m.kr. á leið í útboð**

- Djúpvegur: Leiti-Eiri – *í samningsferli eftir útboð* - 550 m. kr.
- Snæfellsvegur um Fróðarheiði - 250 m.kr. í gangi
- Dýrafjarðargöng – 2. áfangi í gangi
- Skorradalsvegur 4 km í gangi
- Laxárdalsvegur 5 km í gangi
- Hvoltdalur lokaáfangi í gangi




FAGMENNSKA
ÖRYGGI
FRAMSYNI



Helstu framkvæmdaverk fr.h.

Norðursvæði

- Dettifosvegur, Hólmatungur - Ásheiði: **600 m.kr.** – á leið í útboð
- Langanesströnd, Finnafljörður – Bakkafjörður: 3 ára verkefni: **350 m.kr.** á ári.

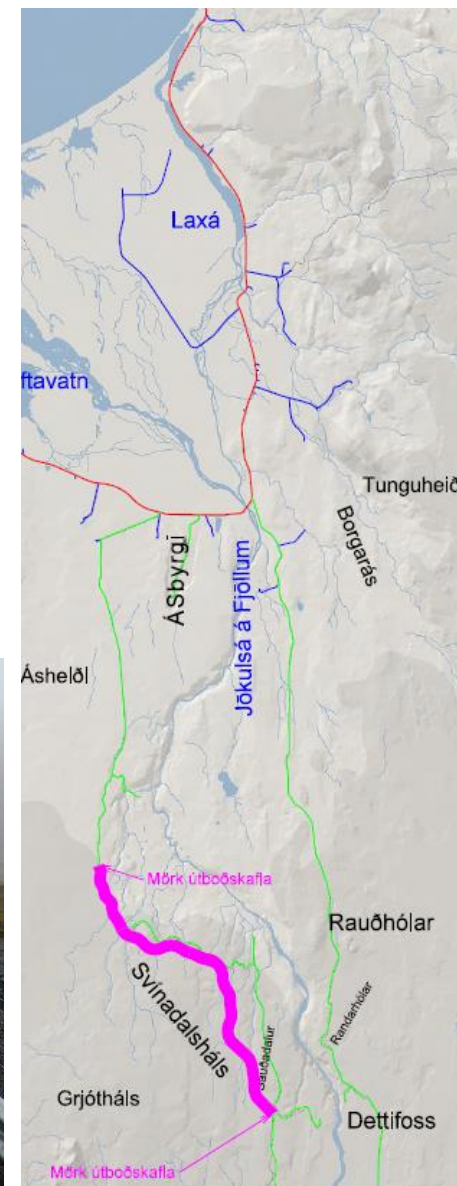


FAGMENNASKA
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



Helstu framkvæmdaverk fr.h.

Austursvæði

- Borgarfjarðarvegur: um Vatnsskarð og Njarðvíkurskriður – **460 m.kr.**

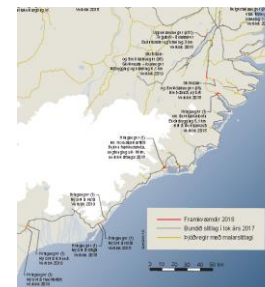

Breikkun brúa:

- Kvía – **250 m.kr.**
- Brunná – **160 m.kr.**
- Fellsá – **230 m.kr.**
- Steinavötn – **500 m.kr.**



FAGMENN
ÖRYGGI
FRAMSYNI



Nýframkvæmdir 2019

Ýmis verkefni- 2.800,- m.kr.

- Tengivegir – **800 m.kr.**
- Bætt umferðaflæði, almenningsamgöngur – **335 m.kr.**
- Öryggisaðgerðir – **500 m.kr.**
- Hjóla- og göngustígar – **250 m.kr.**
- Göngubrýr og undirgöng – **150 m.kr.**
- Undirbúningur fyrir borgarlínu – **300 m.kr.**
- Héraðsvegir – **110 m.kr.**
- Landsvegir utan stofnvegakerfis – **120 m.kr.**
- Styrkvegir – **50 m.kr.**
- Reiðvegir – **75 m.kr.**
- Smábrýr – **50 m.kr.**
- Girðingar – **60 m.kr.**



FAGMENNASKA
ÖRYGGI
FRAMSÝNI



Tækifæri fyrir verktaka eru á eftirfarandi sviðum:

- Nýframkvæmdum 7-8 stærri verk
- Brúargerð 3-5 útboð, ~ **4-600 m.kr**
- Bundnum slitlögum – **4.4 milljarðar**
- Styrkingum og endurbótum – **450 m.kr.**
- Efnisvinnslu ~ **2-300 m.kr**
- Minni vegaf framkvæmdum ~ **3-4 milljarðar kr.**
- Hafnargerð ~ **2 milljarðar kr.**



FAGMENN
ÖRYGGI
FRAMSÝNI





Takk fyrir

FAGMENNSKA
ÖRYGGI
FRAMSÝNI





▶ Framkvæmdasýsla ríkisins

Guðrún Ingvarsdóttir
forstjóri



F S R

Verkfræmningarmarkaður ríkisins 2019

Útboðsþing
24. 01. 2019

Guðrún Ingvarsdóttir, forstjóri FSR



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Verkframkvæmdir ríkisins 2019

Forsætisráðuneyti

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

Dómsmálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti

Fjármála- og efnahagsráðuneyti

Heilbrigðisráðuneyti

Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Alþingi



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Verkum sem lokið var 2018

- Gestastofa á Hakinu á Þingvöllum
- Stoðvirki til snjóflóðavarna í fjallinu Kubba á Ísafirði
- 3. áfangi í uppsetningu stoðvirkja í N-Fífladölum í Hafnarfjalli á Siglufirði
- Sjúkratryggingar Íslands
- Dómstólasýslan – nýtt leiguhúsnaði
- Framkvæmdir við fossinn Dynjanda



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Samkeppnir og alútboð 2019

Framkvæmdasamkeppnir

- Hjúkrunarheimili á Höfn í Hornafirði
- Hjúkrunarheimili á Húsavík
- Hjúkrunarheimili á Akureyri

Alútboð

Barnaverndarstofa. Nýtt meðferðarheimili



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Samantekt framkvæmdir boðnar út á árinu

Ráðuneyti	Áætlaður fram- kvæmdakostnaður
Forsætisráðuneyti	0 m.kr.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti	0 m.kr.
Dómsmálaráðuneyti	88 m.kr.
Félagsmálaráðuneyti	450 m.kr.
Fjármála- og efnahagsráðuneyti	55 m.kr.
Heilbrigðisráðuneyti	11.369 m.kr.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti	3.865 m.kr.
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti	600 m.kr.
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti	1.918 m.kr.
Utanríkisráðuneyti	1.114 m.kr.
Alþingi	290 m.kr.
Samtals boðið út á árinu	19.749 m.kr.



Ríkiseignir

Viðhalds- og endurbótaverkefni á húsnæði í umsjá Ríkiseigna eru fjármögnuð með leigutekjum og því ekki á fjárlögum.

Í þessari kynningu eru tekin fyrir flest verk Ríkiseigna sem eru yfir 10 m.kr. hvert, samtals um 1,1 milljarður króna.

Önnur umsvif á vegum Ríkiseigna er um 2,8 milljarðar króna.

Alls eru framkvæmdir og viðhald á vegum Ríkiseigna 3,9 milljarðar króna




Forsætisráðuneyti

Lóð við stjórnarráðshúsið, Lækjargötu 1.
Fornleifagröftur, rannsóknir og greining á fornminjum

Tilboð voru opnuð í desember 2018

Verkinu á að ljúka 2019

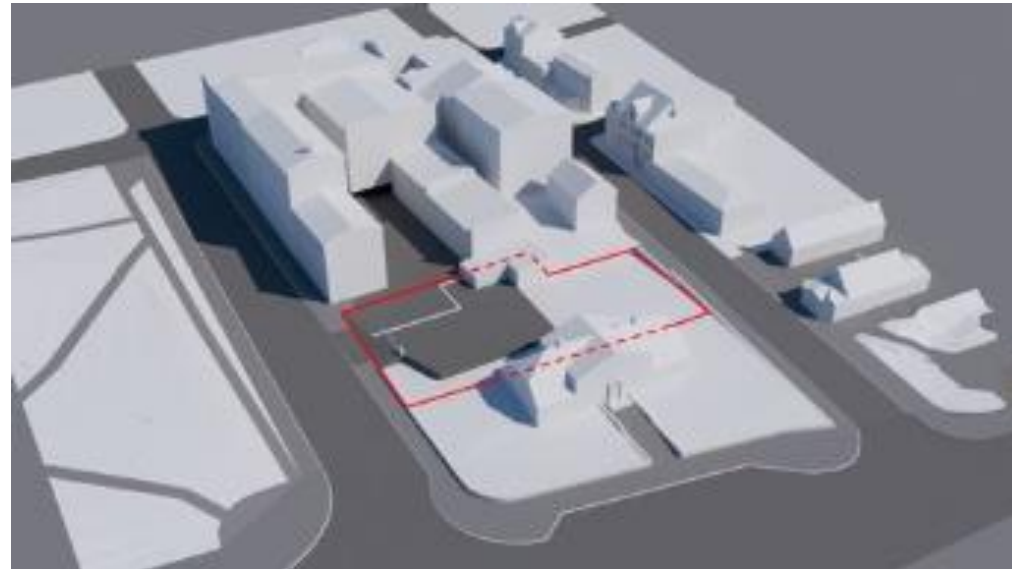

Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Dómsmálaráðuneyti, Ríkiseignir

Austurvegur 6, Hvolsvelli	
Breyting á afgreiðslu sýslumanns	13 m.kr.
Flatahraun 11, Hafnarfirði	
Endurnýja þak á framhúsi lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu	10 m.kr.
Gránugata 4–6, Siglufirði	
Endurinnrétta hæð á sýsluskrifstofu	30 m.kr.
Heiðarvegur 15, Vestmannaeyjum	
Utanhússviðgerðir og málun. Þrjár ríkisstofnanir þar til húsa.	25 m.kr.
Vesturvör 2, Kópavogi	
Hljóðeinangrun rýma	10 m.kr.
Ríkiseignir, samtals verkefni dómsmálarn.	88 m.kr.



Félagsmálaráðuneyti

Barnaverndarstofa meðferðarheimili

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Mögulegt alútboð

450 m.kr.
í lok árs 2019

Félagsmálaráðuneyti, samtals

450 m.kr.



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Fjármála- og efnahagsráðuneyti, Ríkiseignir

Borgartún 7, ýmsar ríkisstofnanir þar til húsa Mötuneyti, standsetning	20 m.kr.
Hafnarstræti 93, Akureyri, ríkisskattstjóri Breyta kaffistofu, snyrtingum og útbúa fundarherbergi	20 m.kr.
Tryggvagata 19, tollstjóri Endurnýja stétt og lagnir við framhlið. Í skoðun með Rvk.	15 m.kr.
Ríkiseignir, samtals fjármála- og efnahagsráðuneyti	55 m.kr.



Heilbrigðisráðuneyti

Landspítali, Hringbraut

Aðalbygging, utanhússviðhald E–G álma, 2. áfangi

Áætlaður framkvæmdakostnaður

50 m.kr.

Áætlaður útboðstími

janúar til mars 2019

Geðdeildarbygging, utanhússviðhald, 4. áfangi

Áætlaður framkvæmdakostnaður

50 m.kr.

Áætlaður útboðstími

janúar til mars 2019

Eiríksgata 19, 21, 29 og 37, utanhússviðhald – rakaskemmdir

Áætlaður framkvæmdakostnaður

30 m.kr.

Áætlaður útboðstími

janúar til mars 2019



Heilbrigðisráðuneyti

Landspítali, Hringbraut, framhald:

Hús 6, rannsóknarstofur, innrétting, rafkerfi o.fl.

Áætlaður framkvæmdakostnaður 90 m.kr.

Áætlaður útboðstími janúar/febrúar 2019

Legudeildir, faggreinaútboð, lagnir, raflagnir, dúkar o.fl.

Áætlaður framkvæmdakostnaður 90 m.kr.

Áætlaður útboðstími febrúar/mars 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Heilbrigðisráðuneyti

Landspítali, Fossvogur
Lóðarframkvæmd við aðalinngang

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Áætlaður útboðstími

25 m.kr.
febrúar/mars 2019

Landspítali, Landakot
K-álma, utanhússviðgerðir

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Áætlaður útboðstími

65 m.kr.
febrúar/mars 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Heilbrigðisráðuneyti

Landspítali, Kleppur
Utanhússviðgerð göngudeildarbyggingar

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Áætlaður útboðstími

30 m.kr.
febrúar/mars 2019

Landspítali, Kópavogur
Utanhússviðgerð líknardeildar

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Áætlaður útboðstími

30 m.kr.
febrúar/mars 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Heilbrigðisráðuneyti

Landspítali, Dalbraut

Endurinnrétting göngudeildar/skrifstofur vegna rakaskemmda

Áætlaður framkvæmdakostnaður	90 m.kr.
Áætlaður útboðstími	janúar/febrúar 2019

Utanhússviðgerð

Áætlaður framkvæmdakostnaður	90 m.kr.
Áætlaður útboðstími	febrúar/mars 2019

Faggreinar, lagnir, raflagnir o.fl. Ýmis verkefni

Áætlaður framkvæmdakostnaður	50 m.kr.
Áætlaður útboðstími	febrúar/mars 2019



Heilbrigðisráðuneyti

Nýr Landspítali ohf. (NLSH) – Hringbrautarverkefnið
Uppsteypa meðferðarkjarna nýs Landspítala

Áætlaður framkvæmdakostnaður uppsteypu 7.900 m.kr.

Áætlaður útboðstími seinni hluti árs 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Heilbrigðisráðuneyti

Hjúkrunarheimili í Sveitarfélaginu Árborg

60 hjúkrunarrými

4.050 m²

Áætlaður framkvæmdakostnaður

1.800 m.kr.

Áætlaður útboðstími

vor 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Heilbrigðisráðuneyti

Hjúkrunarheimili í Stykkishólmi (endurgerð húsnæðis)

Áætlaður framkvæmdakostnaður

490 m.kr.

Áætlaður útboðstími

seinni hluta árs 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Heilbrigðisráðuneyti, Ríkiseignir

Auðbrekka 4, Húsavík. Sjúkrahús/heilsugæsla	
Aðlögun að nýju stigahúsi	20 m.kr.
Bleiksárhlið 59, Eskifirði	
Innrétta íbúð 1. hæðar	20 m.kr.
Engihlíð 28, Snæfellsbæ. Heilsugæsla	
Endurnýja þak, múrviðgerðir og málning	70 m.kr.
Flúðabakki 2-3, Blönduósi. Sjúkrahús/heilsugæsla	
Endurnýja glugga og gler	35 m.kr.
Hólavegur 6, Dalvík. Heilsugæsla	
Endurnýjun á þaki, 1. áfangi	15 m.kr.
Hraunbergi 6, Reykjavík. Heilsugæsla	
Breytingar, endurbætur innanhúss	31 m.kr.



Heilbrigðisráðuneyti, Ríkiseignir, framhald:

Hvanneyrarbraut 37–39, Siglufirði. Heilsugæsla/sjúkrahús

Húsnæðisbreytingar á 1. og 3. hæð 25 m.kr.

Merkigerði 9, Akranesi. Sjúkrahús

Utanhússklæðning og gluggaskipti E deild 16 m.kr.

Endurnýja lyftu, E deild 13 m.kr.

Endurnýjun deilda, 1. áfangi 75 m.kr.

Sauðárhæðir, Sauðárkróki. Heilsugæsla/sjúkrahús

Standsetja baðherbergi 55 m.kr.

Skógarhlíð 6, Reykjavík. Félagsmála- og heilbrigðisráðuneyti

Utanhússviðgerð 35 m.kr.



Heilbrigðisráðuneyti, Ríkiseignir, framhald:

Sólvangsvegur 2, Hafnarfirði. Heilsugæsla Breytingar innanhúss, móttaka og mæðravernd	32 m.kr.
Stekkar 1, Patreksfirði. Sjúkrahús Breytingar á sjúkragangi	14 m.kr.
Suðurgata 8, Seyðisfirði. Sjúkrahús Skipta um járn á þaki hússins	20 m.kr.
Sunnubraut 7, Búðardal. Læknisbústaður Endurnýjun innanhúss	13 m.kr.
Ríkiseignir, samtals heilbrigðisráðuneyti	489 m.kr.



Heilbrigðisráðuneyti

Samantekt á áætluðum framkvæmdakostnaði


Landspítali – öll framkvæmdaverkefni	690 m.kr.
NLSH – Hringbrautarverkefnið – Uppsteypa meðferðarkjarna nýs Landspítala	7.900 m.kr.
Hjúkrunarheimili í Sveitarfélaginu Árborg	1.800 m.kr.
Hjúkrunarheimili í Stykkishólmi (endurgerð húsnæðis)	490 m.kr.
Ríkiseignir, ýmis viðhaldsverkefni	489 m.kr.
Heilbrigðisráðuneyti, samtals	11.369 m.kr.



Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Hús íslenskra fræða

Er í útboði. Tilboð opnuð í kjölfar útboðs 5. febrúar 2019

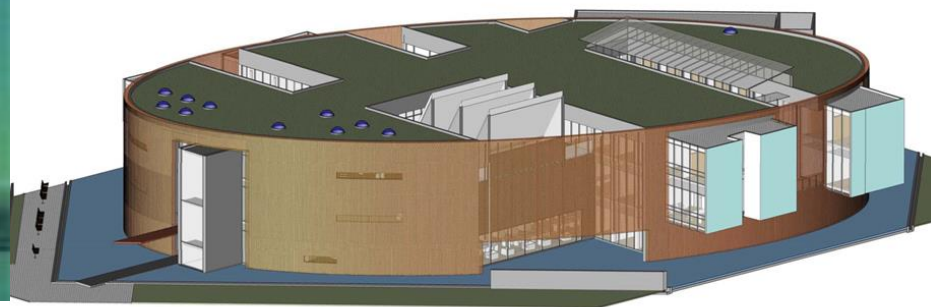

Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Landbúnaðarháskóli Íslands (LBHÍ) að Reykjum
Endurgerð og endurbætur á garðskála Garðyrkjuskóla LBHÍ

Áætlaður framkvæmdakostnaður vegna garðskála 100 m.kr.
Áætlaður útboðstími vor 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Háskóli Íslands

Eirberg, ný lyfta

Áætlaður framkvæmdakostnaður

Áætlaður útboðstími

35 m.kr.

júní–september 2019

Nýi Garður, ný lyfta utanhúss

Áætlaður framkvæmdakostnaður

Áætlaður útboðstími

35 m.kr.

júní–september 2019

Viðhaldsverkefni Háskóla Íslands, samtals

70 m.kr.



Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Ríkiseignir

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Utanhússviðgerðir og málun	35 m.kr.
Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranesi Endurnýja glugga og klæða austurhlið rafiðnaðardeildar	13 m.kr.
Endurnýja baðherbergi heimavist	26 m.kr.
Fjölbrautaskólinn við Ármúla Endurnýja þak ofan við sal	30 m.kr.
Hverfisgata 19, Þjóðleikhúsið Rampur og lóð umhverfis lyftu	15 m.kr.
Kvennaskólinn í Reykjavík Tröppur, handrið, grásteinn, hiti o.fl.	11 m.kr.



Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Ríkiseignir, framhald:

Lagarás 17–19, Egilsstöðum. Heilsugæsla Lyftur – viðgerðir	12 m.kr.
Menntaskólinn í Reykjavík Endurnýja 2. hæð Íþöku	34 m.kr.
Endurnýja þakglugga og þakefni Íþöku	16 m.kr.
Menntaskólinn við Hamrahlíð Endurnýja loft og lýsingu í skólastofum	18 m.kr.
Suðurgata 41, Þjóðminjasafn Breytingar innanhúss	25 m.kr.
Tækniskólinn Skólavörðuholti Utanhússviðgerð, 4. áfangi	30 m.kr.
Nýr flóttastigi í suðurálmú	15 m.kr.



Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Ríkiseignir, framhald:

Verkmenntaskóli Austurlands. Bóknámshús, Mýrargötu 10
Endurnýja glugga 15 m.kr.

Ríkiseignir, samtals mennta- og menningarmálarn. 295 m.kr.



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Mennta- og menningarmálaráðuneyti Samantekt á áætluðum framkvæmdakostnaði

Hús íslenskra fræða	3.400 m.kr.
Landbúnaðarháskóli Íslands, Reykjum Ölfusi, garðskáli	100 m.kr.
Háskóli Íslands, viðhaldsverkefni	70 m.kr.
Ríkiseignir, ýmis viðhaldsverkefni	295 m.kr.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti, samtals	3.865 m.kr.



Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

Byggðastofnun – ný skrifstofubygging á Sauðárkróki

Útboð voru opnuð 22. janúar 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Urðarbotnar Neskaupstað, varnargarður og keilur

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Áætlaður útboðstími

700 m.kr.
febrúar 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs, Kirkjubæjarklaustri

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Áætlaður útboðstími

460 m.kr.
2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Þjóðgarðsstofa á Hellissandi

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Áætlaður útboðstími

490 m.kr.
febrúar 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Þingvellir, þjóðgarður. Forunnin salernishús

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Áætlaður útboðstími

150 m.kr.
febrúar 2019




Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Gullfoss. Stígagerð, útsýnispallur og varnargirðing

Áætlaður framkvæmdakostnaður
Áætlaður útboðstími

118 m.kr.
2019

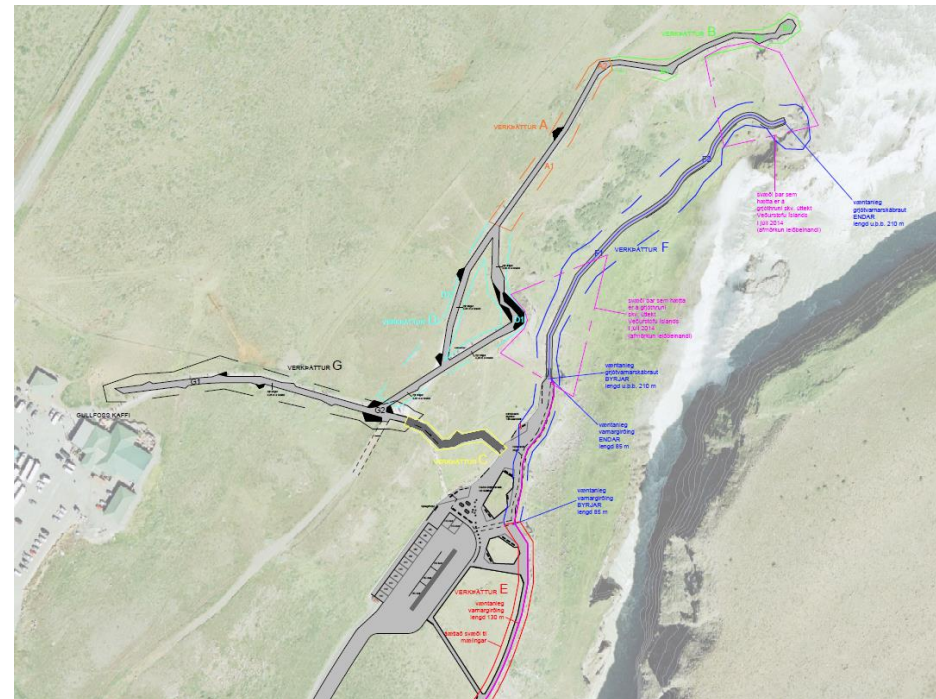

Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti – Samantekt á áætluðum framkvæmdakostnaði

Urðarbotnar Neskaupstað, varnargarður og keilur	700 m.kr.
Gestastofa Vatnajökulspjóðgarðs, Kirkjubæjarklaustri	460 m.kr.
Þjóðgarðsstofa á Hellissandi	490 m.kr.
Þingvellir, þjóðgarður. Forunnin salernishús	150 m.kr.
Gullfoss. Stígagerð, útsýnispallur og varnargirðing	118 m.kr.
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, samtals	1.918 m.kr.



Utánríkisráðuneyti Landhelgisgæsla Íslands

Bygging 200 gistirýma fyrir erlenda liðsafla á öryggissvæðinu
á Keflavíkurflugvelli

Verkefnið verður boðið út í áföngum á næstu 4–5 árum

Áætlaður framkvæmdakostnaður 1. áfanga	250 m.kr.
Áætlaður framkvæmdakostnaður allra áfanga	580 m.kr.
Áætlaður útboðstími 1. áfanga	2019

Flugskýli 831 á Keflavíkurflugvelli, viðhald og endurbætur
innan- og utanhúss

Áætlaður framkvæmdakostnaður	150 m.kr.
Áætlaður útboðstími	2019



Utánríkisráðuneyti Landhelgisgæsla Íslands

Viðhald og endurbætur á flughlöðum við flugskýli 831
í samvinnu við Isavia

Áætlaður framkvæmdakostnaður	200 m.kr.
Áætlaður útboðstími	2019/2020

Viðhald og endurbætur á akstursbrautum flugvéla
á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli
í samvinnu við Isavia

Áætlaður framkvæmdakostnaður	500 m.kr.
Áætlaður útboðstími	2019/2020



Utanríkisráðuneyti, Ríkiseignir

Rauðarárstígur 25, Reykjavík

Gera við þak bílskýlis og þak
yfir loftræstiklefum, 1. hæð

14 m.kr.

Ríkiseignir, samtals utanríkisráðuneyti

14 m.kr.



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Utanríkisráðuneyti, samantekt á áætluðum framkvæmdakostnaði

Bygging 200 gistirýma fyrir erlenda liðsafla á öryggissvæðinu á Keflavíkurlflugvelli 250 m.kr.

Flugskýli 831 á Keflavíkurlflugvelli, viðhald og endurbætur innan- og utanhúss 150 m.kr.

Viðhald og endurbætur á flughlöðum við flugskýli 831 200 m.kr.

Viðhald og endurbætur á akstursbrautum flugvéla á öryggissvæðinu á Keflavíkurlflugvelli 500 m.kr.

Ríkiseignir, samtals utanríkisráðuneyti 14 m.kr.
Utanríkisráðuneyti, samtals 1.114 m.kr.



Alþingi

Jarðvegsvinna vegna þjónustubyggingar á Alþingisreit

Áætlaður kostnaður jarðvegsvinnu
Áætlaður útboðstími jarðvegsvinnu

200 m.kr.
haust 2019



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Alþingi, Ríkiseignir

Bríetartún 7, Ríkisendurskoðun
Endurinnrétta 3. hæð

90 m.kr.

Ríkiseignir, samtals Alþingi

90 m.kr.




Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency

Samantekt framkvæmdir boðnar út á árinu

Ráðuneyti	Áætlaður fram- kvæmdakostnaður
Forsætisráðuneyti	0 m.kr.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti	0 m.kr.
Dómsmálaráðuneyti	88 m.kr.
Félagsmálaráðuneyti	450 m.kr.
Fjármála- og efnahagsráðuneyti	55 m.kr.
Heilbrigðisráðuneyti	11.369 m.kr.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti	3.865 m.kr.
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti	600 m.kr.
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti	1.918 m.kr.
Utanríkisráðuneyti	1.114 m.kr.
Alþingi	290 m.kr.
Samtals boðið út á árinu	19.749 m.kr.



Lykiltölur úr skilamötum FSR 1998–2016

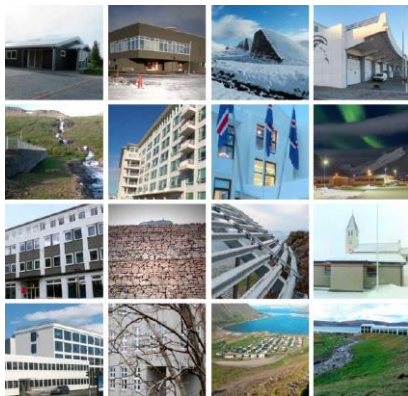

- Ný skýrsla
- Samanburður raunkostnaðar og áætlana 139 verkefna
- Fyrsta sinn samantekt og greining á leitni og eðli ólíkra flokka framkvæmda
- Raunkostnaður fór 4,5% fram úr áætlunum sem þykir vel viðunandi í alþjóðlegum samanburði
- Framúrkeyrsla raunkostnaðar fyrri hluta tímabilsins var 7,7% en 1,9% á seinni hluta tímabilsins
- Skýrslan er aðgengileg á vef FSR, www.fsr.is



Takk fyrir



Framkvæmdasýsla ríkisins
Government Construction Contracting Agency



▶▶ Útboðsþing

Verklegar framkvæmdir 2019



25
ára
1994
2019



Samtök
iðnaðarins
